

El entorno del proyecto y el rol del director

El entorno del proyecto

Los proyectos se desarrollan dentro, en entornos que pueden influir en ellos. Pueden ser externos o internos a la organización. Estas influencias pueden ser beneficiosas o desfavorables.


Vamos a clasificar en las siguientes categorías:

- **Factores ambientales de la empresa (EEFs)**
 - Hacen referencia a condiciones que no están bajo el control del equipo del proyecto y que influyen en el proyecto. Proviene de afuera del ambiente del proyecto y, a menudo, son externas a la organización.
- **Activos de los procesos de la organización (OPAs)**
 - Son internos a la organización. Son los planes, los procesos y las bases de conocimiento específicos de la organización.


El entorno del proyecto

Los proyectos existen y operan dentro, en entornos que pueden influir en ellos.

Estas influencias pueden producir impacto beneficioso, desfavorable o neutral en el proyecto, los interesados y el equipo de proyectos.

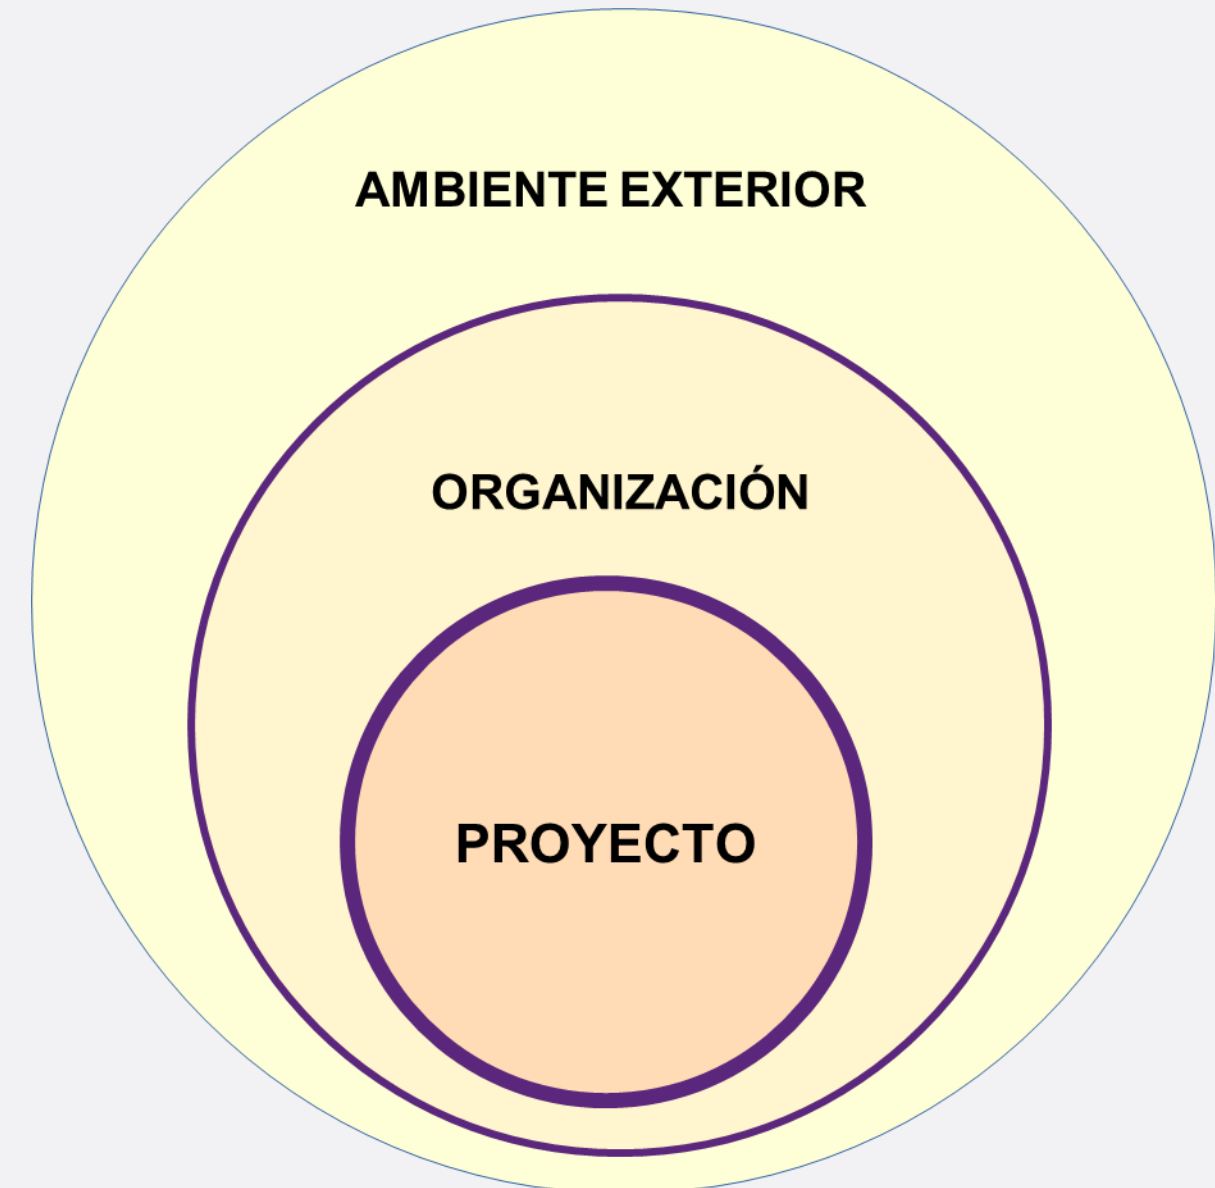

Influencias del entorno en los proyectos

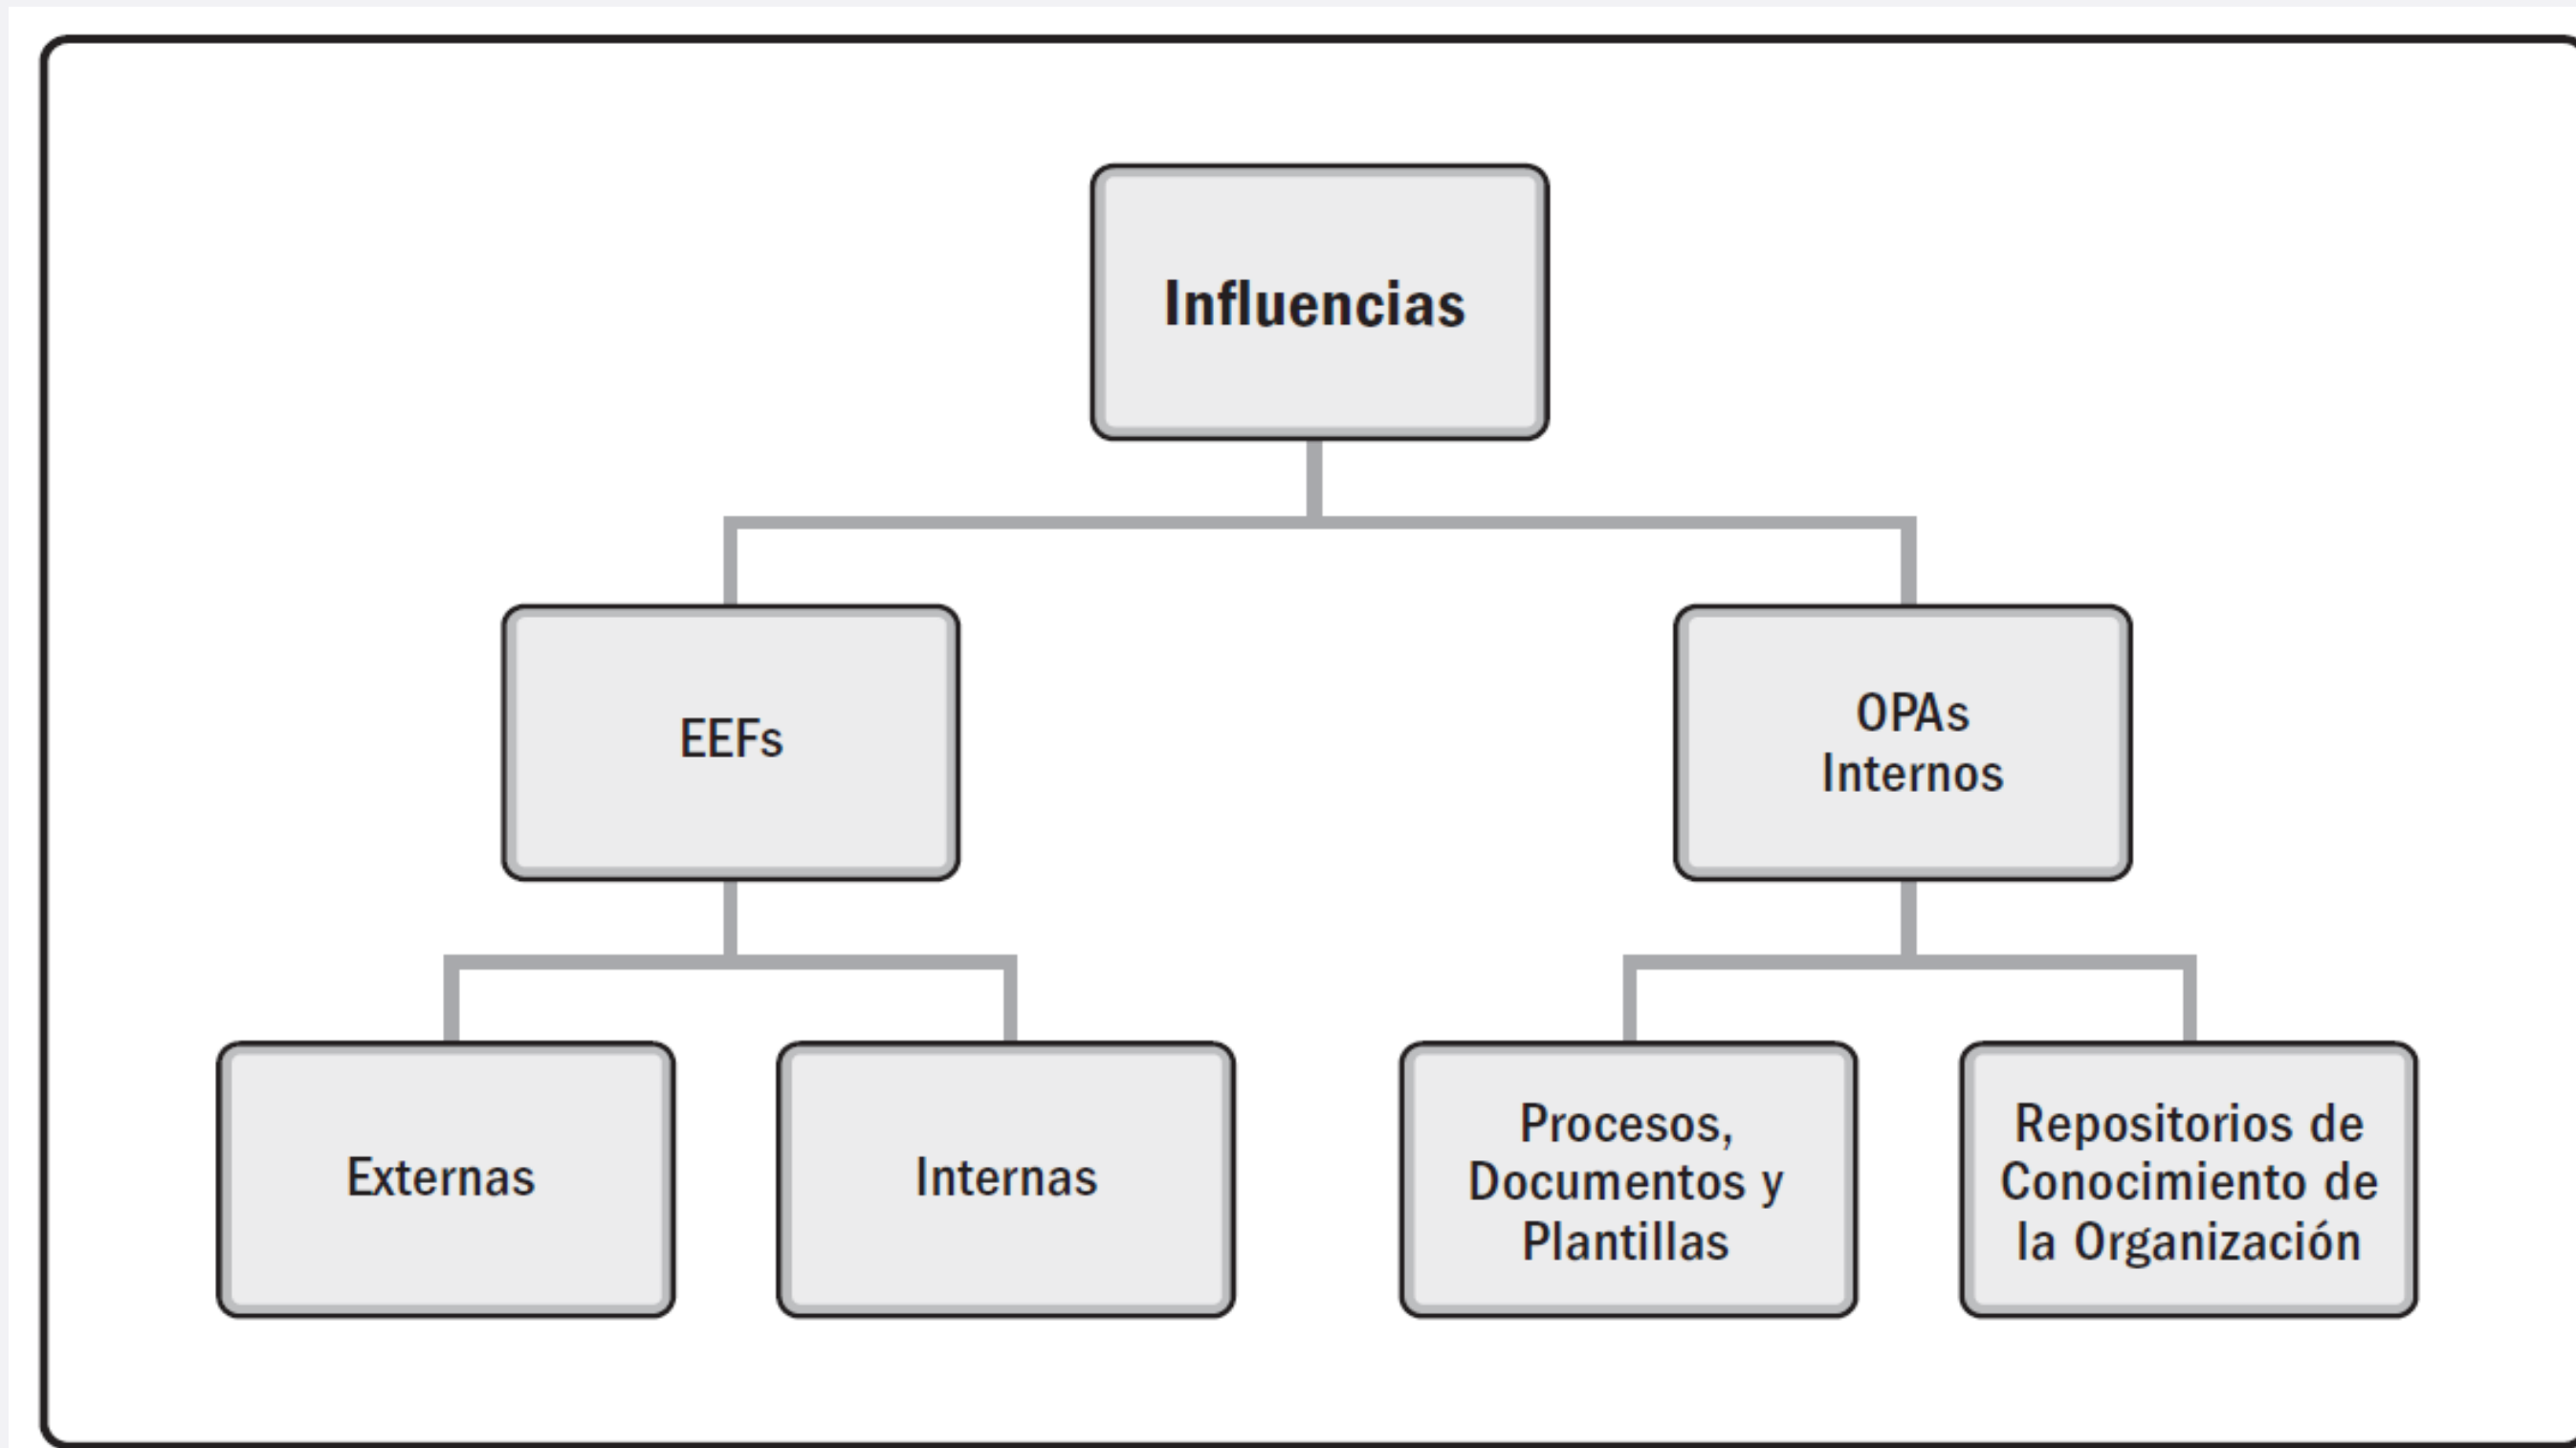

Project Management Institute (2017). Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (PMBOK® Guide) (6^{ta} ed.). Newton Square, Pennsylvania: PA: Author. Figura 2.1, sec, 2, p.37

Factores ambientales de la empresa (EEFs) - Externos

Los EEFs pueden ser externos a la organización.

Algunos ejemplos son:

- Políticas del gobierno.
- Condiciones del mercado.
- Influencia de asuntos de índole social y cultural.
- Desarrollos tecnológicos.
- Elementos ambientales físicos.
- Restricciones legales..
- Estándares gubernamentales o de la industria.

Factores ambientales de la empresa (EEFs) - Internos

Los EEFs también pueden ser internos a la organización.

Algunos ejemplos son:

- Cultura, estructura y gobernanza de la organización.
- Distribución geográfica de instalaciones y recursos.
- Infraestructura.
- *Software* informático.
- Disponibilidad de recursos.
- Capacidad de los empleados.

OPAs - Procesos, políticas y procedimientos

Normalmente establecidos por la oficina de dirección de proyectos u otra función fuera del proyecto.

Los procesos y procedimientos de la organización para realizar el trabajo del proyecto incluyen, entre otros:

- Estándares específicos de la organización y plantillas.
- Ciclos de vida del producto y del proyecto y métodos y procedimientos.
- Lista de proveedores preaprobados y diversos tipos de acuerdos contractuales.
- Procedimientos para la gestión de incidentes y defectos.
- Requisitos de comunicación de la organización.
- Procedimientos de verificación y validación de productos, servicios o resultados.

OPAs – Base de conocimiento de la organización


Los repositorios de conocimiento de la organización incluyen, entre otros elementos:

- Repositorios de conocimientos de la gestión de configuración.
- Repositorios de datos financieros.
- Información histórica y repositorio de conocimientos de lecciones aprendidas.
- Repositorios de datos sobre la gestión de incidentes y defectos.
- Repositorios de datos para métricas.
- Archivos de proyectos anteriores.

Estructuras organizacionales

Las organizaciones determinan su estructura organizativa, dependiendo de varios factores. No hay una única estructura aplicable a todas las organizaciones.

Las estructuras adoptan muchos tipos y formas que tienen diversas influencias en los proyectos.

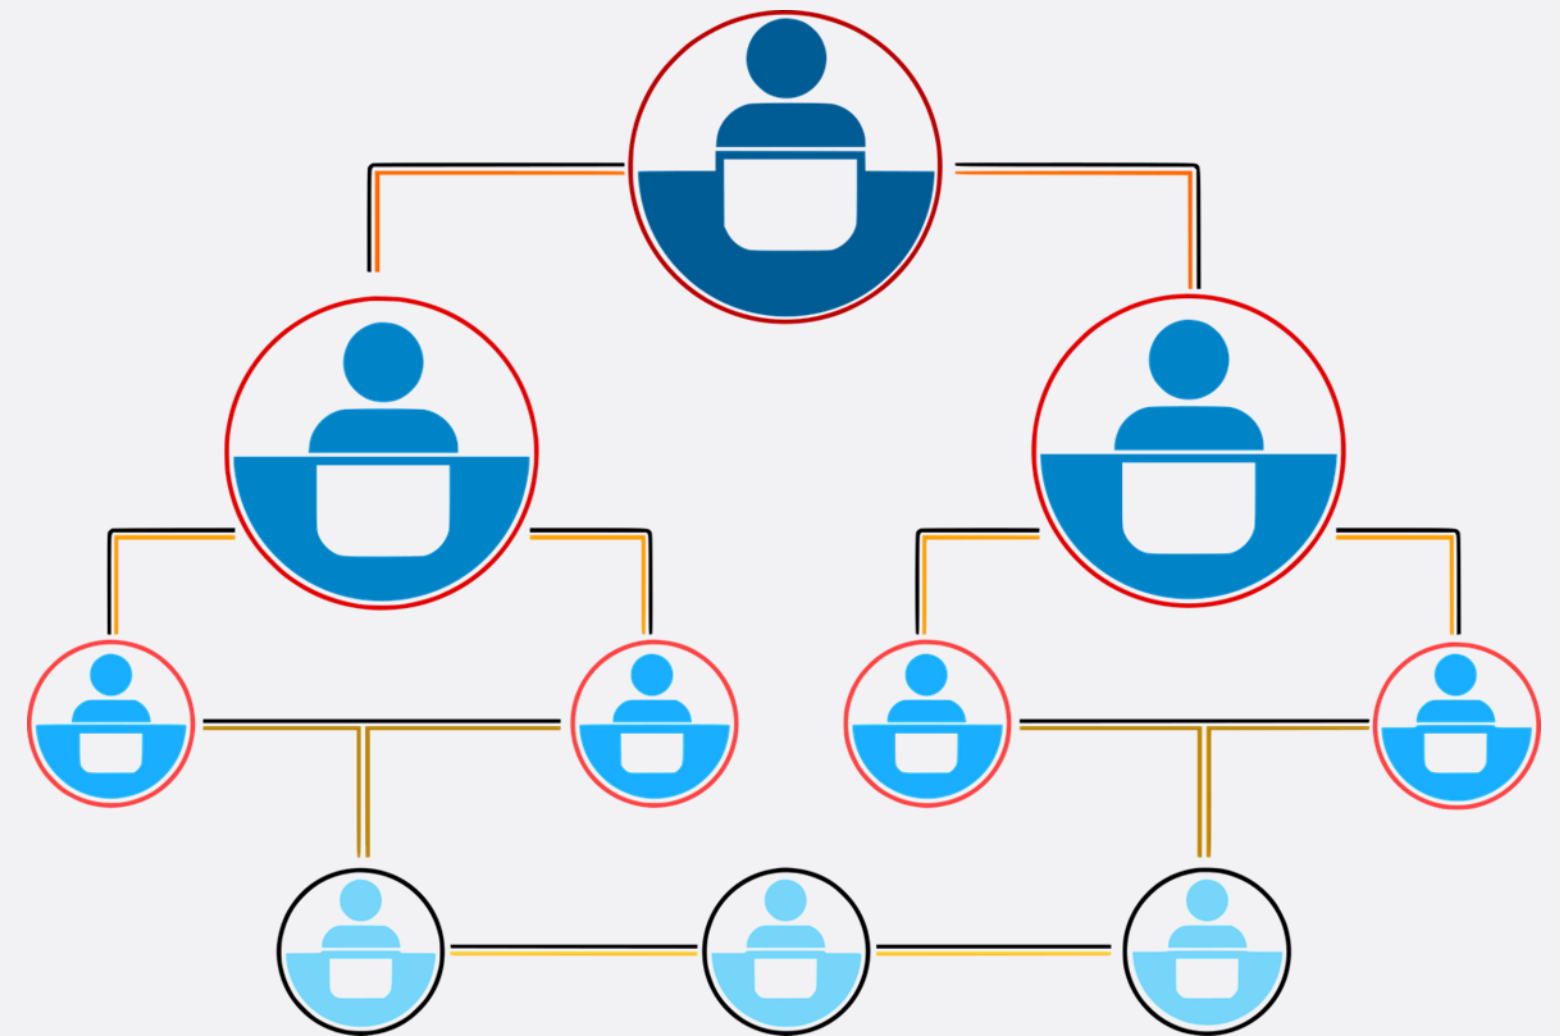

Proyectos y estructuras organizativas

Tipos de estructuras organizativas:

- Orgánico o sencillo.
- Funcional (centralizado).
- Multi-divisional.
- Matriz fuerte.
- Matriz balanceado.
- Matriz débil.
- Projectizada.
- Híbrido.

Cada una tendrá sus características, ventajas y desventajas respecto a los grupos de trabajo, autoridad del director del proyecto, disponibilidad de recursos, gestión del presupuesto y demás.

La oficina de gestión de proyectos (PMO)
es una estructura de la organización que estandariza procesos
relacionados con los proyectos.

Existen varios tipos de PMOs en las organizaciones. Cada tipo varía, en
función del grado de control e influencia que ejerce sobre los proyectos:

- De apoyo.
- De control.
- Directiva.

La PMO – Oficina de gestión de proyectos

Una función fundamental de una PMO es brindar apoyo a los directores de proyectos, de diferentes formas, que pueden incluir, entre otras:

- Gestionar recursos compartidos a través de todos los proyectos.
- Identificar y desarrollar una metodología, mejores prácticas y estándares.
- Entrenar, orientar, capacitar y supervisar.
- Monitorear el cumplimiento de los estándares, políticas, procedimientos y plantillas de la dirección de proyectos mediante auditorias de proyectos
- Coordinar la comunicación entre proyectos.

Director de proyectos

El director de proyectos juega un rol crítico en el liderazgo de un equipo de proyecto, a fin de alcanzar los objetivos de este.

Una analogía que nos puede servir es compararlo con el rol del director de una orquesta.



El director de proyectos

Miembros y roles

Un proyecto grande y una orquesta comprenden, cada uno, muchos miembros, donde cada uno juega un rol diferente.

Responsabilidad por el equipo

El director de proyecto y el director de orquesta son ambos responsables de lo que producen sus equipos. Ambos líderes necesitan adoptar una visión holística de los productos de su equipo, a fin de planificar, coordinar y completarlos.

Conocimientos y habilidades

Si bien no se espera que el director de orquesta sea capaz de tocar todos los instrumentos de la orquesta, debería contar con conocimiento, entendimiento y experiencia musical. No se espera que el director de proyectos desempeñe cada rol en el proyecto, pero debería poseer conocimientos técnicos, entendimiento y experiencia en la dirección de proyectos.

Triángulo de talentos del PMI para el director del proyecto



Reproducción y traducción de original : <https://www.pmi.org/learning/training-development/talent-triangle>

Formas de trabajar (Gestión técnica de proyectos)

Formas de trabajar son las competencias relacionadas con aspectos técnicos de ámbitos específicos de la dirección de proyectos.

Habilidades que incluyen la capacidad de:

- Centrarse en los elementos críticos de la dirección de proyectos (factores críticos de éxito del proyecto, cronograma, informes financieros, registro de incidentes).
- Adaptar las herramientas técnicas y métodos a cada proyecto.
- Hacerse tiempo para planificar exhaustivamente y priorizar diligentemente.
- Gestionar elementos del proyecto que incluyen cronogramas, costo, recursos y riesgos

Habilidades poderosas (Liderazgo)

Habilidades poderosas son los conocimientos, habilidades y comportamientos necesarios para guiar, motivar y dirigir un equipo, y así ayudar a alcanzar sus metas.

A veces, llamadas **habilidades interpersonales o habilidades blandas**.

Los proyectos se están volviendo cada vez más complicados, son cada vez más empresas que ejecutan su estrategia a través de proyectos. La dirección de proyectos es más que simplemente trabajar con números, plantillas, diagramas, gráficos y sistemas informáticos.

Un común denominador en todos los proyectos son las personas.

Habilidades poderosas (Liderazgo) (I)

Incluyen, entre otras:

Retroalimentación activa	Presentaciones	Escuchar de forma
Estilos de comunicación	Gestión de conflictos	Conciencia cultural
Toma de decisiones	Inteligencia emocional	Facilitación
Influencia	Liderazgo	Gestión de reuniones
Motivación	Negociación	Creación de relaciones
Técnica de grupo	Observación/conversación	Conciencia política
Desarrollo del espíritu de equipo	Escuchar de forma	

Visión para los negocios (Estrategia y negocios)

Visión para los negocios es el conocimiento y pericia en la industria y la organización que mejora el desempeño y la entrega de los resultados de negocio.

Las habilidades de gestión estratégica y de negocios involucran la capacidad de ver el panorama de alto nivel de la organización y negociar e implementar de manera eficaz decisiones y acciones que apoyen la alineación estratégica y la innovación.



© **Universidad de Palermo**

Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.
