

Principios y dominios de la dirección de proyectos

Los
12 principios de la dirección de proyectos proporcionan orientación.

El grado de aplicación y la forma en que se aplican vienen influenciados por el contexto de la organización y el proyecto.

TEMÁTICA DE LOS PRINCIPIOS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS	
ADMINISTRACIÓN	EQUIPO
INTERESADOS	VALOR
PENSAMIENTO SISTÉMICO	LIDERAZGO
ADAPTACIÓN	CALIDAD
COMPLEJIDAD	RIESGO
ADAPTABILIDAD Y RESILIENCIA	CAMBIO

Principios y dominios de la dirección de proyectos

Los principios de la dirección de proyectos no son prescriptivos. Están pensados para guiar el comportamiento de las personas involucradas en la gestión del proyecto.


Son de base amplia, proporcionan orientación. La forma y el grado en que se aplican en un proyecto específico dependen del contexto, la organización, el proyecto, los interesados, los entregables y el equipo de proyecto.

Los principios son coherentes entre sí y no se contradicen.

Los principios de la dirección de proyectos tienen áreas de superposición con los principios generales de gestión.

PRINCIPIO

**Ser un administrador
diligente, respetuoso y
cuidadoso**

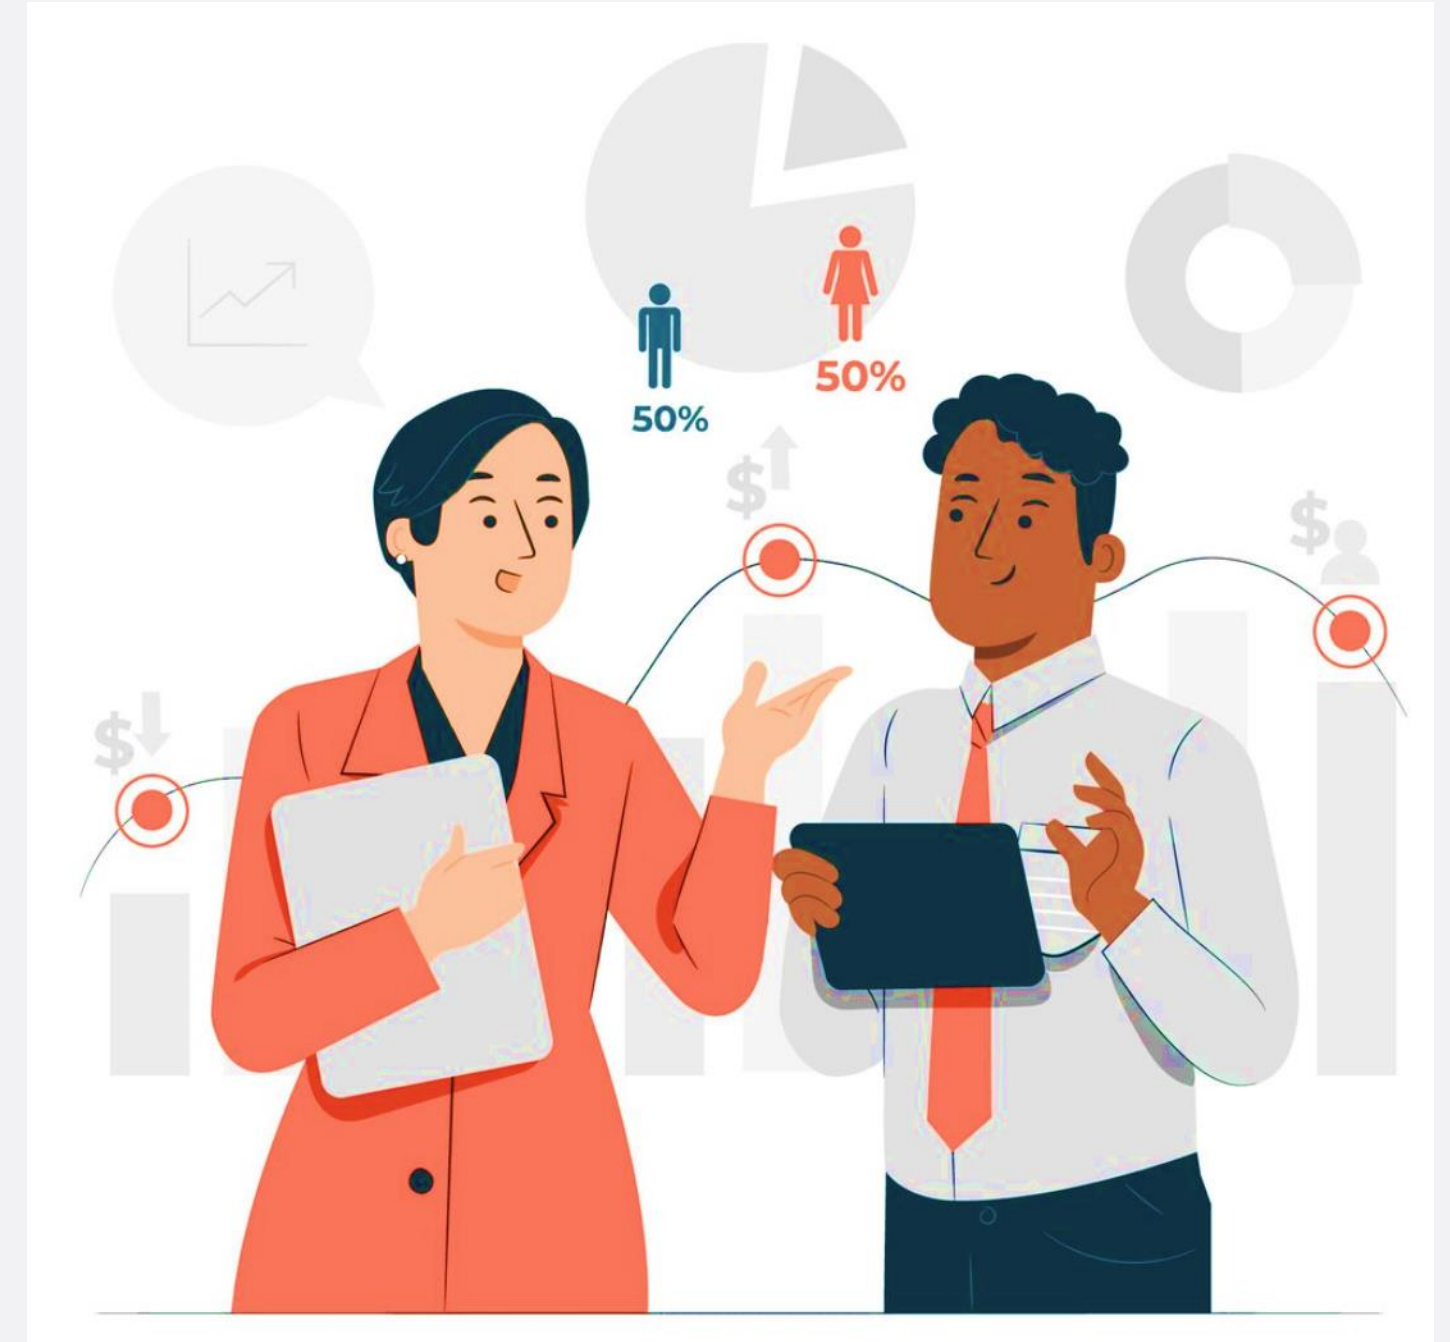

Administración

Los administradores actúan de manera responsable para llevar a cabo las actividades del proyecto mientras mantienen el cumplimiento de las pautas internas y externas.

La administración incluye responsabilidades tanto internas como externas a la organización


La administración incluye:

- ◆ **Integridad.**
- ◆ **Cuidado.**
- ◆ **Confiabilidad.**
- ◆ **Cumplimiento.**

Una visión integral de la administración toma en cuenta la conciencia financiera, la social, la técnica y la ecológica, entre otras.

PRINCIPIO

Crear un entorno
colaborativo del equipo

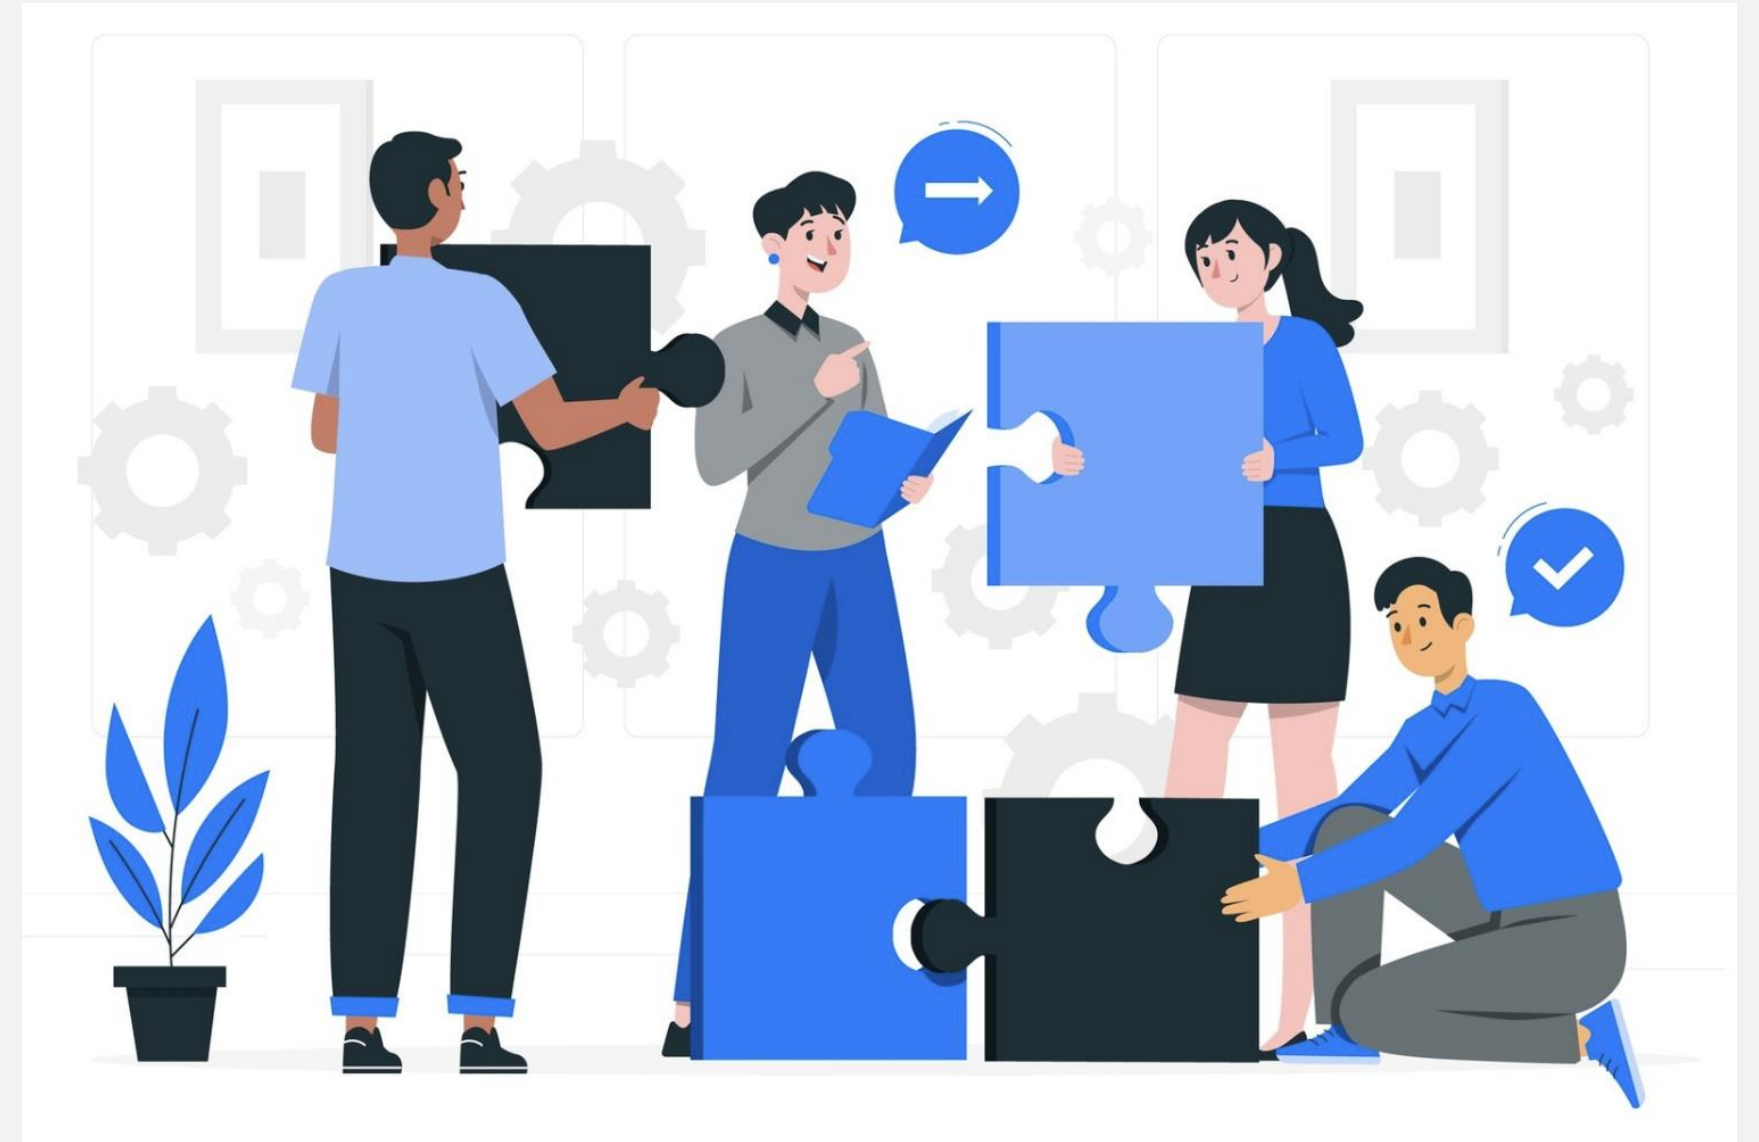

Equipo

Los equipos de proyecto entregan los proyectos.

Los equipos de proyecto están integrados por personas con distintas habilidades, conocimientos y experiencias. Los equipos que trabajan colaborando entre sí pueden lograr los objetivos de manera más efectiva y eficiente.

Los equipos de proyecto trabajan dentro de la cultura organizacional y con pautas profesionales, muchas veces generando su propia cultura.

Un entorno colaborativo del equipo de proyecto facilita:

- ◆ **El alineamiento con otras culturas y pautas organizacionales.**
- ◆ **El aprendizaje y desarrollo individual y de equipo.**
- ◆ **Las contribuciones óptimas para lograr los resultados deseados.**

PRINCIPIO

**Involucrarse eficazmente
con los interesados**



Interesados

Los interesados influyen en los proyectos, el desempeño y los resultados.

Los interesados pueden ser personas, grupos u organizaciones que pueden afectar y verse afectados por decisiones, actividades o resultados del proyecto, sea de manera positiva o negativa.


Involucrar a los interesados de manera proactiva y en la medida necesaria contribuye al éxito del proyecto y la satisfacción del cliente.

Los equipos de proyecto son un grupo de interesados. Este grupo involucra a otros interesados para comprender, considerar, comunicar y responder a sus intereses.

El involucramiento de los interesados proactivamente promueve la entrega de valor

PRINCIPIO

Enfocarse en el valor

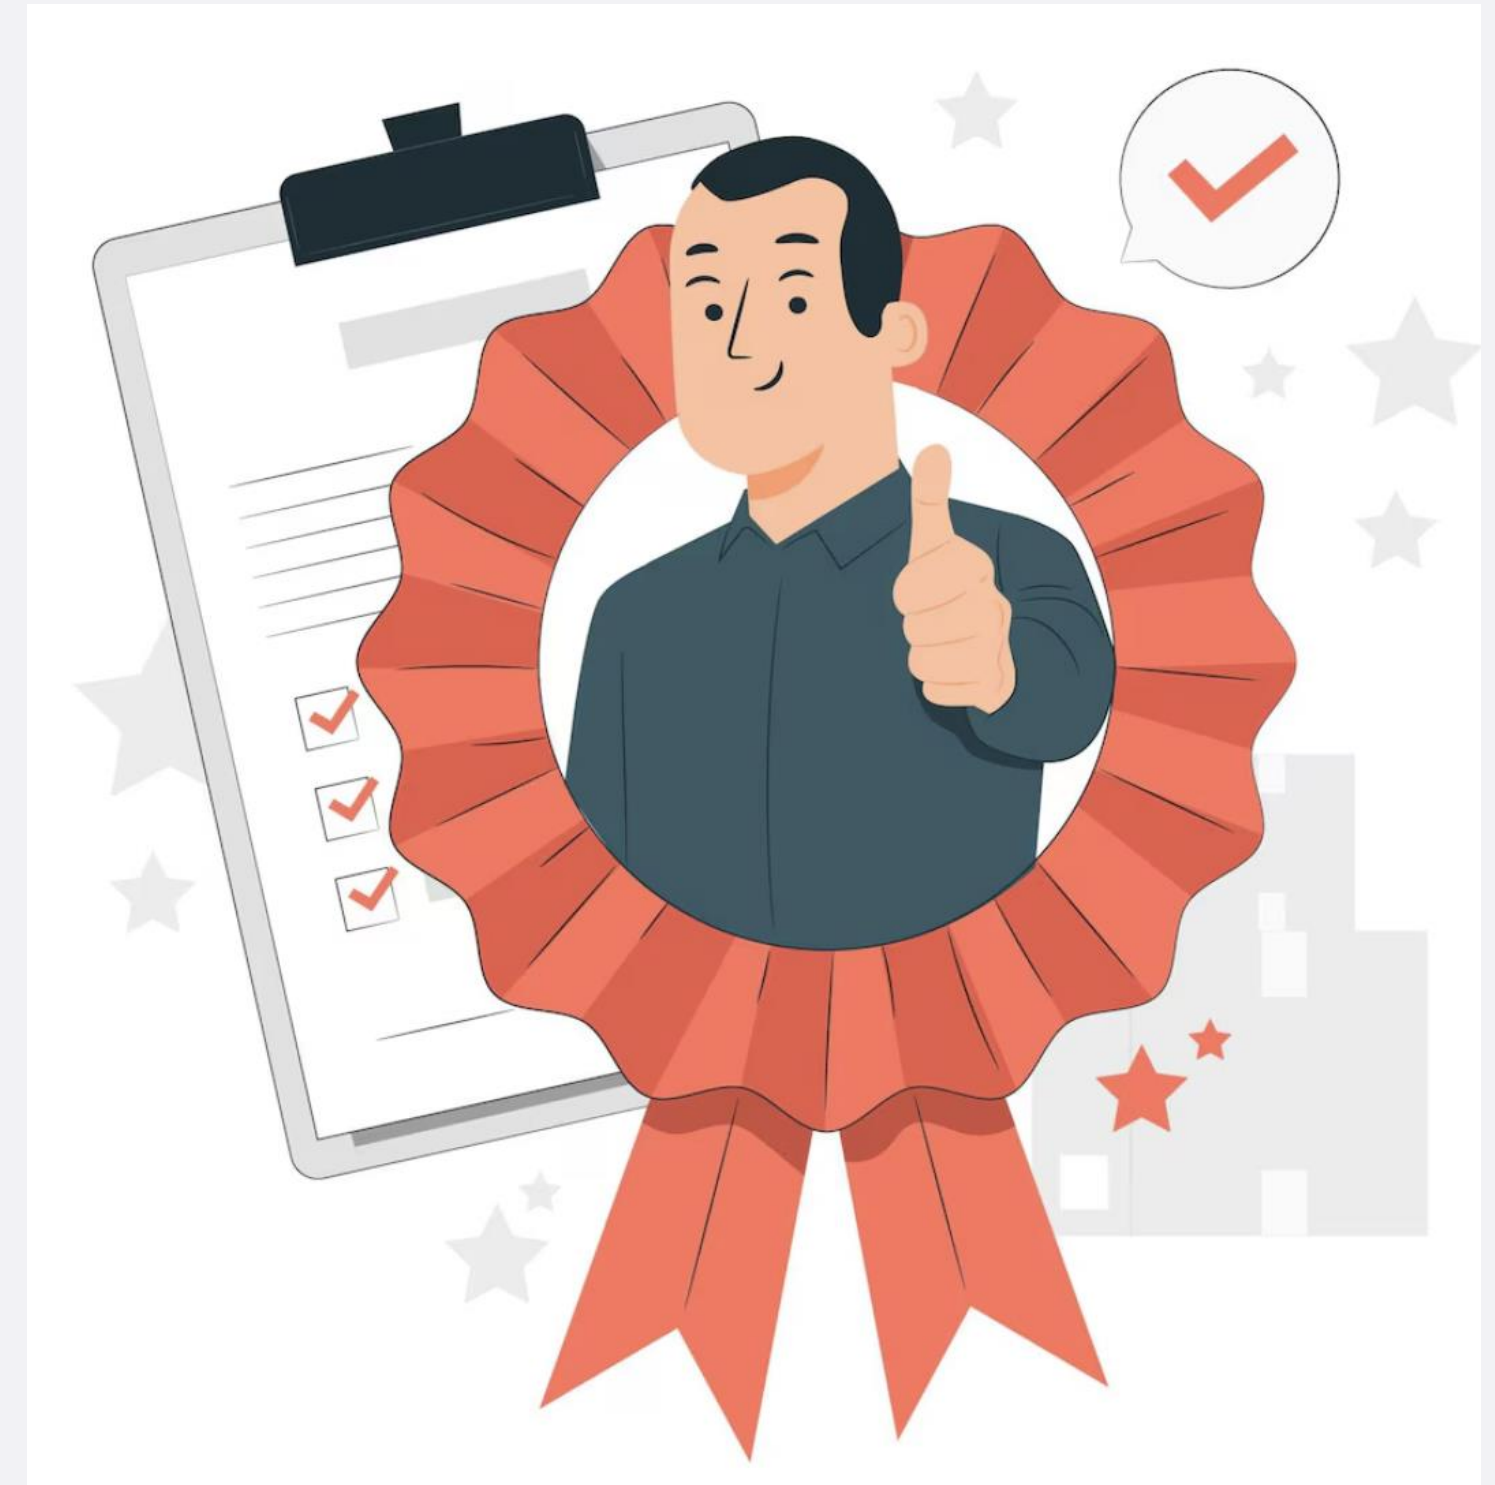

El valor es el indicador definitivo del éxito del proyecto


El valor y los beneficios que contribuyen al valor pueden definirse en términos cuantitativos y/o cualitativos. El valor se puede obtener a lo largo del proyecto, al final de este o después de que el proyecto finalizó.

Un enfoque en los resultados permite que los equipos de proyecto apoyen los beneficios previstos que conduzcan a la creación de valor.

Los equipos de proyecto evalúan el progreso y se adaptan a la alineación del proyecto con los objetivos de negocio y beneficios previstos para maximizar el valor esperado.

PRINCIPIO

**Reconocer, evaluar y
responder a las
interacciones del sistema**

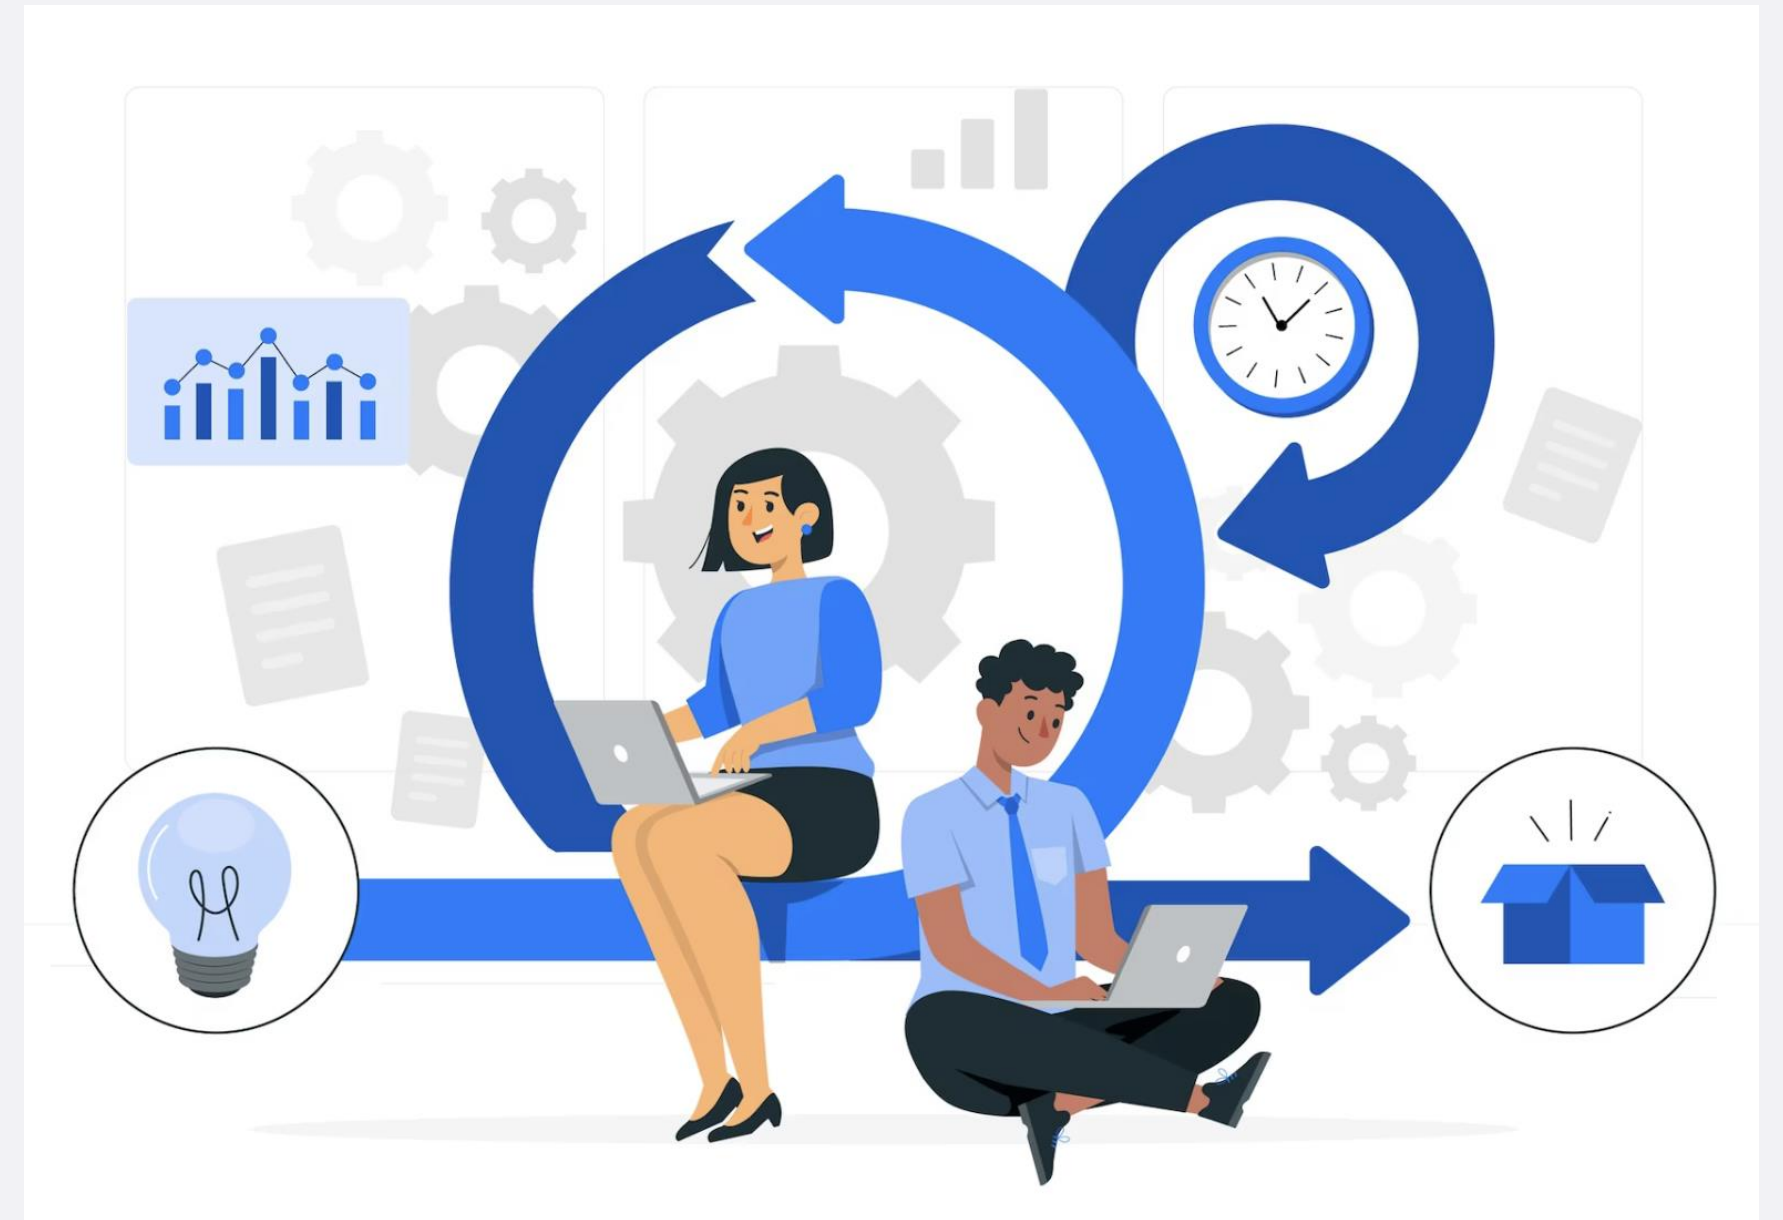

Pensamiento sistémico


Un proyecto es un sistema de dominios de actividad, interdependientes e interactuantes.

El pensamiento sistémico implica tener una visión integral de cómo las partes del proyecto interactúan entre sí y con los sistemas externos. Los sistemas cambian constantemente, lo que requiere una atención continua a las condiciones internas y externas de este.

Reconocer, evaluar y responder a las circunstancias dinámicas dentro y fuera del proyecto de una manera integral permite a los equipos de proyecto afectar positivamente el desempeño de este.

PRINCIPIO

**Demostrar conductas de
liderazgo**

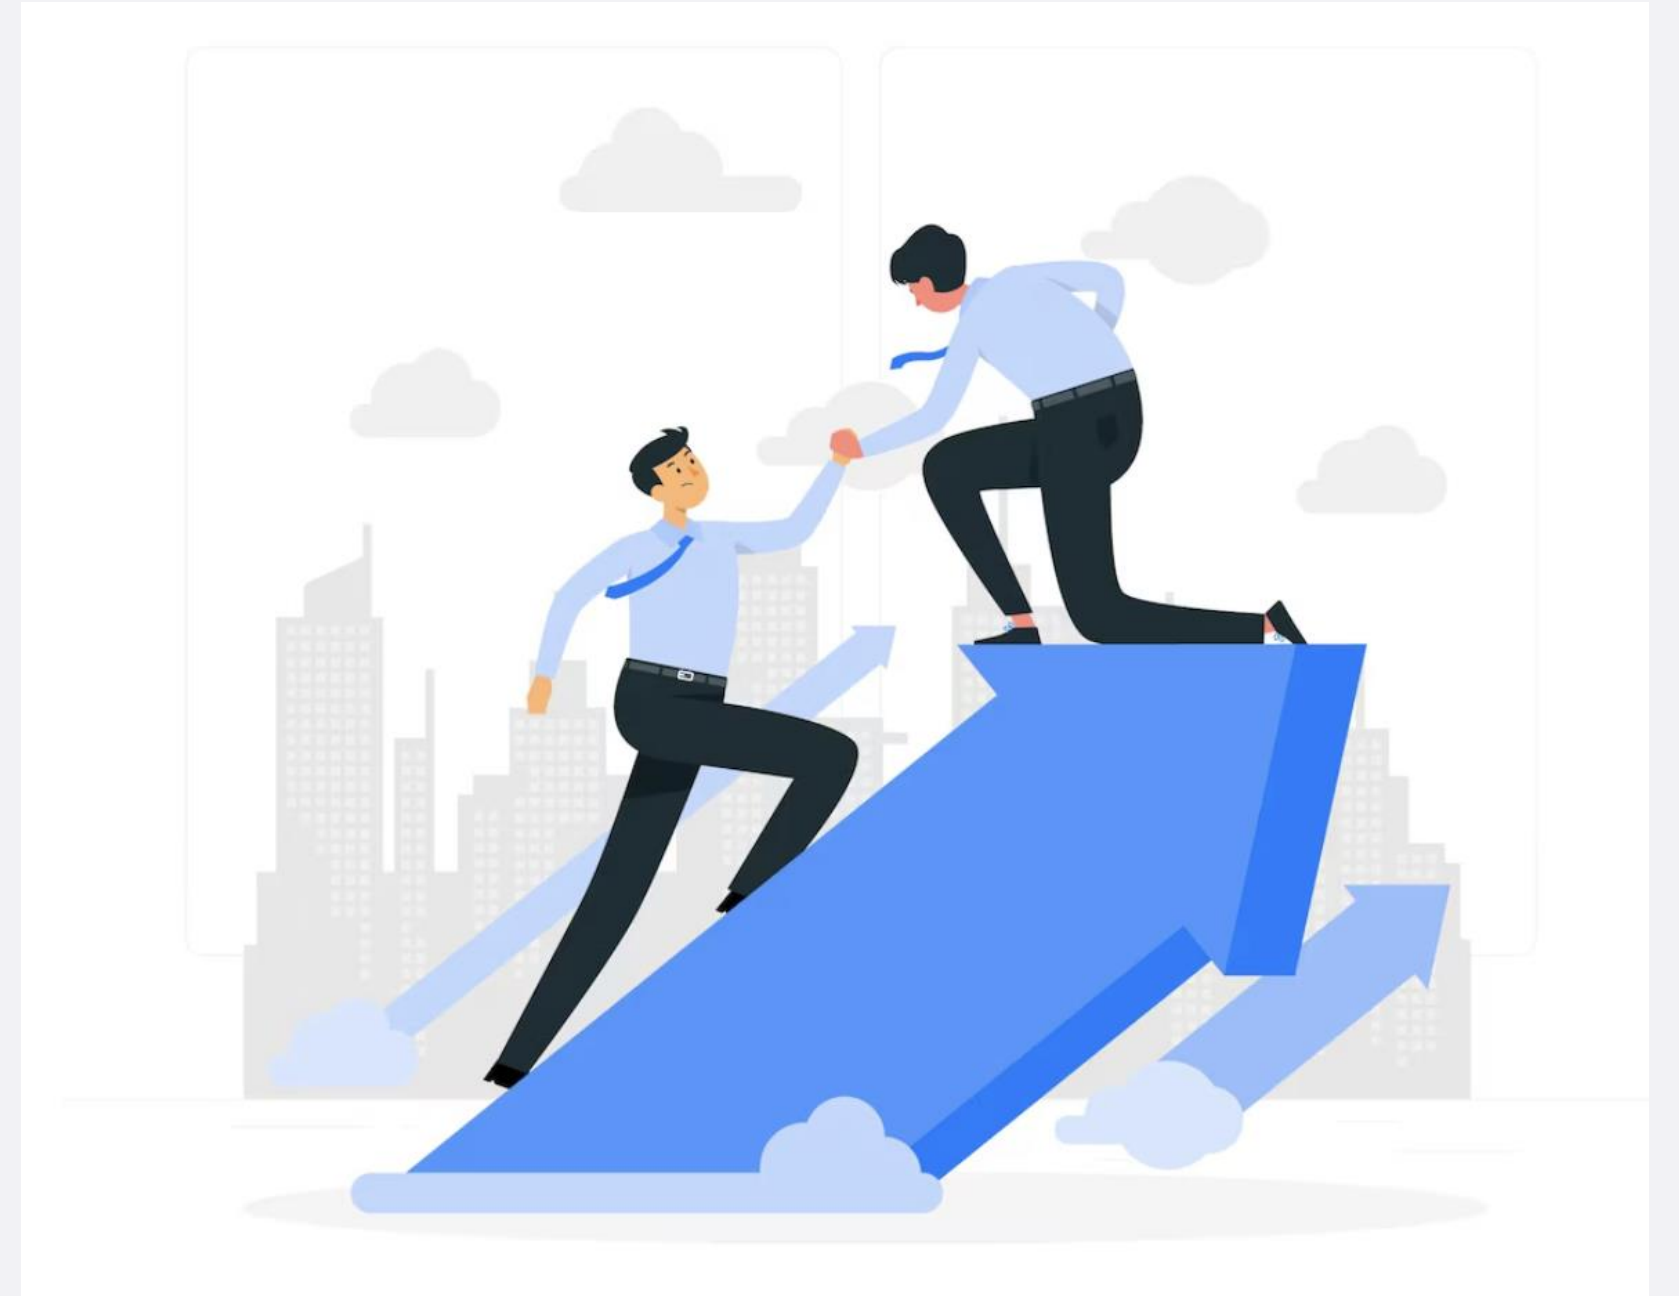

Liderazgo

El liderazgo efectivo promueve el éxito del proyecto y contribuye a los resultados positivos de este.

Cualquier miembro del equipo de proyecto puede demostrar comportamiento de liderazgo. El liderazgo es diferente a la autoridad.

Los líderes efectivos adaptan su estilo a la situación. Los líderes efectivos reconocen las diferencias en motivación entre los miembros del equipo. Demuestran y adaptan su comportamiento para apoyar las necesidades individuales y de equipo.

Los líderes demuestran comportamiento deseado en áreas de honestidad, integridad y conducta ética.

PRINCIPIO

**Adaptar con base en el
contexto**



Adaptación

Cada proyecto es único.

El éxito del proyecto se basa en adaptarse al contexto único de este. Diseñar el enfoque de desarrollo del proyecto basado en el contexto, sus objetivos, los interesados, la gobernanza..., para determinar los procesos y los métodos más apropiados para producir los resultados deseados, mientras se maximiza el valor, gestiona el costo y mejora la *performance*.

Adaptar el enfoque es iterativo, es un proceso continuo a lo largo del proyecto.

PRINCIPIO

**Incorporar la calidad en
los procesos y los
entregables**



Calidad

La calidad es el grado en el que un conjunto de características inherentes de un producto, servicio o resultado cumple con los requisitos.


La calidad del proyecto implica satisfacer las expectativas de los interesados y cumplir con los requisitos del proyecto y del producto.

Se busca mantener un enfoque en la calidad que produzca entregables que cumplan con los objetivos y se alineen con las necesidades, usos y criterios de aceptación establecidos por los interesados relevantes.

La calidad del proyecto implica garantizar que los procesos del proyecto sean apropiados y lo más eficaces posibles.

PRINCIPIO

Navegar en la complejidad

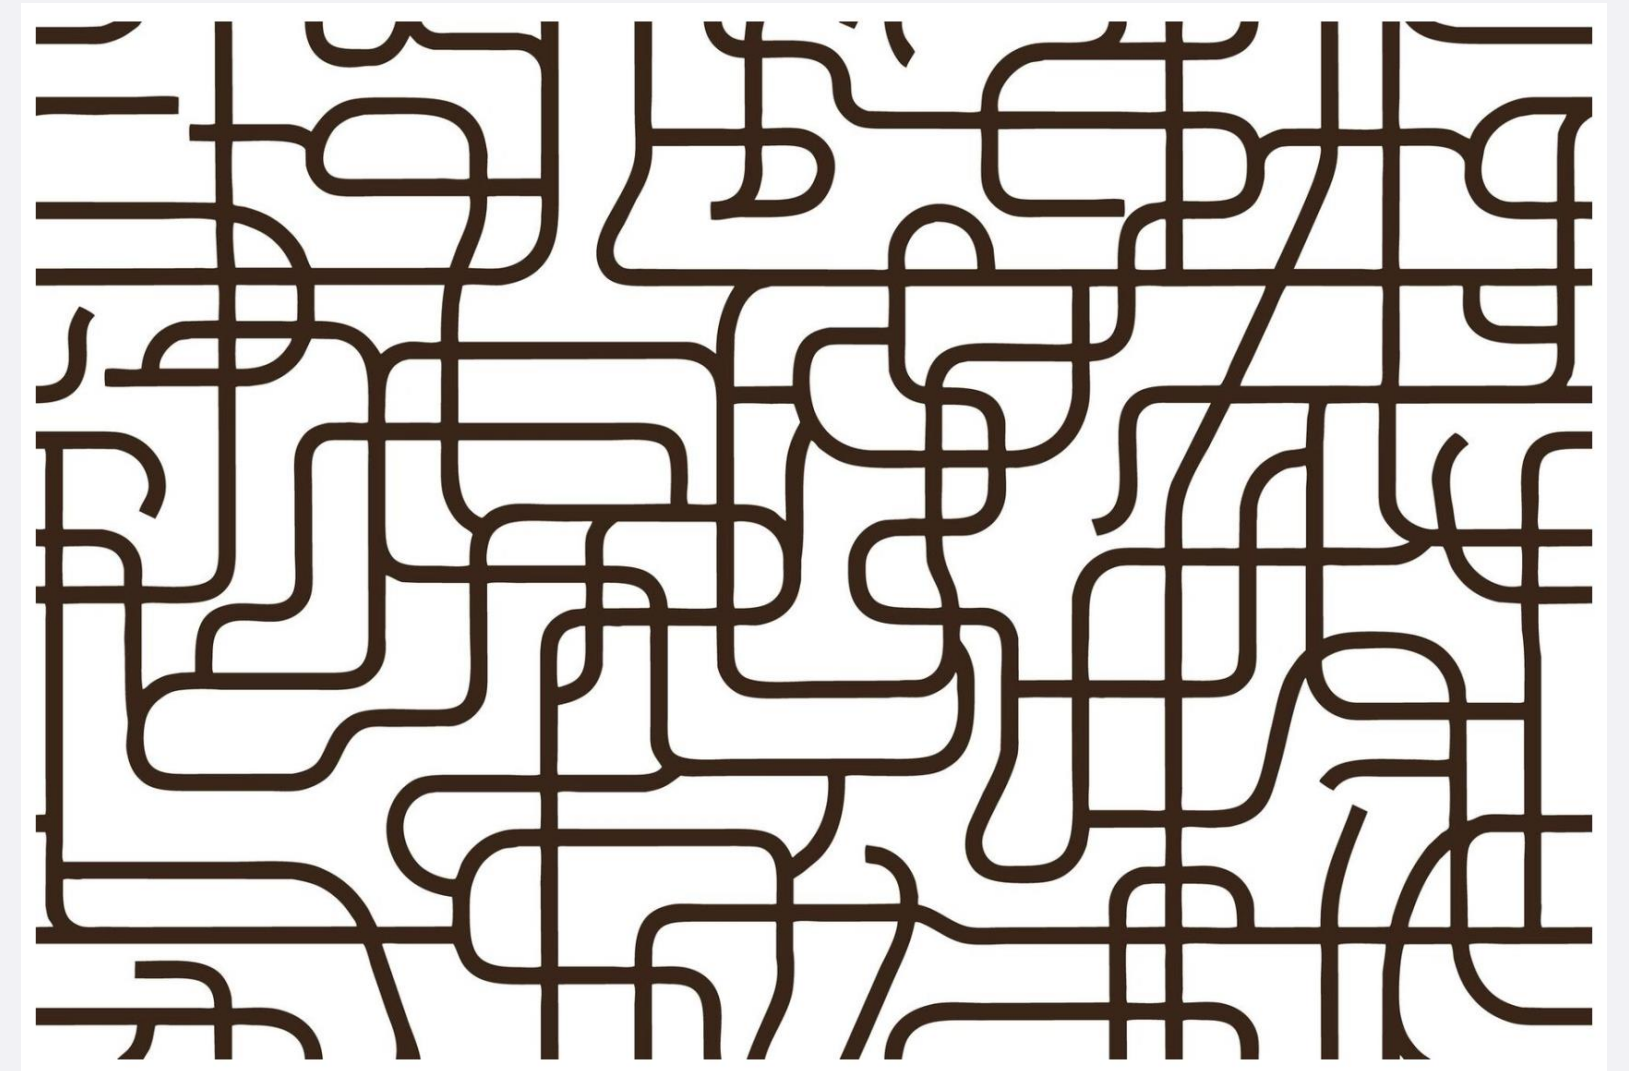

Complejidad

La complejidad es el resultado del comportamiento humano, las interacciones de los sistemas, la incertidumbre y la ambigüedad.


La complejidad puede producirse en cualquier momento durante el proyecto.

La complejidad puede ser introducida por eventos o condiciones que afectan el valor, el alcance, las comunicaciones, los interesados, el riesgo y la innovación tecnológica.

Hay que evaluar y navegar continuamente por la complejidad del proyecto, para que los enfoques y planes permitan al equipo de proyecto mantenerse atentos a la identificación de elementos de complejidad y utilizar una variedad de métodos para reducir la cantidad o su impacto y navegar con éxito por el ciclo de vida de este.

PRINCIPIO

Optimizar las respuestas a
los riesgos

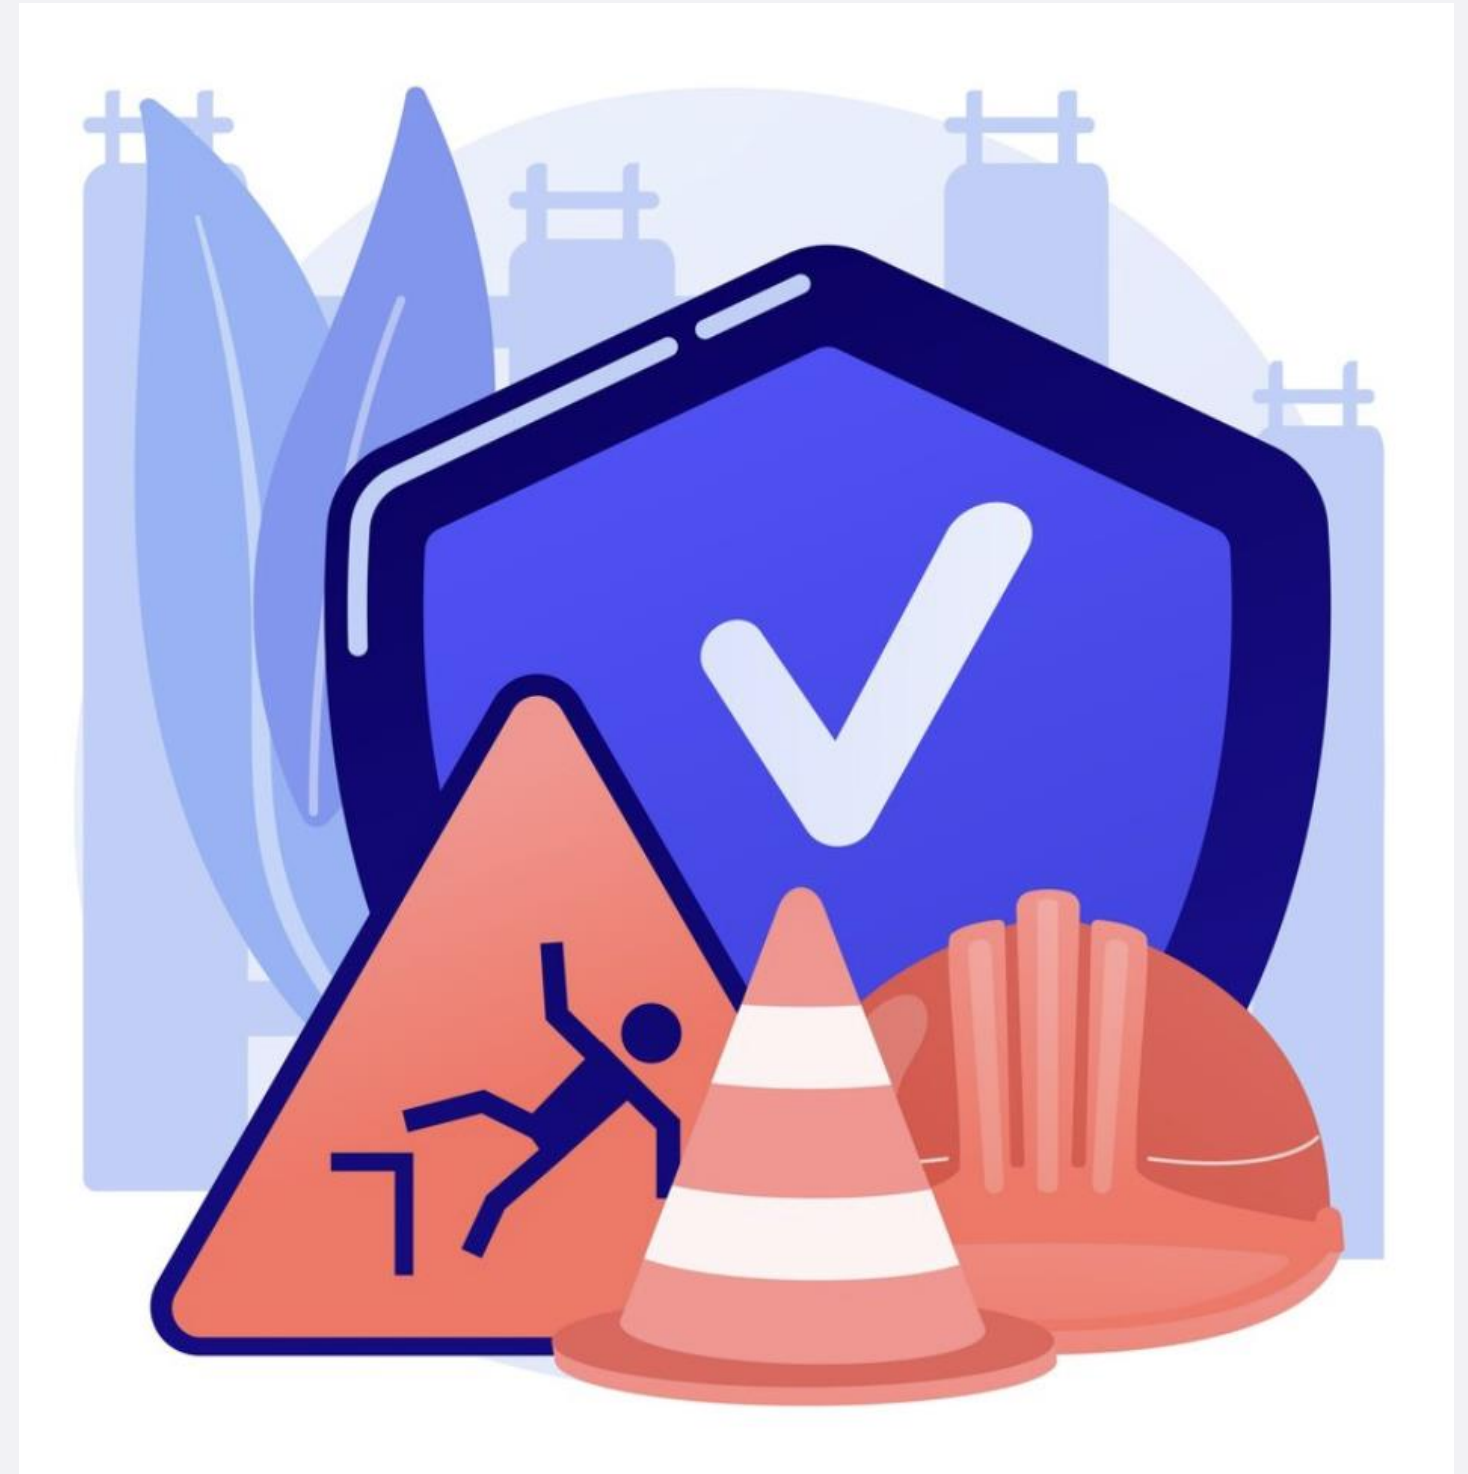

Riesgo

Los riesgos pueden afectar los proyectos.

Un riesgo es un evento o condición incierta que, si se produce, tiene un efecto positivo (oportunidad) o negativo (amenaza) en uno o más de los objetivos.

Los riesgos son abordados continuamente a lo largo del proyecto. Es conveniente evaluar constantemente la exposición al riesgo, con el fin de maximizar los impactos positivos y minimizar los impactos negativos para el proyecto y sus resultados.

La actitud, el apetito y el umbral de riesgo de una organización influyen sobre cómo se aborda este. Las respuestas a los riesgos deberían ser adecuadas a la importancia, eficientes en costos, realistas y acordadas con los interesados pertinentes.

PRINCIPIO

**Adoptar la adaptabilidad y
la resiliencia**



Adaptabilidad y resiliencia

La adaptabilidad es la capacidad de responder a condiciones cambiantes.


La resiliencia es la capacidad de absorber los impactos y de recuperarse rápidamente de un revés o fracaso.

Hay que construir adaptabilidad y resiliencia en los enfoques de la organización y del equipo de proyecto para ayudar a acomodar el cambio, recuperarse de los reveses y avanzar en el trabajo del proyecto.

La atención a los resultados, en lugar de a las salidas, facilita la adaptabilidad.

PRINCIPIO

**Permitir el cambio para
lograr el estado futuro
previsto**

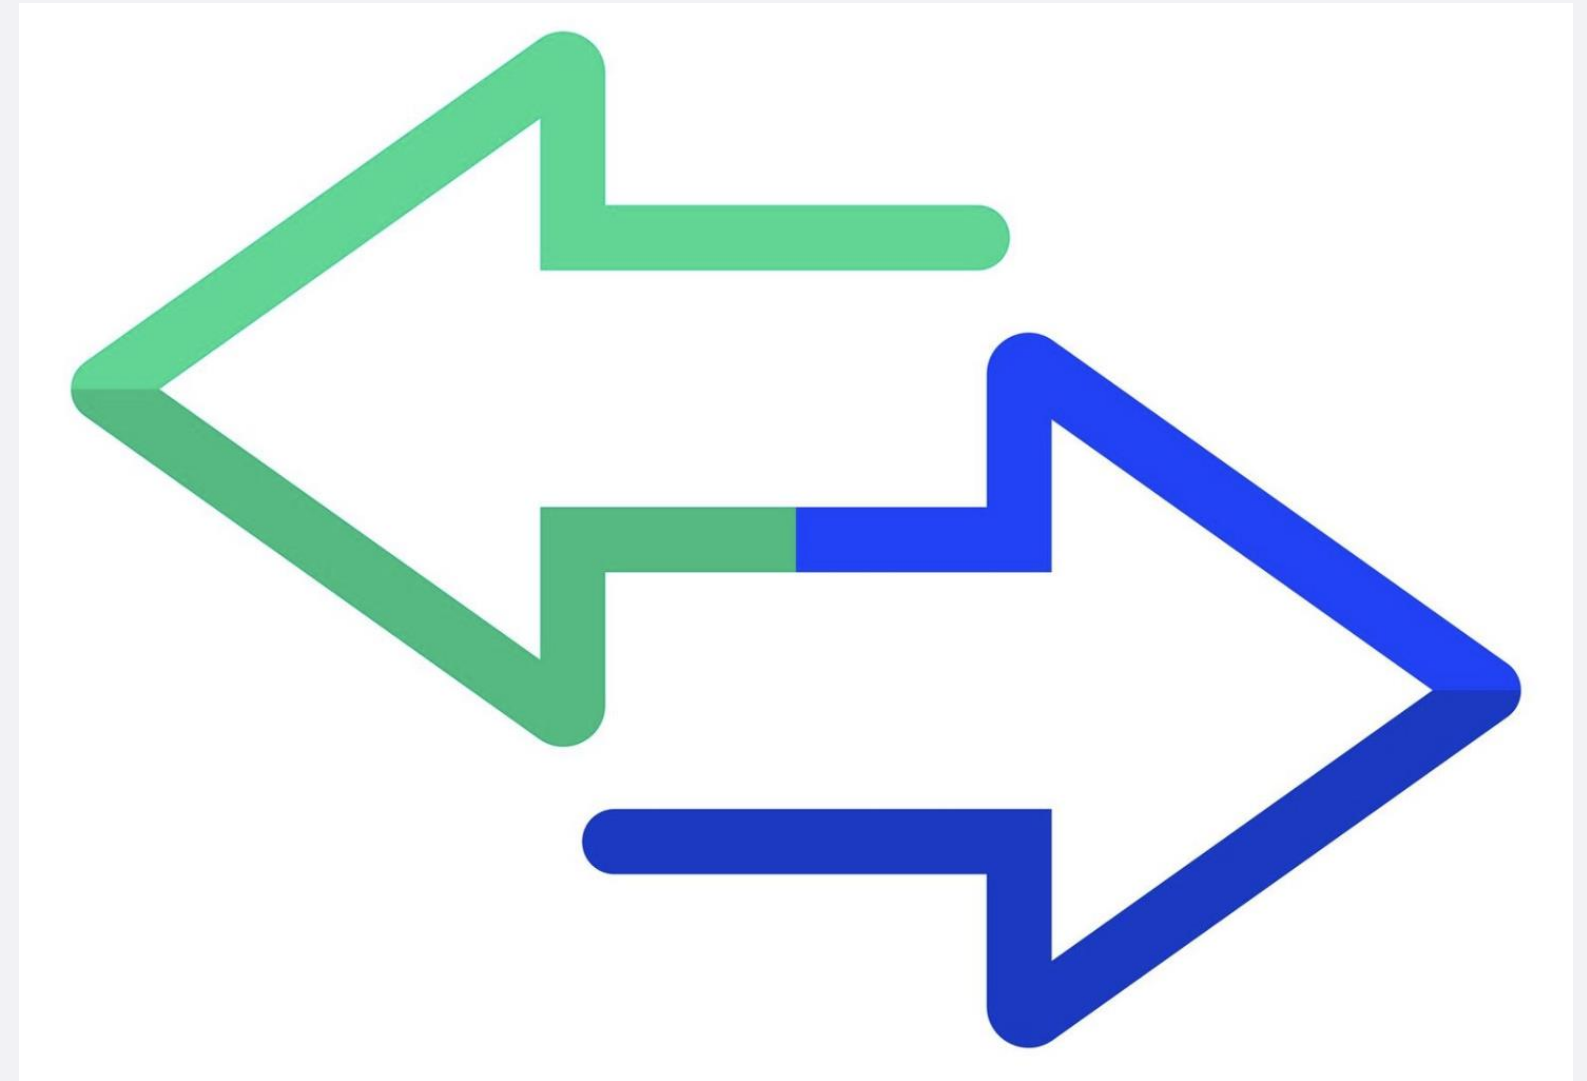

Cambio

Un enfoque estructurado para el cambio ayuda a las personas, los grupos y la organización a pasar del estado actual al estado deseado.

El cambio puede originarse a partir de las influencias internas o fuentes externas.

Facilitar el cambio puede ser un desafío, ya que no todos los interesados lo van a aceptar. Intentar demasiados cambios en un período corto puede provocar fatiga y resistencia a estos.

El involucramiento de los interesados y los enfoques motivacionales contribuyen a la adopción del cambio

Un dominio de desempeño del proyecto es un grupo de actividades relacionadas que son fundamentales para la entrega efectiva de los resultados del proyecto



Cuadro 2. Fuente propia.

Dominios de desempeño

A partir del PMBoK, versión 7, el PMI organiza las actividades del proyecto en “**dominios de desempeño**”. En las versiones anteriores, las organizaba alrededor de “áreas de conocimiento”.

El trabajo en los dominios de desempeño del proyecto se guía por los principios de la dirección de proyectos.

Al mismo tiempo que se presenta una superposición conceptual entre los principios y los dominios de desempeño, los principios guían el comportamiento, mientras que los dominios de desempeño presentan amplias áreas de enfoque en las cuales demostrar ese comportamiento.

En los siguientes módulos de la materia, vamos a desarrollar cada uno de los dominios de desempeño del proyecto.



© **Universidad de Palermo**

Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.
