

Visión estructurada en procesos

Visión estructurada en procesos

A partir del PMBoK, versión 7, el PMI pone su enfoque en una visión basada en principios.

En las versiones anteriores del PMBoK, se basaba en una visión estructurada en procesos. Este todavía es útil, pero hay que tener en cuenta una visión más amplia que englobe también otros enfoques, como enfoques ágiles, mientras que todos pueden guiarse por los principios de la dirección de proyectos.

Los

procesos de la dirección de proyectos

son actividades que se ejecutan para la dirección del proyecto.

Cada proceso de la dirección de proyectos produce una o más salidas a partir de una o más entradas, mediante la aplicación de herramientas y técnicas, competencias adecuadas para la dirección de proyectos.

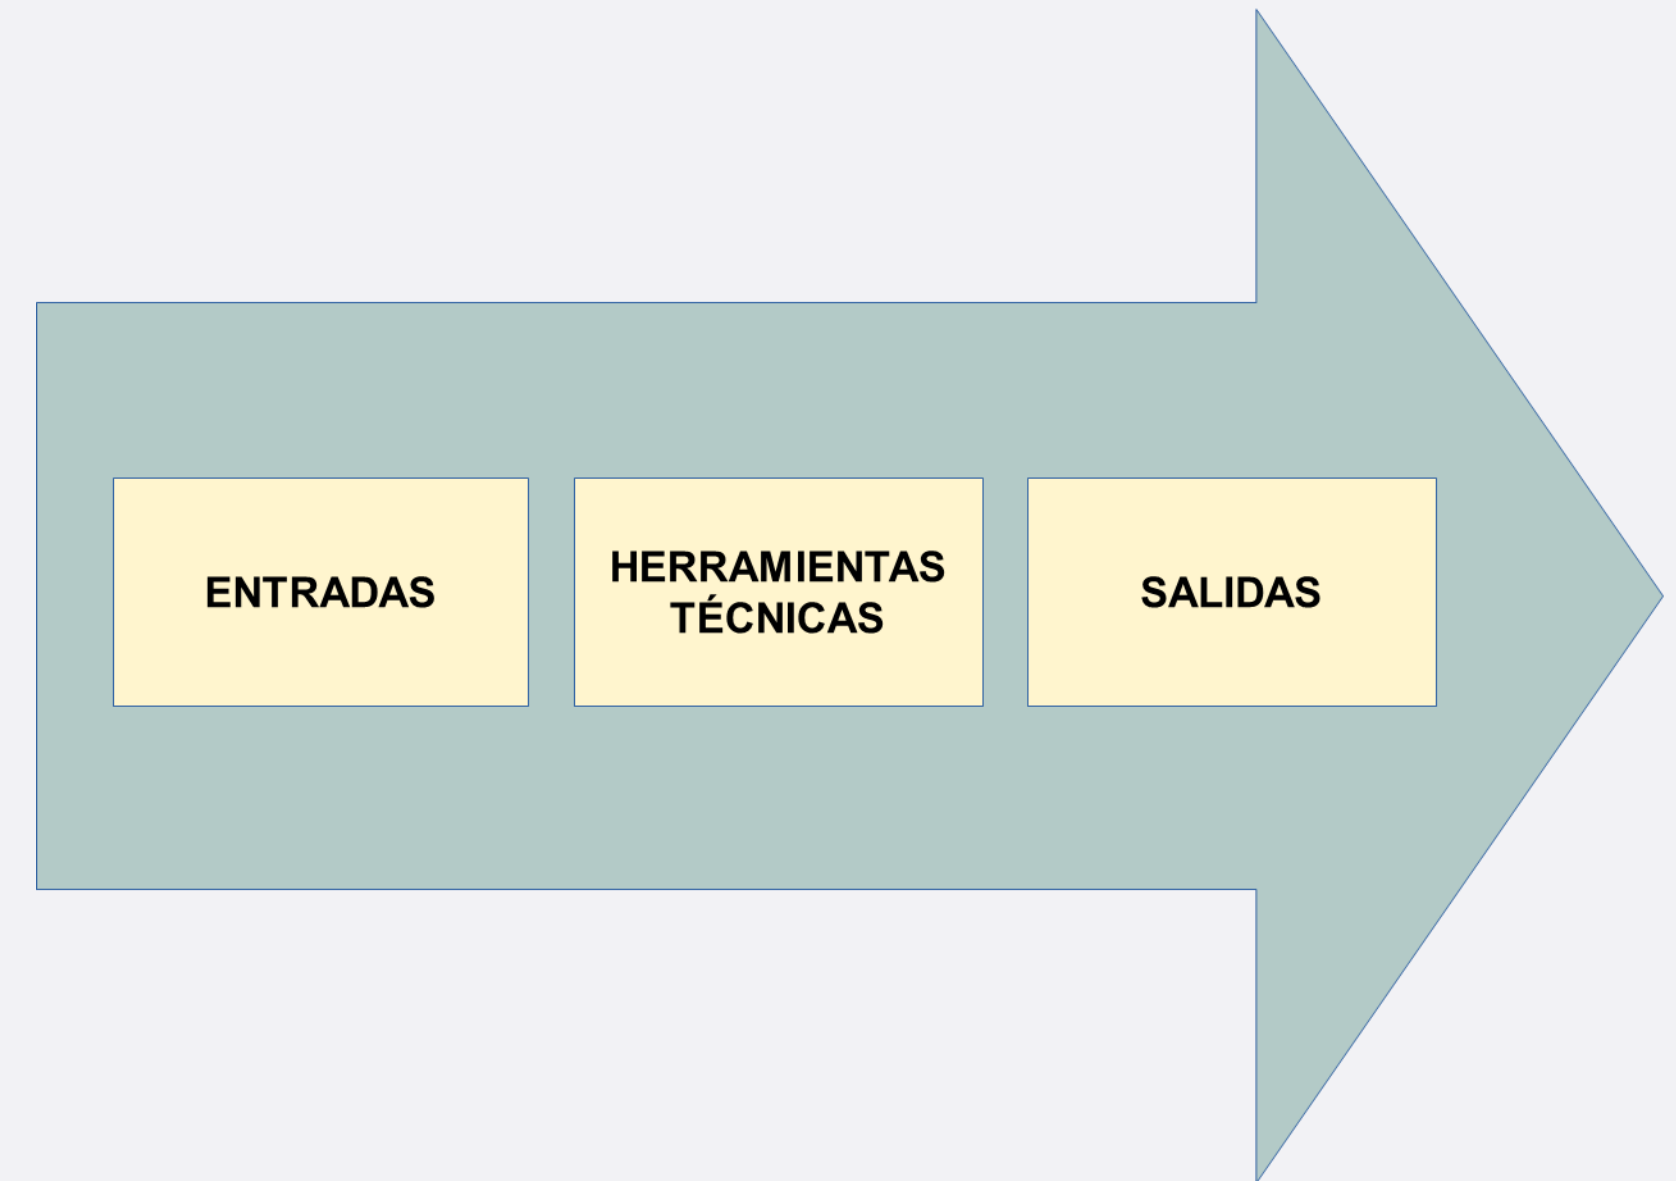


Gráfico 1. Fuente de elaboración propia

Procesos de la dirección de proyectos

Hay un total de 49 procesos definidos en el PMBoK, sin embargo, la selección de los procesos utilizados para cualquier proyecto dado depende de la organización y el proyecto específico.

Los procesos de la dirección de proyectos se vinculan lógicamente entre sí, por los resultados que producen.

En general, los procesos se encuadran en tres categorías:

- Procesos utilizados una única vez (Por ej.: “desarrollar el acta de constitución del proyecto”).
- Procesos que se llevan a cabo periódicamente según sea necesario (Por ej.: “adquirir recursos”).
- Procesos que se realizan de manera continua a lo largo de todo el proyecto (Por ej.: “definir las actividades”).

Los **grupos de procesos de la dirección de proyectos** son agrupamientos lógicos de procesos de dirección para alcanzar objetivos específicos del proyecto.

Los grupos de procesos son independientes de las fases del proyecto.

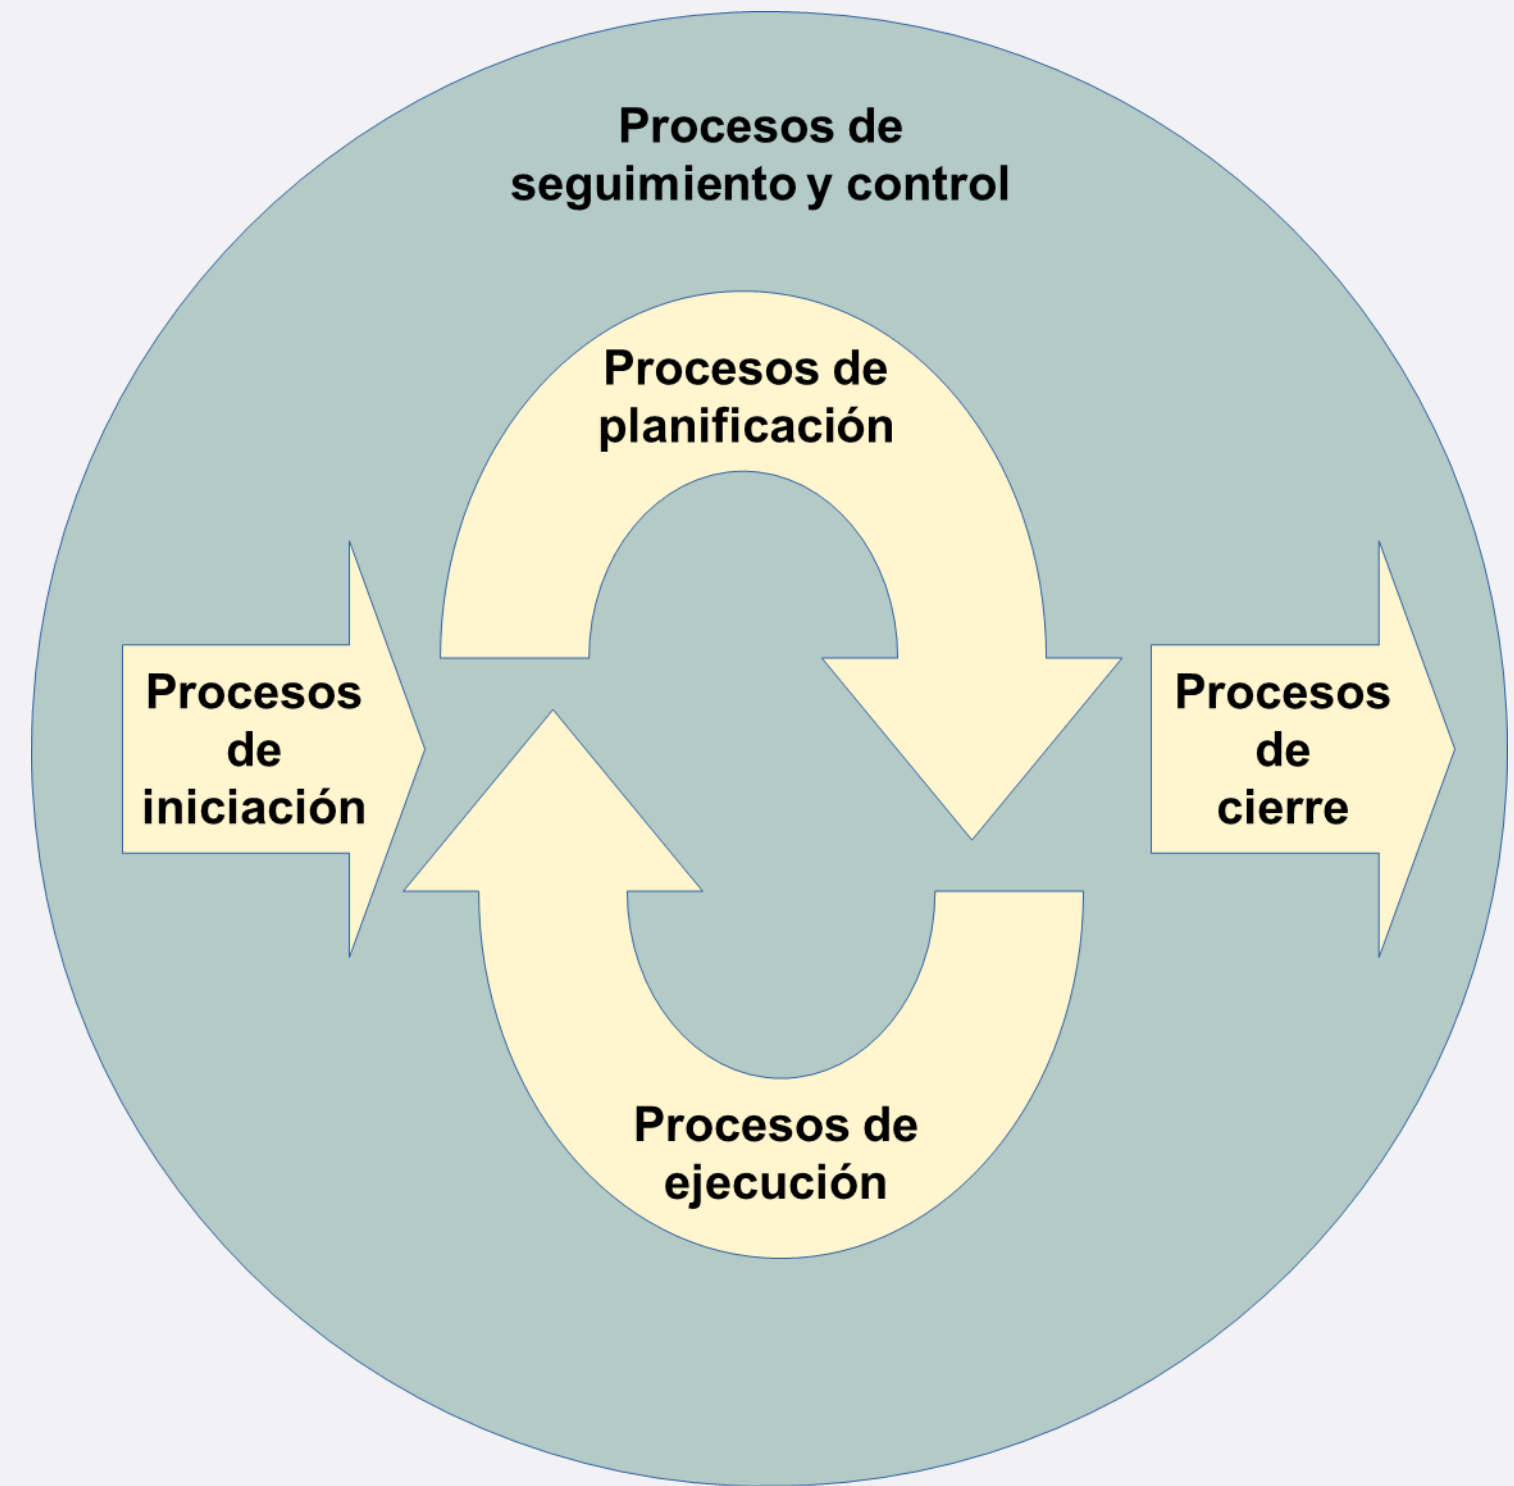


Gráfico 2. Fuente de elaboración propia

Grupos de procesos de la dirección de proyectos

Los procesos de dirección de proyectos se agrupan en los siguientes 5 grupos:

- **Grupo de procesos de inicio.** Procesos realizados para definir un nuevo proyecto o nueva fase de un proyecto existente al obtener la autorización para iniciar el proyecto o fase.
- **Grupo de procesos de planificación.** Procesos requeridos para establecer el alcance del proyecto, refinar los objetivos y definir el curso de acción requerido para alcanzar los objetivos del presupuesto del proyecto.
- **Grupo de procesos de ejecución.** Procesos realizados para completar el trabajo definido en el plan para la dirección del proyecto, a fin de satisfacer los requisitos del proyecto.
- **Grupo de procesos de monitoreo y control.** Procesos requeridos para hacer seguimiento, analizar y regular el progreso y el desempeño del proyecto. Para identificar áreas en las que el plan requiera cambios y para iniciar los cambios correspondientes.
- **Grupos de procesos de cierre.** Procesos llevados a cabo para completar o cerrar formalmente el proyecto, fase o contrato.

Grupo de procesos de inicio

Los procesos de inicio son los siguientes:

- **Desarrollar el acta de constitución del proyecto.**
- **Identificar a los interesados.**

Grupo de procesos de planificación

Los procesos de planificación son los siguientes:

- **Desarrollar el plan para la dirección de proyectos.**
- **Planificar la gestión del alcance.**
- **Recopilar requisitos.**
- **Definir el alcance.**
- **Crear la EDT/WBS.**
- **Planificar la gestión del cronograma.**
- **Definir las actividades.**
- **Secuenciar las actividades.**
- **Estimar la duración de las actividades.**
- **Desarrollar el cronograma.**

Grupo de procesos de planificación (I)

- Planificar la gestión de los costos.
- Estimar los costos.
- Determinar el presupuesto.
- Planificar la gestión de calidad.
- Planificar la gestión de los recursos.
- Estimar los recursos de las actividades.
- Planificar la gestión de las comunicaciones.
- Planificar la gestión de los riesgos.
- Identificar los riesgos.
- Realizar el análisis cualitativo de los riesgos.
- Realizar el análisis cuantitativo de los riesgos.
- Planificar la respuesta a los riesgos.
- Planificar la gestión de las adquisiciones.
- Planificar el involucramiento de los interesados.

Grupo de procesos de ejecución

Los procesos de ejecución son los siguientes:

- **Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto.**
- **Gestionar el conocimiento del proyecto.**
- **Gestionar la calidad.**
- **Adquirir recursos.**
- **Desarrollar el equipo.**
- **Dirigir el equipo.**
- **Gestionar las comunicaciones.**
- **Implementar la respuesta a los riesgos.**
- **Efectuar las adquisiciones.**
- **Gestionar la participación de los interesados.**

Grupo de procesos de monitoreo y control

Los procesos de monitoreo y control son los siguientes:

- **Monitorear y controlar el trabajo del proyecto.**
- **Realizar el control integral de cambios.**
- **Validar el alcance.**
- **Controlar el alcance.**
- **Controlar el cronograma.**
- **Controlar los costos.**
- **Controlar la calidad.**
- **Controlar los recursos.**
- **Monitorear las comunicaciones.**
- **Monitorear los riesgos.**
- **Controlar las adquisiciones.**
- **Monitorear el involucramiento de los interesados.**

Grupo de procesos de cierre

Los procesos de cierre son los siguientes:

- **Cerrar el proyecto o fase.**

Hasta la versión 6 del PMBoK, el PMI agrupaba las actividades del proyecto en “áreas de conocimiento”.

Un **área de conocimiento** era un área identificada de la dirección de proyectos, definida por sus requisitos de conocimiento.

Existían 10 áreas de conocimiento de la dirección de proyectos.



Áreas de conocimiento de la dirección de proyectos

Gestión de la integración de proyectos. Son los procesos y actividades para identificar, definir, combinar, unificar y coordinar los diversos procesos y actividades de dirección de proyecto dentro de los grupos de procesos de la dirección de proyectos.

Gestión del alcance de proyecto. Son los procesos requeridos para garantizar que el proyecto incluye todo el trabajo requerido y, únicamente, el trabajo requerido para completarlo con éxito

Gestión del cronograma del proyecto. Son los procesos requeridos para administrar la finalización del proyecto a tiempo.

Gestión de los costos del proyecto. Son los procesos involucrados en planificar, estimar, presupuestar, financiar, obtener financiamiento, controlar y gestionar los costos, de modo que se complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado.

Gestión de la calidad del proyecto. Son los procesos para incorporar la política de calidad de la organización en cuanto a la planificación, gestión y control de los requisitos de calidad del proyecto y del producto, a fin de satisfacer las expectativas de los interesados.

Áreas de conocimiento de la dirección de proyectos (I)

Gestión de los recursos del proyecto. Son los procesos para identificar, adquirir y gestionar los recursos necesarios para la conclusión exitosa del proyecto.

Gestión de las comunicaciones del proyecto. Son los procesos requeridos para garantizar que la planificación, recopilación, creación, distribución, almacenamiento, gestión, control, monitoreo y disposición final de la información del proyecto sean oportunos y adecuados.

Gestión de los riesgos del proyecto. Son los procesos para llevar a cabo la planificación de la gestión, identificación, análisis, planificación de respuesta, implementación de respuesta y monitoreo de los riesgos de un proyecto.

Gestión de las adquisiciones del proyecto. Son los procesos necesarios para la compra o adquisición de los productos o servicios o requeridos por fuera del equipo de proyecto.

Gestión de los interesados del proyecto. Son los procesos requeridos para identificar a las personas, grupos u organizaciones que pueden afectar o ser afectados por el proyecto, para analizar las expectativas y su impacto, y para desarrollar estrategias adecuadas, a fin de lograr la participación eficaz de los interesados.



© **Universidad de Palermo**

Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.
