


Acta de constitución. Plan para la dirección del proyecto

El dominio de desempeño del trabajo del proyecto aborda las actividades y funciones asociadas en el establecimiento de los procesos del proyecto, la gestión de los recursos físicos y el fomento de un entorno de aprendizaje.

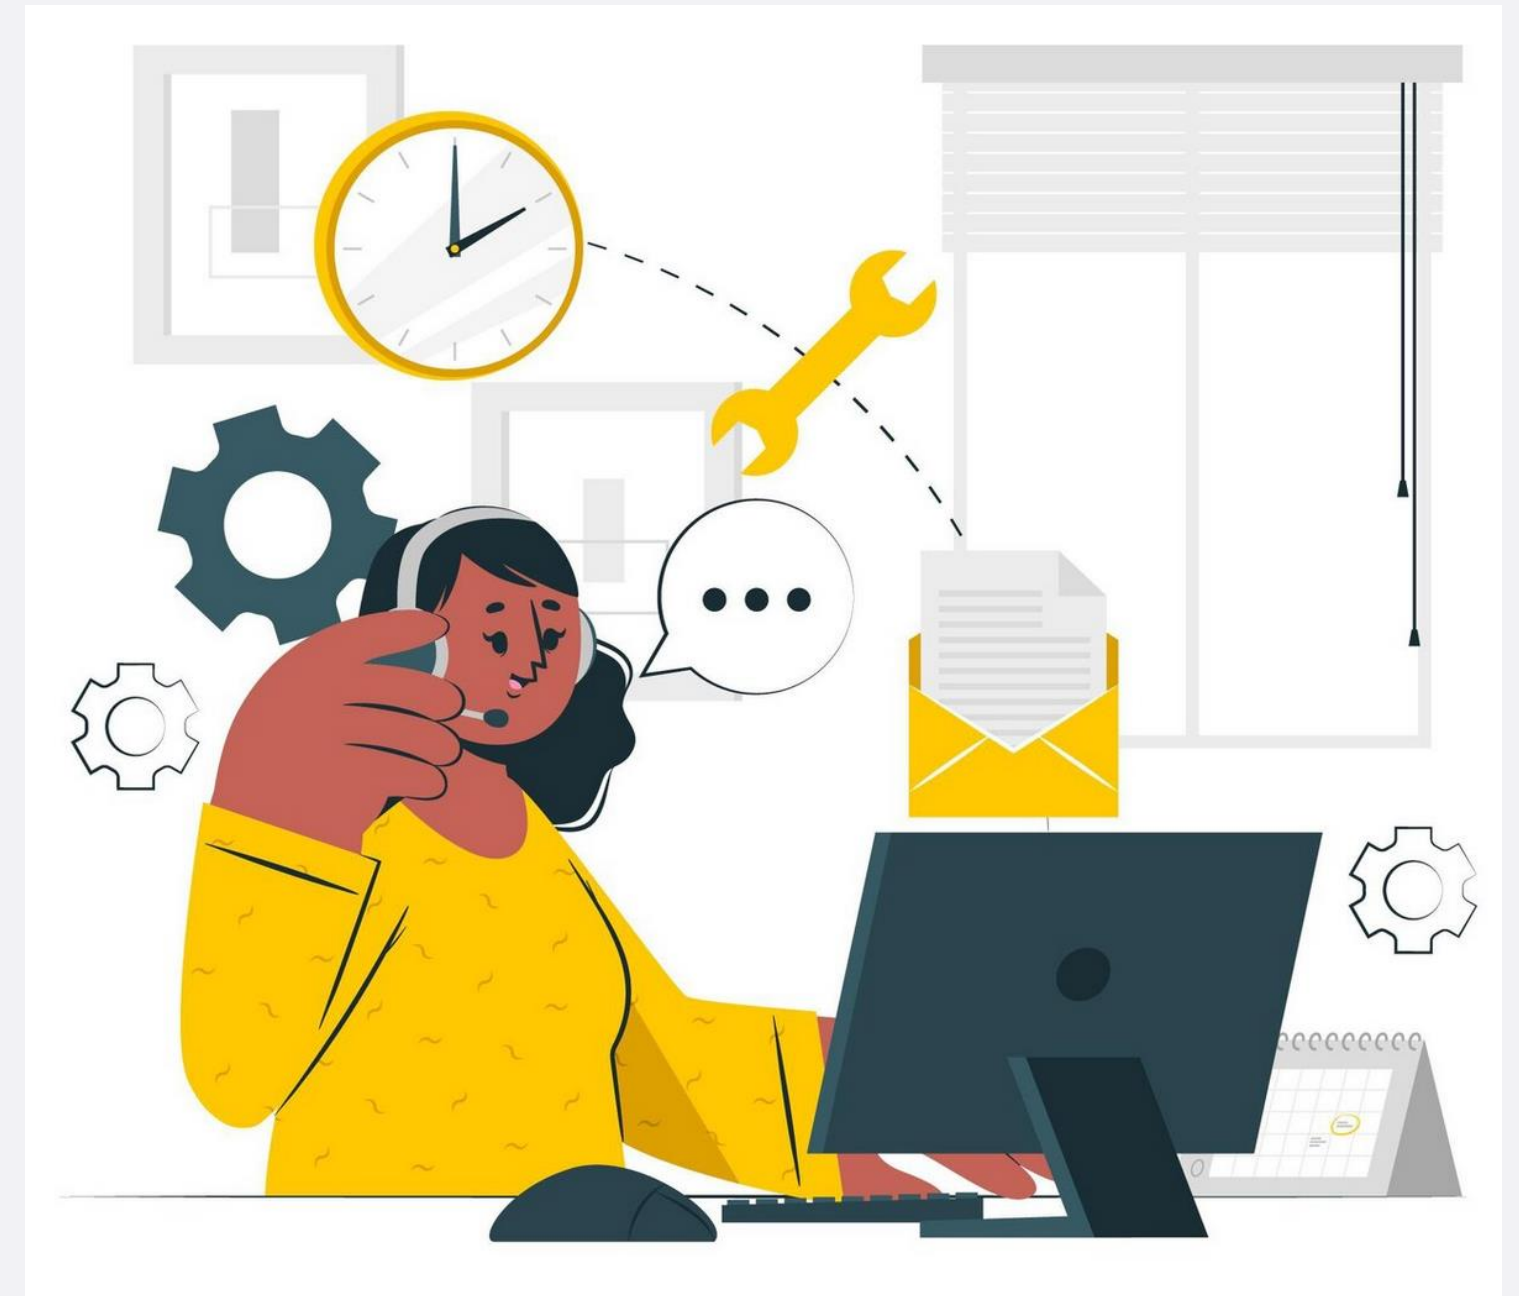

Gestión de la integración del proyecto

Este dominio de desempeño lo podemos pensar como la gestión de la integración del proyecto donde tenemos que identificar, definir, unificar y coordinar las distintas actividades de los dominios de desempeño del proyecto.

Siguiendo una visión más estructurada en procesos, tendríamos el desarrollo de documentos importantes del proyecto, como el acta de constitución del proyecto y un plan de la dirección del proyecto.

Entre otras actividades, también tendremos que:

- ◆ Liderar y llevar a cabo el trabajo definido en el plan de dirección de proyectos.
- ◆ Control integrado de cambios.
- ◆ Gestionar el conocimiento del proyecto.

El **acta de constitución de proyecto** es el proceso de desarrollar un documento que autoriza formalmente la existencia de un proyecto.
Comprende un resumen ejecutivo del proyecto.



Acta de constitución

El acta de constitución del proyecto (*project charter*) es un documento emitido por el patrocinador/*sponsor* del proyecto. Confiere al director del proyecto la autoridad para asignar los recursos de la organización a las actividades del proyecto.

Proporciona un vínculo directo entre el proyecto y los objetivos estratégicos de la organización. Crea un registro formal del proyecto y muestra el compromiso de la organización con este.

Dependiendo las prácticas de la organización y el enfoque de desarrollo, puede ser más informal el documento y tener otro nombre. Es una buena práctica contar con un documento que formalice la autorización y justificación del proyecto.

Acta de constitución (I)

El acta de constitución del proyecto documenta la información de alto nivel acerca del proyecto y el producto, servicio o resultado único, tal como:

- ◆ El propósito del proyecto y justificación.
- ◆ La descripción de alto nivel del proyecto, los límites y los entregables clave.
- ◆ Los requisitos de alto nivel.
- ◆ Los objetivos medibles del proyecto y los criterios de éxito asociados.
- ◆ El riesgo general del proyecto.
- ◆ El resumen de cronograma de hitos.
- ◆ Los recursos financieros preaprobados.
- ◆ La lista de interesados clave.
- ◆ El director del proyecto asignado, su responsabilidad y su nivel de autoridad.

La **triple restricción** es un marco para evaluar demandas contrapuestas.

Nos dice que es imposible fijar arbitrariamente todas las variables de la triple restricción; alguna de estas variables terminará ajustando por sí sola.

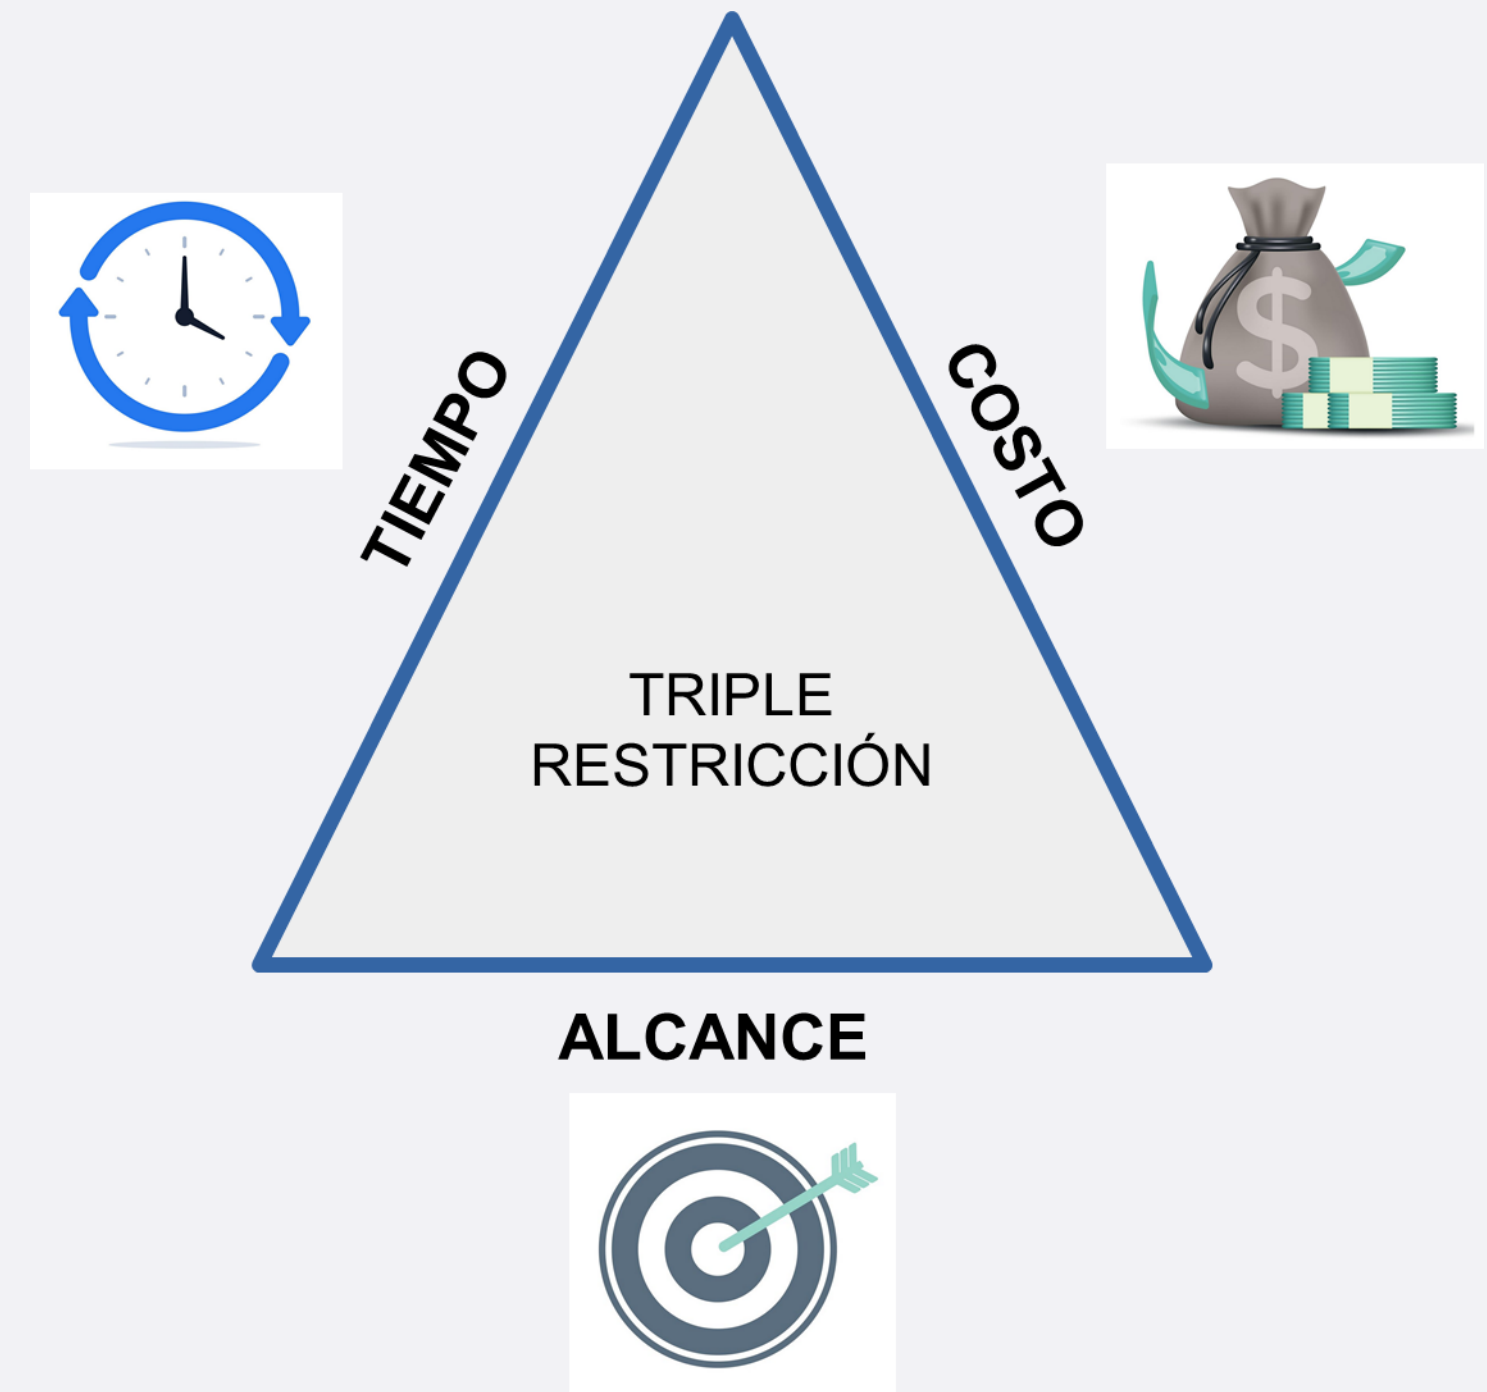


Diagrama de elaboración propia

La “triple restricción”

En la triple restricción clásica, las variables son: alcance, tiempo y costo.

La triple restricción es válida para todos los proyectos con independencia de cuál sea su tamaño o naturaleza. Las variables están estrechamente relacionadas, así que cualquier cambio en alguna de ellas afectará necesariamente a las otras, de manera positiva o negativa.

Las restricciones pueden moverse y cambiar a lo largo del proyecto.

Hoy en día, se sigue utilizando el término “triple restricción”, pero en la ecuación de restricciones ya no hay solo tres variables, sino que se pueden incluir, por ejemplo, las siguientes seis variables: alcance, tiempo, costo, calidad, riesgo y satisfacción del cliente.

Después de la aprobación del proyecto, el establecimiento de objetivos y planificación inicial, es frecuente dar una presentación formal del proyecto al grupo de usuarios clave y del equipo de proyecto a través de lo que se suele denominar reuniones de lanzamiento o ***“kick off”***.



Reunión de lanzamiento o “*kick off*” del proyecto

Puede haber varias reuniones de lanzamiento o “*kick off*”, dependiendo del tamaño, la complejidad y el tiempo requerido para el proyecto. Por ejemplo, una reunión de lanzamiento para el grupo del negocio y una separada para la gente del IT.

Esta reunión involucra a los principales responsables de la planificación, incluido el director de proyecto, el asistente del director de proyecto para ciertas áreas de conocimiento, expertos en la materia y líderes funcionales y técnicos.

Algunos de los temas que se discute en la reunión de “*kick off*” son:

- ◆ Alcance inicial del proyecto (aspectos de negocio y técnico).
- ◆ Definición del éxito del proyecto.
- ◆ Supuestos y restricciones encontrados en el acta de constitución del proyecto.
- ◆ Organigrama del grupo del proyecto (si se conoce en ese momento).
- ◆ Los participantes roles y responsabilidades.

Realizar el **control integrado de cambios** es el proceso de revisar todas las solicitudes de cambio, aprobar y gestionar los cambios y comunicar las decisiones.



Control integrado de cambios

El beneficio es que permite que los cambios documentados dentro del proyecto sean considerados de una manera integrada y también aborda el riesgo general del proyecto, que se puede incrementar si no hay un control adecuado.

Si, por ejemplo, se agrega más alcance al proyecto, hay que analizar las implicaciones en el presupuesto de este, el tiempo que se agrega al cronograma y la disponibilidad de recursos, entre otras cosas. El director de proyectos y el patrocinador tienen que gestionar las expectativas alrededor de agregar alcance a este.

El control de cambios se hace durante todo el proyecto y es responsabilidad del director de proyecto. Más allá de que inicialmente un cambio puede venir de una petición verbal, tiene que ser registrado formalmente en un documento y pasar por el proceso de control integrado de cambios.

Gestionar el conocimiento del proyecto es el proceso de utilizar el conocimiento existente y crear nuevo conocimiento para alcanzar los objetivos del proyecto y contribuir al aprendizaje organizacional.



Aprendizaje a través del proyecto

Mucho aprendizaje aparece durante la vida del proyecto. Algunos de los aprendizajes son específicos de este, como hacer más rápido un trabajo específico. Otros aprendizajes se pueden compartir con otros miembros del equipo, como un enfoque en el aseguramiento de la calidad para tener menos defectos. Y otros aprendizajes pueden ser compartidos en la organización, como el entrenamiento de usuarios o el uso de un nuevo *software*.

Estos nuevos conocimientos tienen que ser gestionados. Como un proyecto es un esfuerzo temporal, mucho del conocimiento se puede perder una vez terminado este. Hay que estar atentos a la transferencia de conocimiento no solo para obtener entregar valor con el proyecto actual, sino también para permitirle a la organización ganar conocimiento desde la experiencia.

Registro de lecciones aprendidas

Las lecciones aprendidas son conocimientos y entendimientos obtenidos a partir de la experiencia durante el proyecto. Muestran cómo eventos y actividades del proyecto fueron llevados a cabo o cómo podrían ser llevados a cabo en un futuro, con el propósito de mejorar el rendimiento. El objetivo es evitar errores y repetir éxitos, facilitando la mejora continua.

Componentes de las lecciones aprendidas pueden incluir:

- ◆ Categoría y descripción de la situación.
- ◆ Acciones tomadas.
- ◆ Resultados e impacto.
- ◆ Análisis y evaluaciones.
- ◆ Recomendaciones.

Una vez terminado el proyecto, se tiene que transferir este registro a un repositorio de la organización.



© **Universidad de Palermo**

Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.
