

Planificación de los costos

La **gestión de los costos del proyecto** incluye los procesos involucrados en planificar, estimar, presupuestar, financiar, obtener financiamiento, gestionar y controlar los costos, de modo que se complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado.



Costo
es el desembolso económico
que implica la oferta de un
servicio o la elaboración de
un producto.



Tipos de costos. Fijos vs. variables

Costos fijos

Son los que permanecen constantes durante un rango relevante de tiempo o actividad, sin importar si cambia el volumen, como sería el caso de los sueldos, la depreciación en línea recta y el alquiler de un edificio.



- Los costos fijos totales no varían en función del nivel de actividad.
- Los costos fijos unitarios varían en forma inversa al nivel de actividad.

Costos variables

Son los que cambian o fluctúan en relación directa con una actividad o volumen dado. Dicha actividad puede ser referida a producción o ventas: la materia prima cambia, de acuerdo con la función de producción, y las comisiones, de acuerdo con las ventas.

- Los costos variables totales varían en función del nivel de actividad.
- Los costos variables unitarios no varían en función al nivel de actividad.

Tipos de costos. Fijos vs. variables (I)

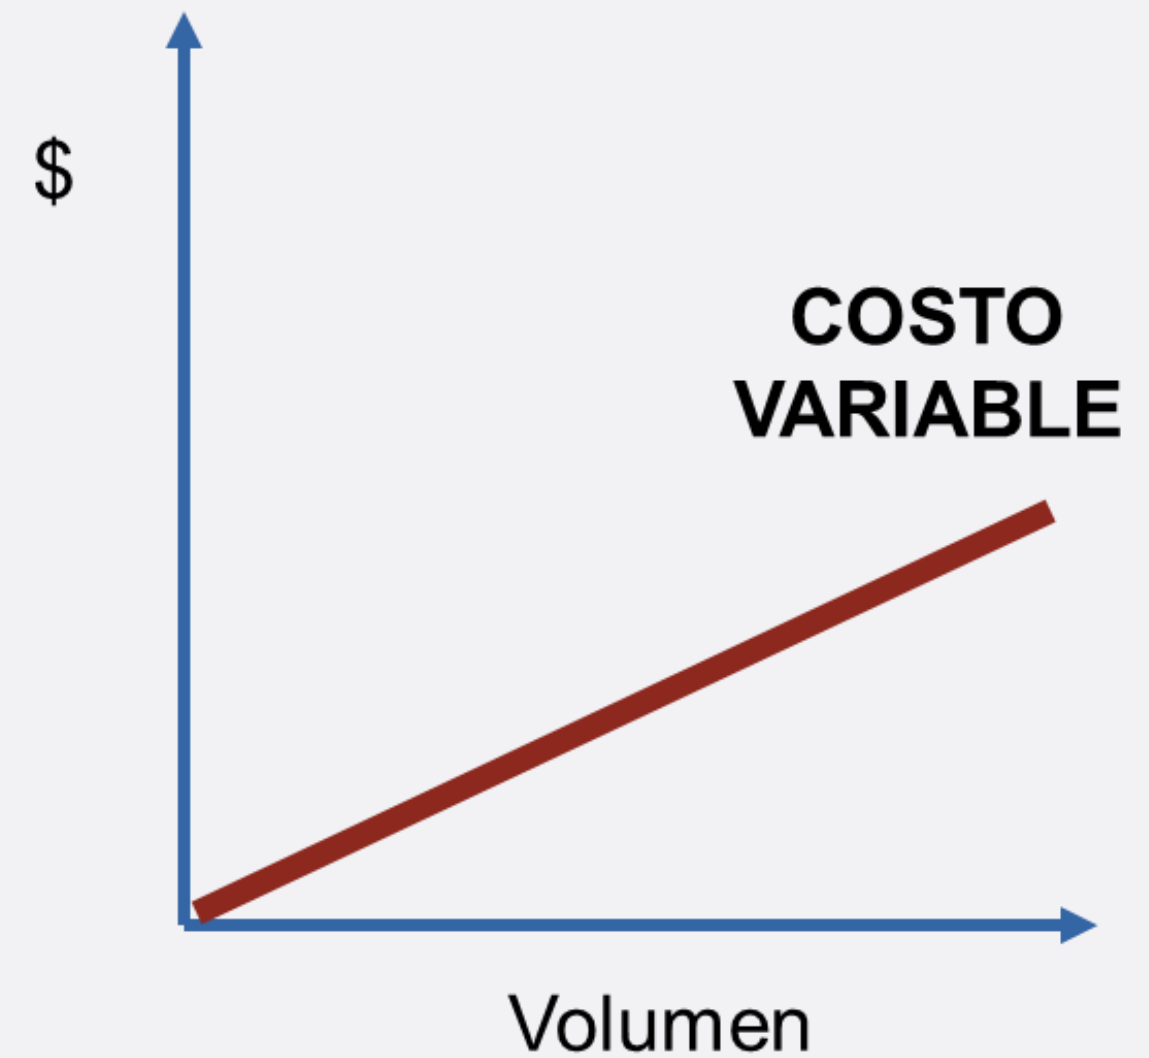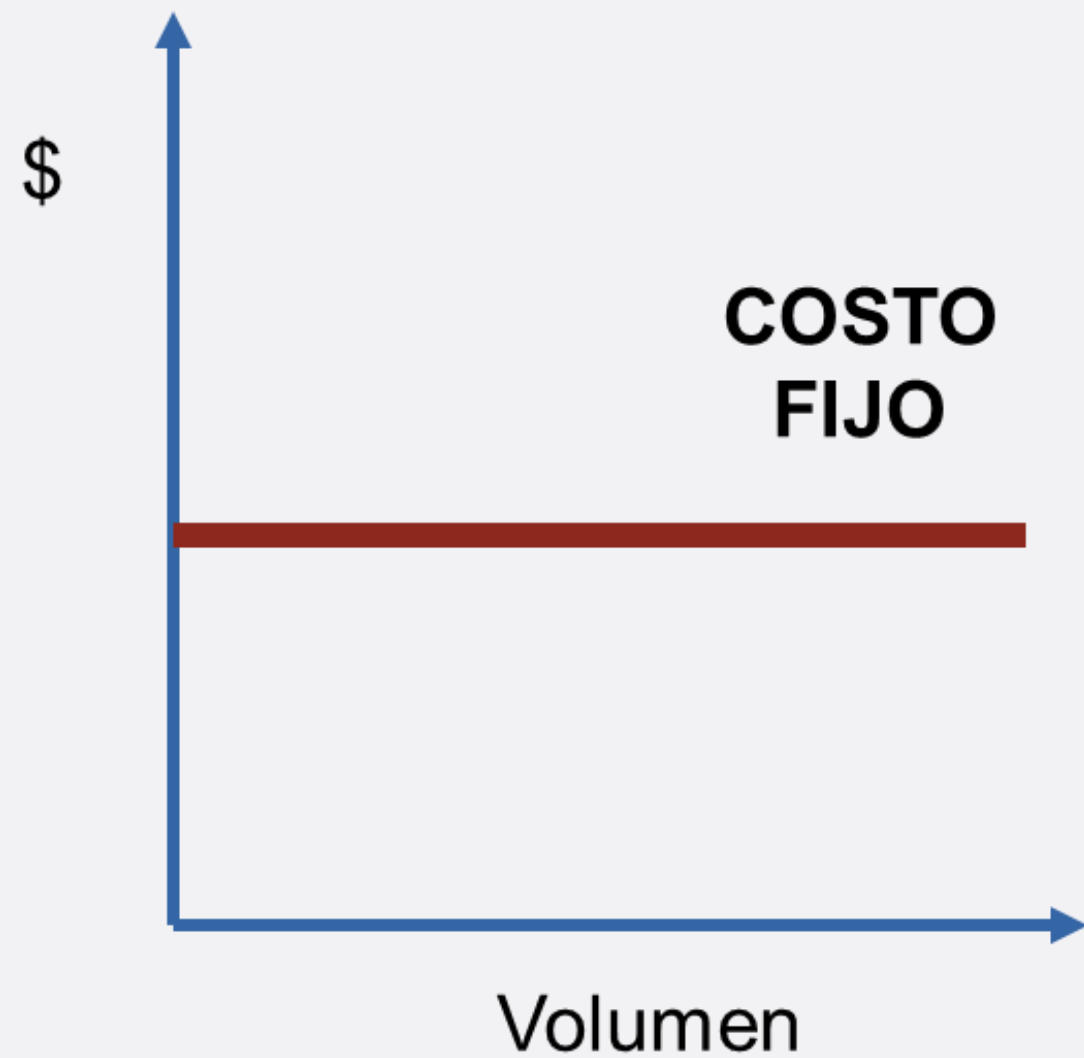

Gráficos de elaboración propia

Tipos de costos. Directos vs. indirectos

Costos directos

Son los que se identifican plenamente con una actividad, departamento o producto. En este concepto, se cuenta el sueldo correspondiente a la secretaria del director de ventas, que es un costo directo para el departamento de ventas; la materia prima es un costo directo para el producto, etcétera.

Costo indirecto

Es el que no se puede identificar con una actividad determinada. Por ejemplo, la depreciación de la maquinaria o el sueldo del director de producción, respecto al producto.

Comportamiento general, no áreas blancas y negras.

Tipos de costos. De capital vs. operacionales

Costos de capital


Corresponden al dinero que destina la compañía para adquirir activos que agregan valor a la empresa. Por lo tanto, se puede entender que los gastos de capital son inversiones. Este tipo de gastos, conocidos también como CAPEX (siglas en inglés, *CAPital EXpenditures*), tienen como objetivo incrementar la productividad de la empresa, ya sea a través de la adquisición de activos que supongan la ampliación de la planta productiva o activos para remplazar o mejorar los existentes. Ejemplo: compra de alguna máquina, equipo para realizar los trabajos.

Costos operativos

Son los desembolsos que realiza la empresa para el desarrollo diario de sus actividades. Estos gastos no suelen estar involucrados directamente con el proceso de producción. Los gastos operacionales se separan en: gastos de administración, gastos financieros, gastos de representación y gastos generales. Dentro de ellos, se encuentran los sueldos y salarios, viajes.

Reservas:

son provisiones en el proyecto para mitigar riesgos de costo o cronograma. Se incluyen para reducir el impacto en objetivos perdidos y/o desviados.

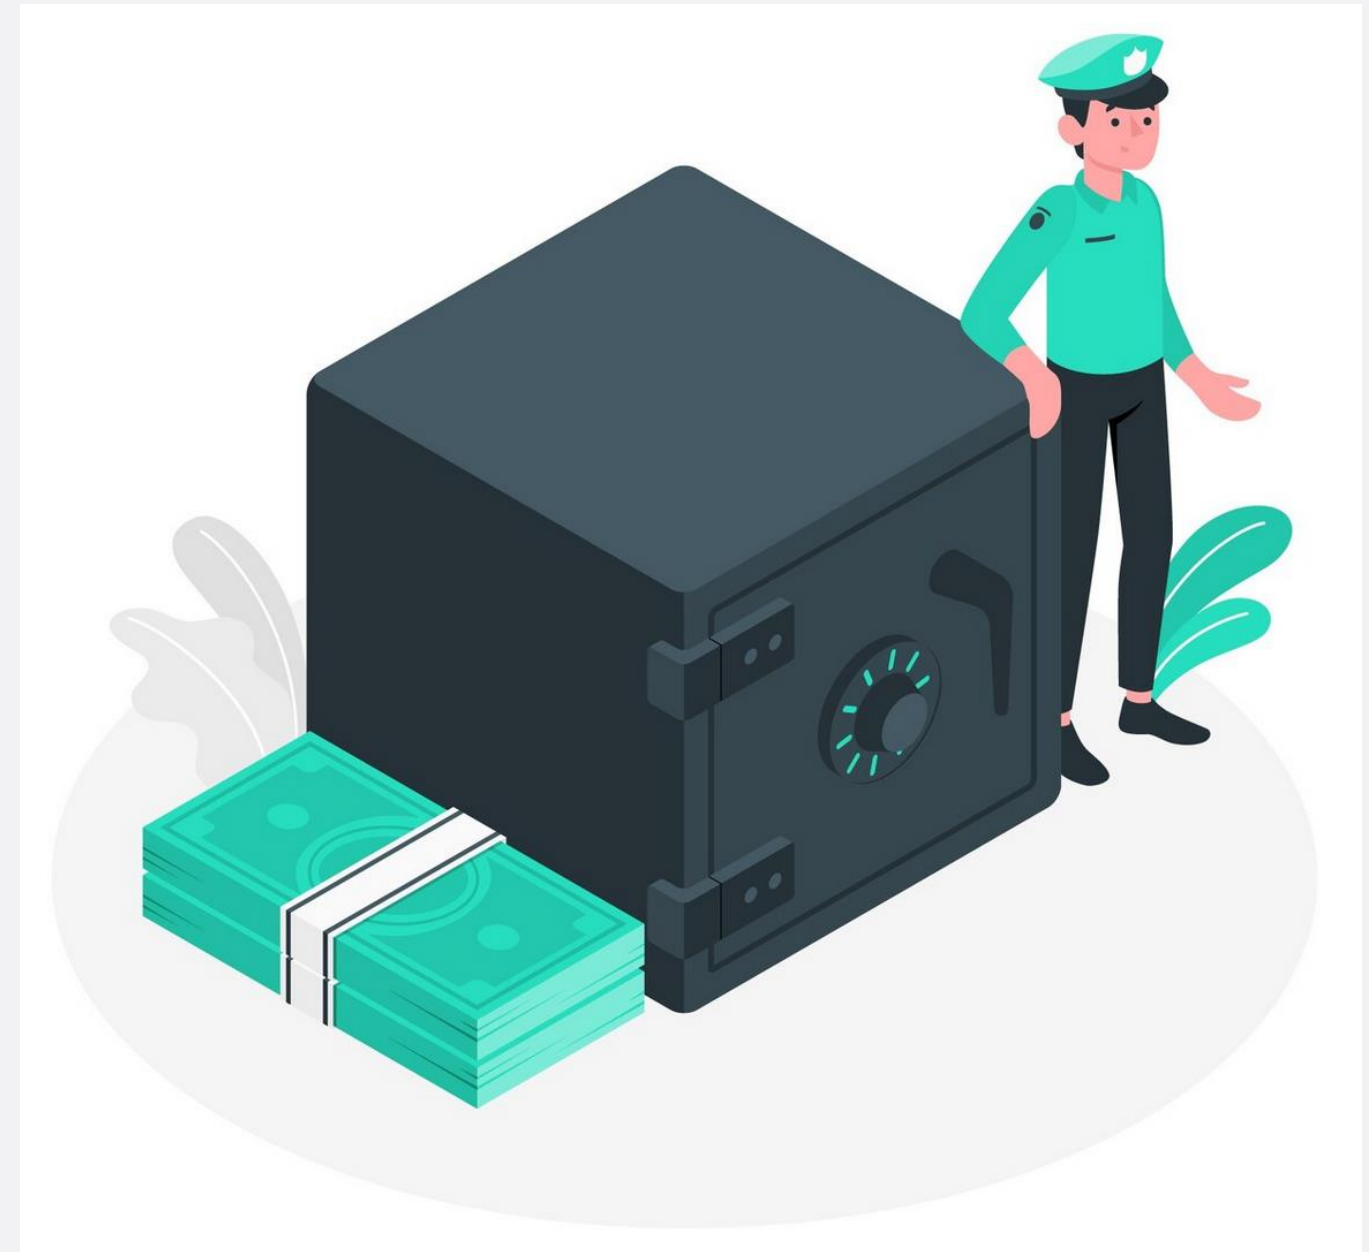

Tipos de reservas

Reserva para contingencias


Dinero asignado a la línea de costos para riesgos, conocidos para usar ante situaciones planeadas solo en parte.

(Ejemplos: reprocesos, Mal tiempo, ausentismo). Están incluidas en la línea base de costo.


Reserva de gestión

Cantidad separada, planeada para trabajo imprevisto, que está dentro del alcance del proyecto. No se incluyen en la línea base de costos.


Estimar los costos
es el proceso de desarrollar
una aproximación del costo
de los recursos necesarios
para completar el trabajo del
proyecto.

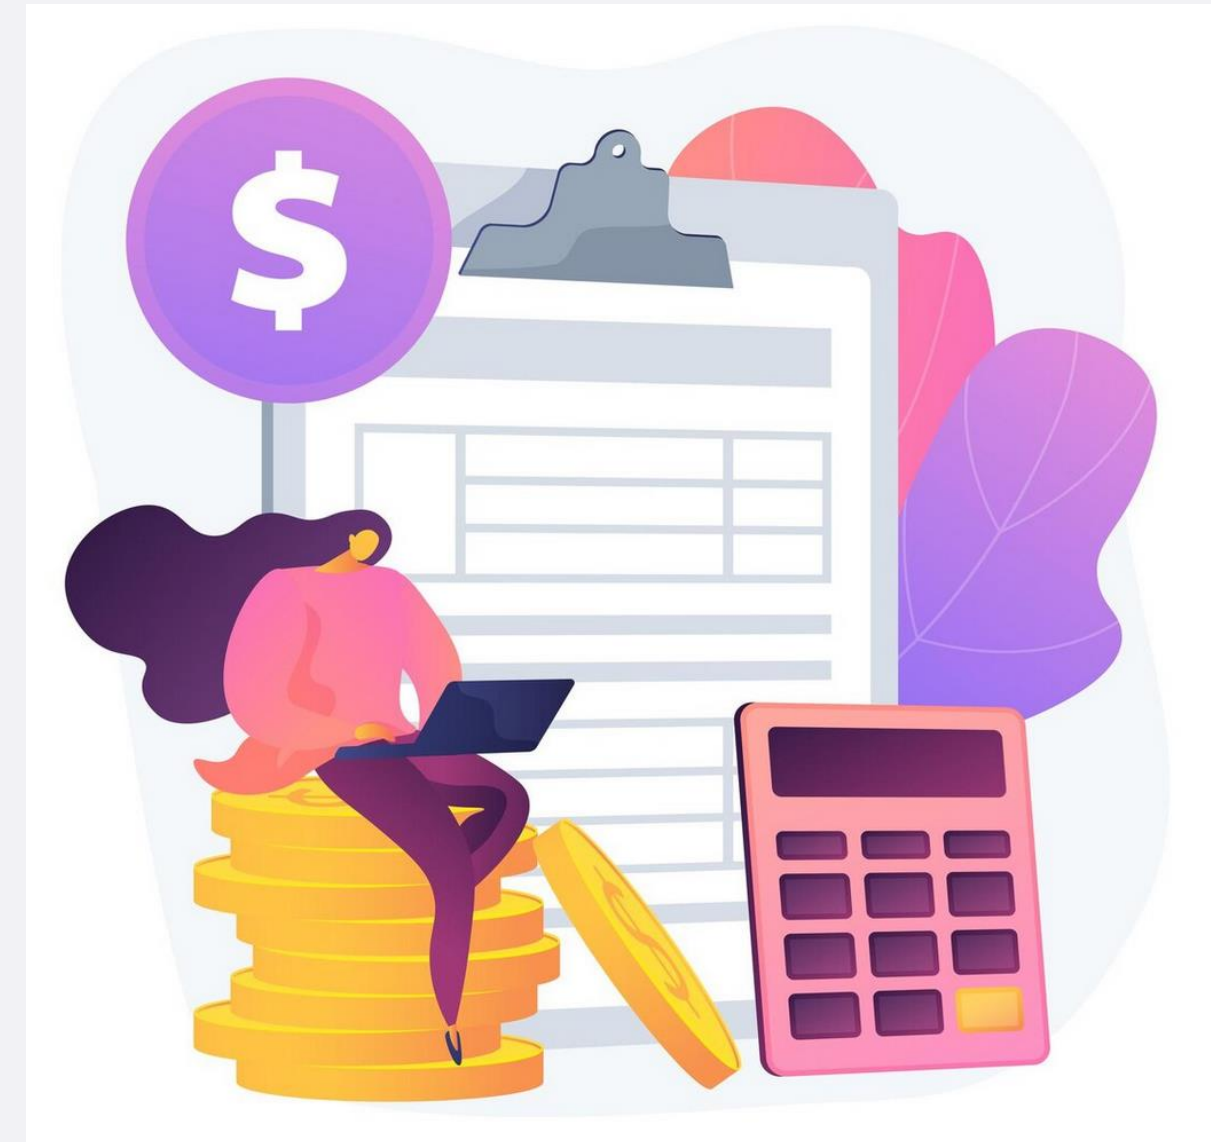

Determinar el presupuesto
es el proceso que consiste
en sumar los costos
estimados de las actividades
individuales o paquetes de
trabajo para establecer una
línea base de costos
autorizada.

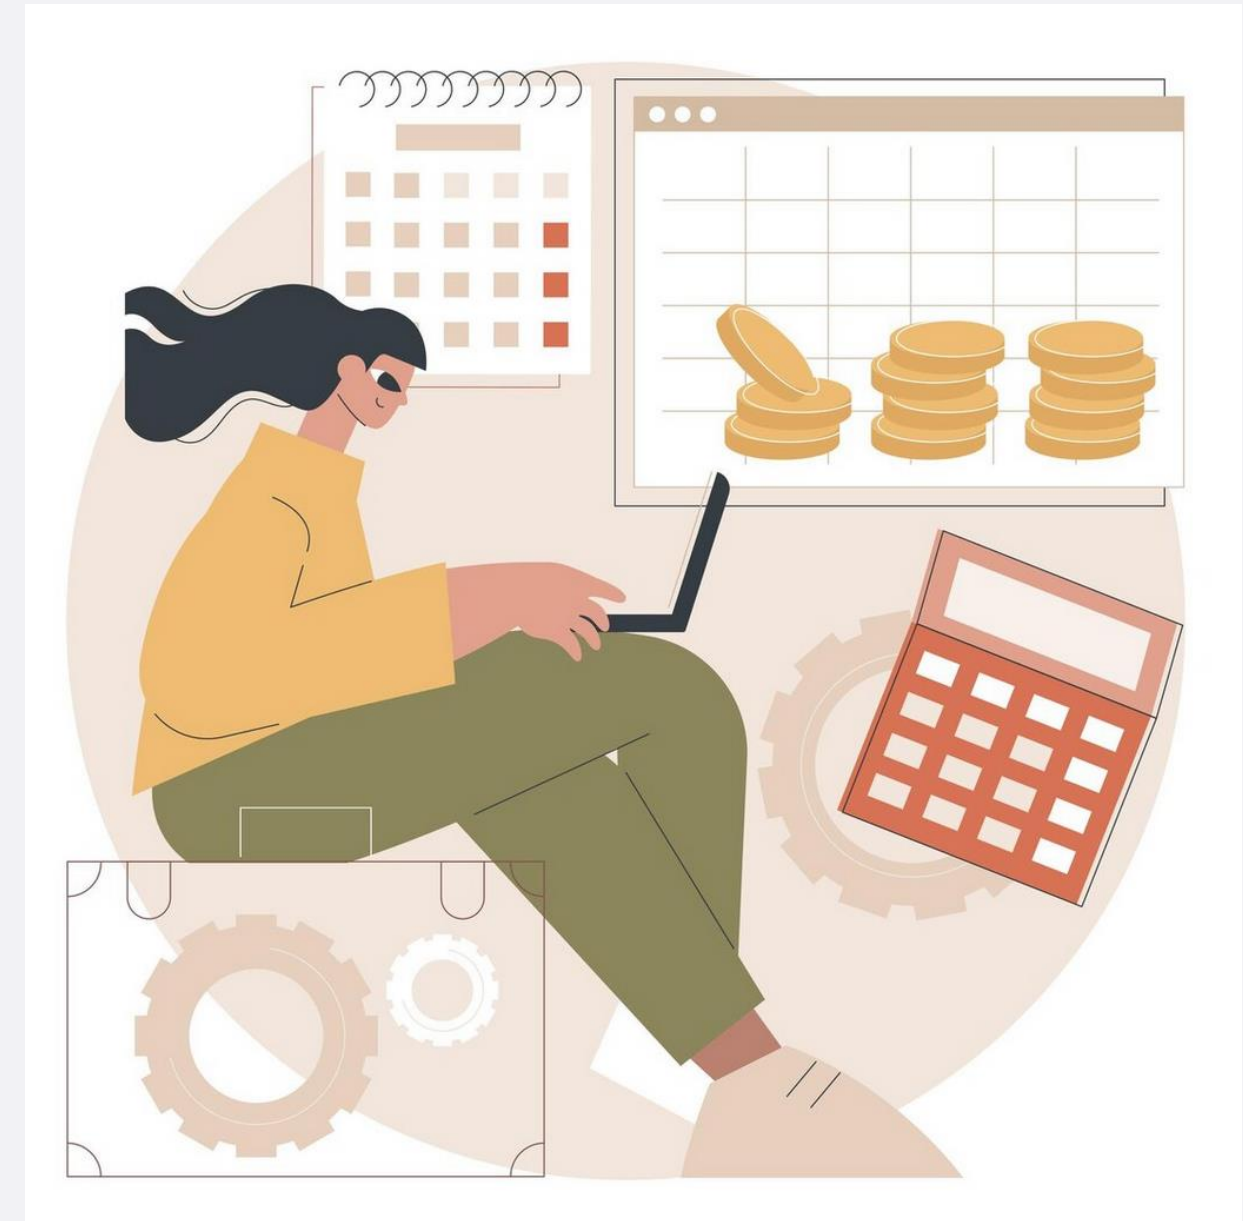

Determinar el presupuesto

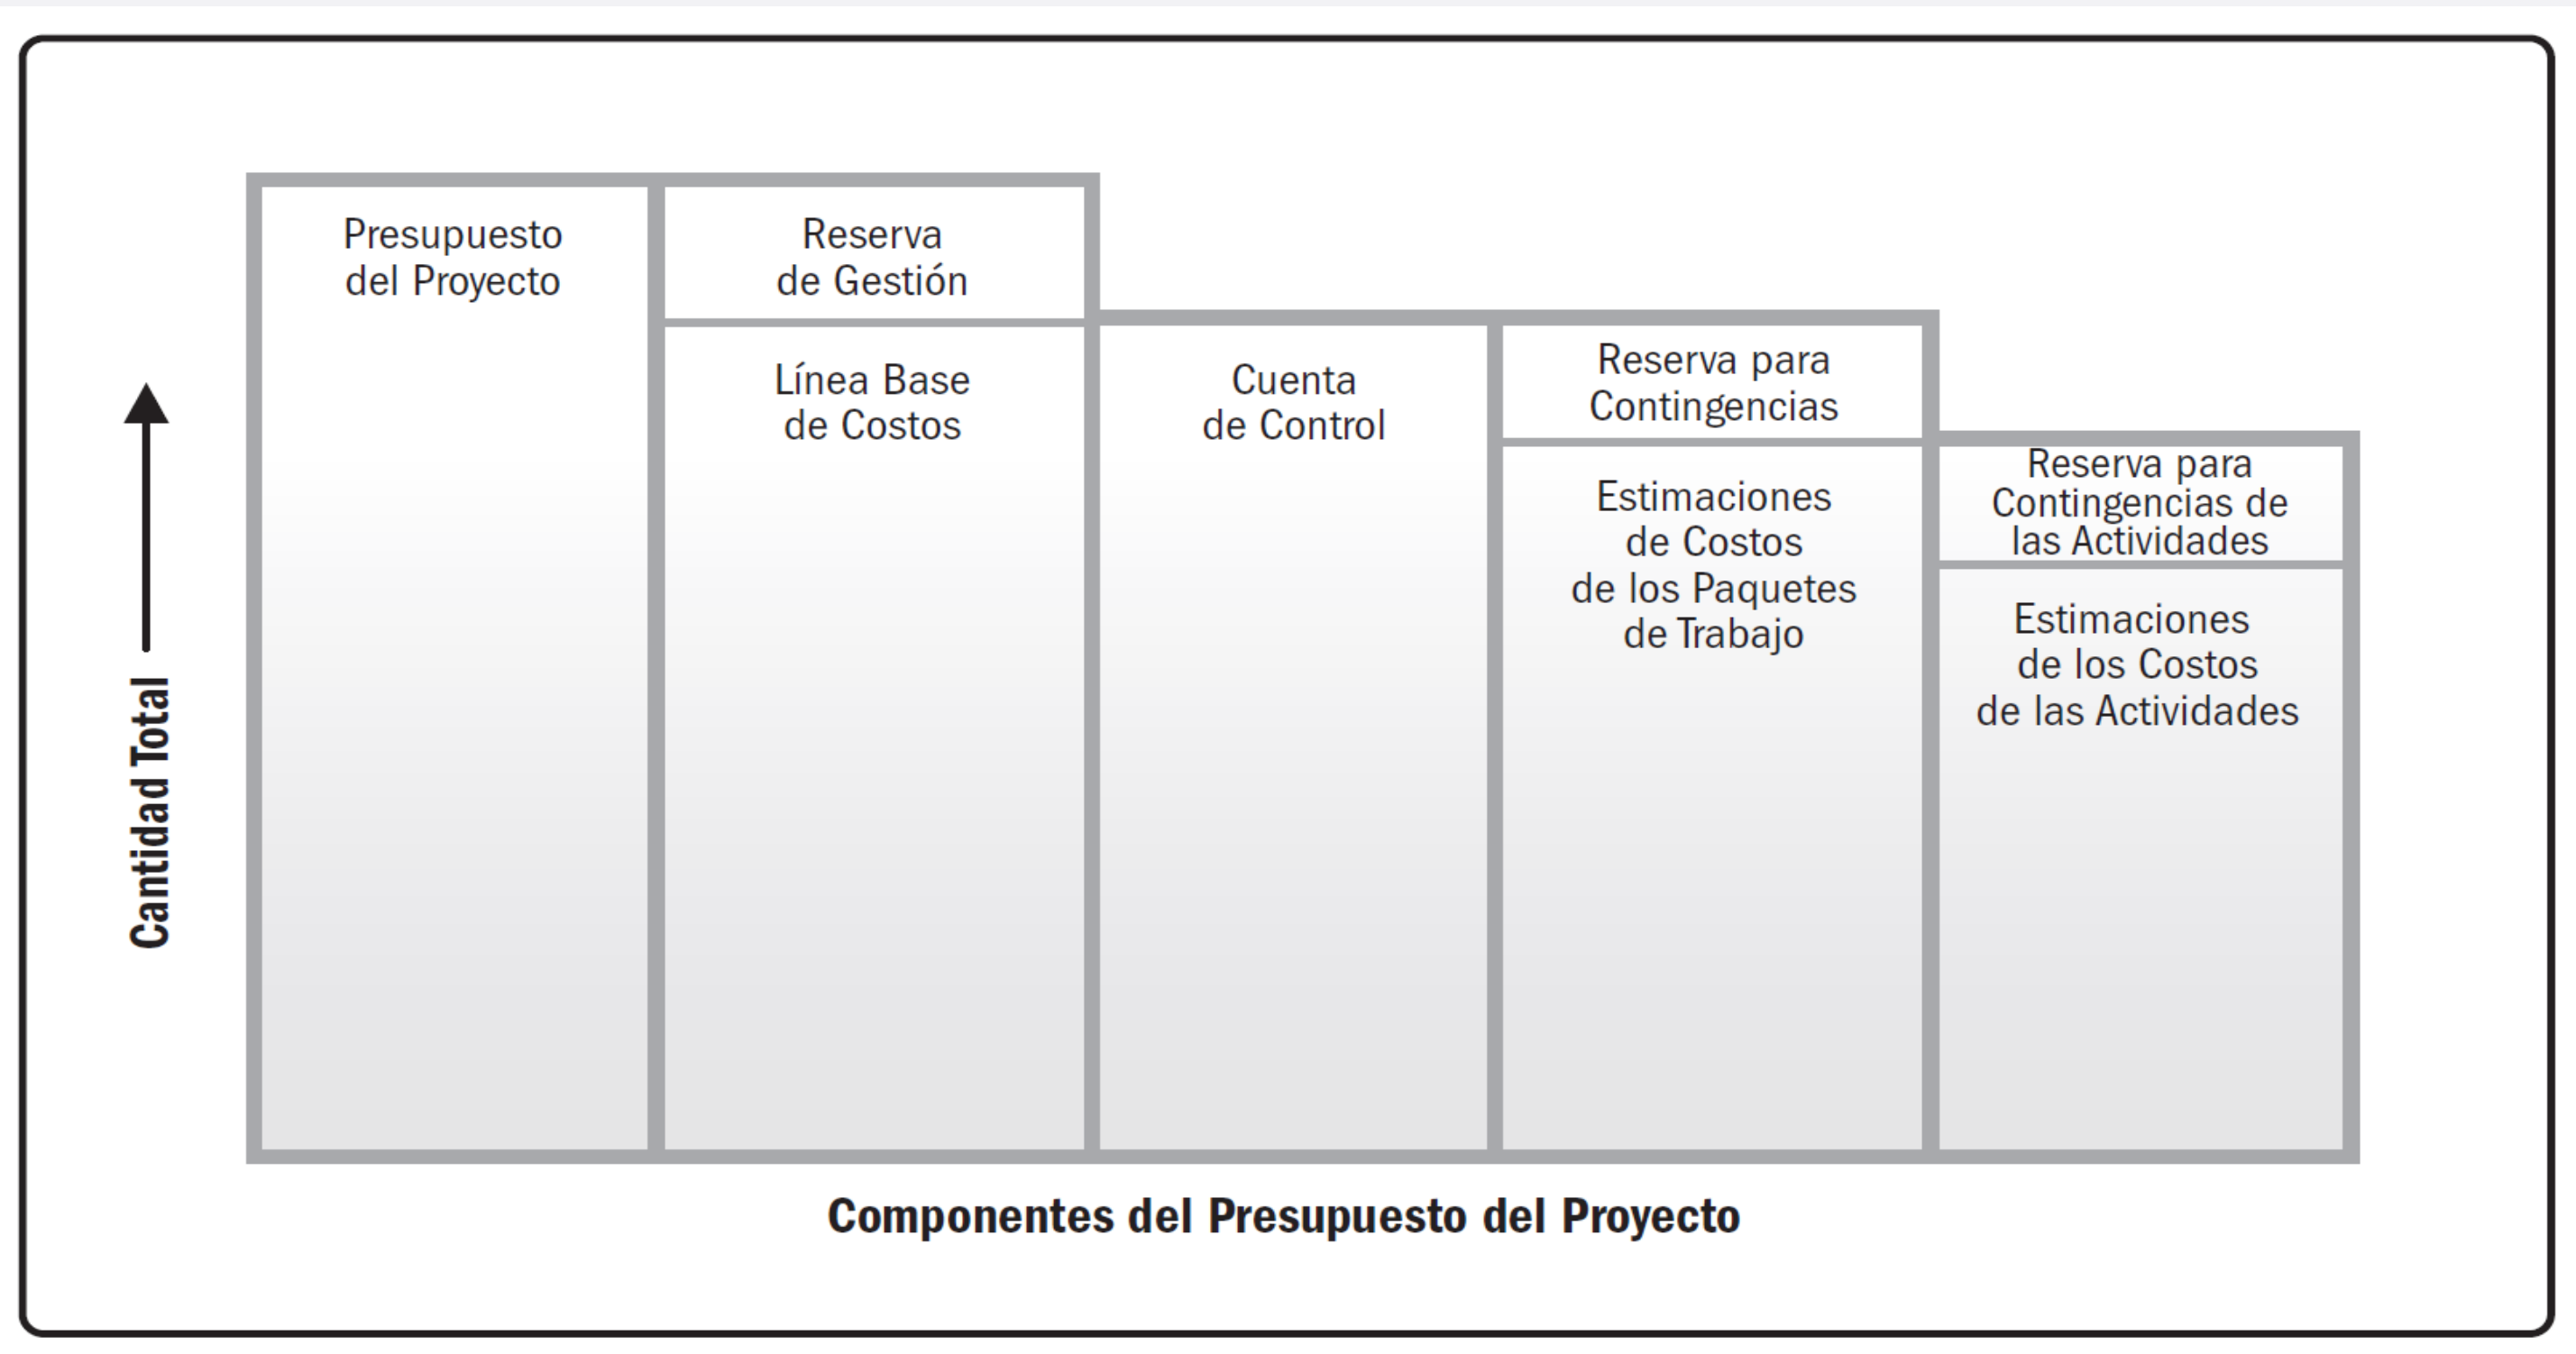

Project Management Institute (2017). Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (PMBOK® Guide) (6^{ta} ed.). Newton Square, Pennsylvania: PA: Author Gráfico 7,8, p. 291

Determinar el presupuesto (I)

Entre las técnicas de análisis de datos que pueden utilizarse en el proceso de determinar el presupuesto, se incluye, entre otras, el análisis de reserva, el cual puede establecer las reservas de gestión para el proyecto. Las reservas de gestión son cantidades específicas del presupuesto del proyecto que se retienen por razones de control de gestión y que se reservan para cubrir trabajo no previsto dentro del alcance del proyecto.

Requerimientos de fondo: los fondos totales requeridos son los incluidos en la línea de base, más el monto de reservas para contingencia de gestión. En general, los requerimientos de fondos se dan en medidas incrementales que no son continuas.

El costo acumulado del proyecto, normalmente, toma la forma de una “curva S”.

Línea base de costos es la versión aprobada del presupuesto, excluida cualquier reserva de gestión. Solo puede cambiarse a través de procedimientos formales de control de cambios y se utiliza como base de comparación.





© **Universidad de Palermo**

Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.
