

Planificación de los recursos

La gestión de los recursos del proyecto incluye los procesos para identificar, adquirir y gestionar los recursos necesarios para la conclusión exitosa del proyecto.



Tipos de recursos. Recursos físicos

Los recursos físicos incluyen el equipamiento, los materiales, las instalaciones y la infraestructura.

La gestión de los recursos físicos se concentra en la asignación y utilización de los recursos físicos (por ejemplo: materiales, equipos y suministros), necesarios para la exitosa finalización del proyecto de una manera eficiente y eficaz.

Con este fin, las organizaciones deberían disponer de datos sobre la demanda de recursos (ahora y en el futuro razonable), sobre las configuraciones de recursos que serán necesarios para satisfacer esas demandas y sobre el suministro de recursos. No poder gestionar y controlar los recursos de manera eficiente es una fuente de riesgo para la exitosa finalización del proyecto.

Tipos de recursos. Recursos humanos


Los recursos del equipo o de personal se refieren a los recursos humanos.

El personal puede tener diferentes conjuntos de habilidades, pueden estar asignados a tiempo completo o a tiempo parcial, y se pueden incorporar o retirar del equipo del proyecto conforme avanza este.

Existe una cierta superposición entre la gestión de los recursos del proyecto y la gestión de los interesados del proyecto. Esta área de conocimiento en cuanto a los recursos humanos se centra en el subconjunto de los interesados que forman el equipo del proyecto. El equipo del proyecto consiste en individuos que tienen asignados roles y responsabilidades, quienes trabajan en conjunto para lograr un objetivo común del proyecto.

El director del proyecto debería invertir esfuerzos adecuados en la adquisición, gestión, motivación y empoderamiento del equipo del proyecto.

Estimar los recursos de las actividades es el proceso de estimar los recursos del equipo y el tipo y las cantidades de materiales, equipamiento y suministros necesarios para ejecutar el trabajo del proyecto.

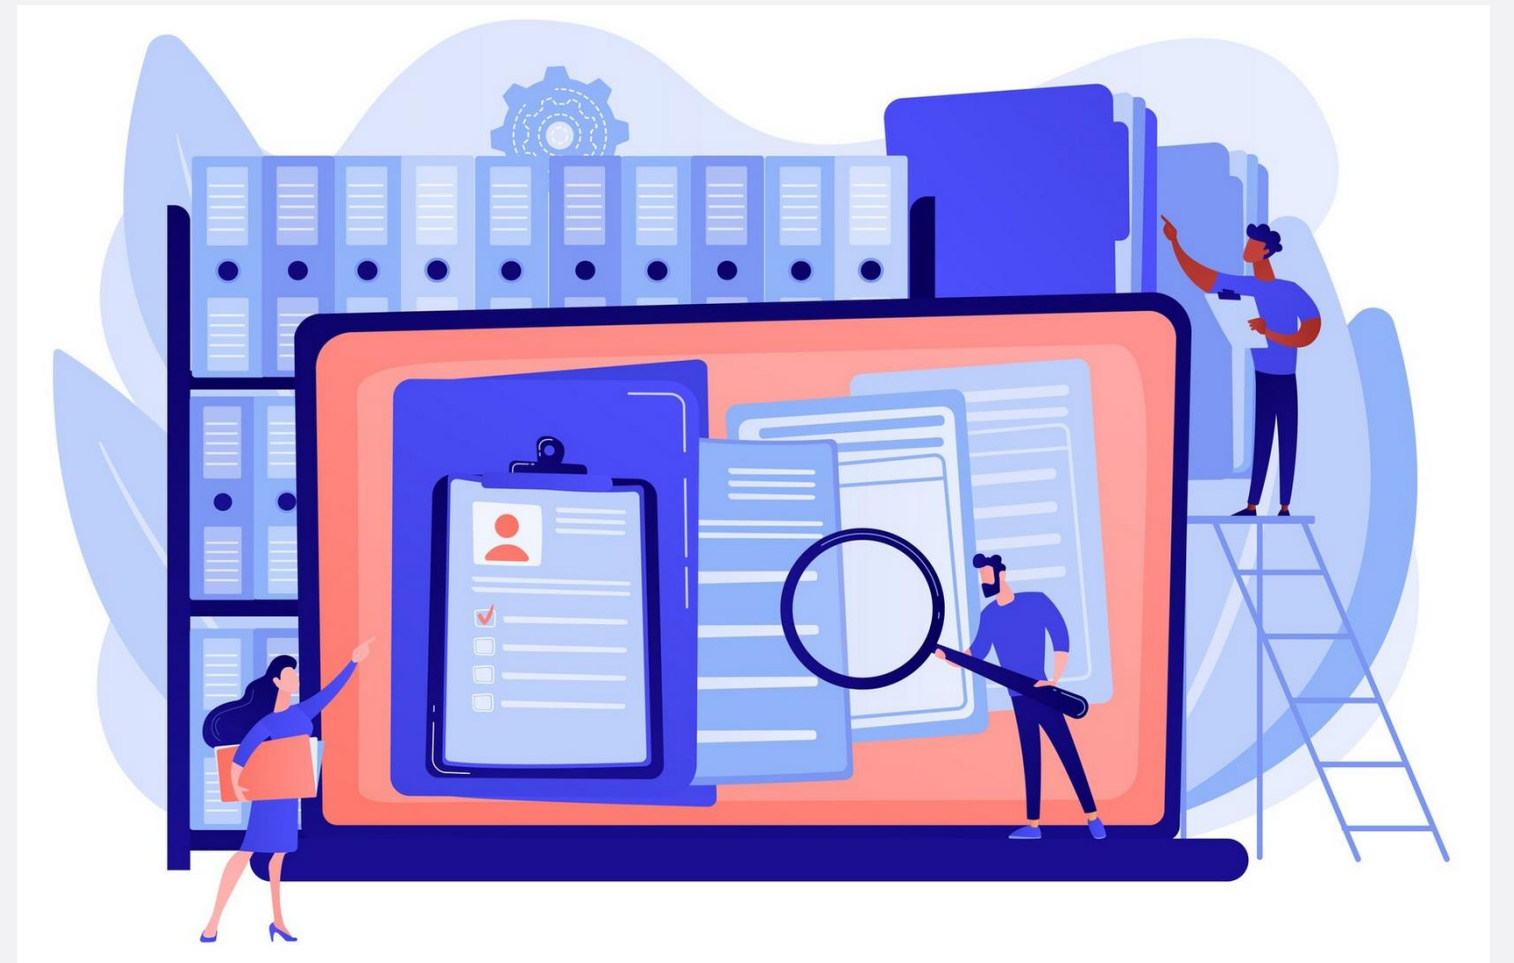

Requisitos de recursos

Los requisitos de recursos identifican los tipos y cantidades de recursos necesarios para cada paquete de trabajo o actividad dentro de un paquete de trabajo.

Se pueden agregar para determinar los recursos estimados para cada ramificación de la EDT/WBS, y el proyecto en su totalidad.


La cantidad de detalle y el nivel de especificidad de las descripciones de los requisitos de recursos pueden variar, en función del área de aplicación. La documentación de los requisitos de recursos puede incluir suposiciones que se hicieron al determinar los tipos de recursos aplicados, su disponibilidad, y las cantidades necesarias.

Estructura de desglose de recursos. RBS

La estructura de desglose de recursos (RBS) es una representación jerárquica de los recursos por categoría y tipo.

Los ejemplos de categorías de recursos incluyen, entre otros, la mano de obra, los materiales, los equipos y los suministros. Los tipos de recursos pueden incluir el nivel de habilidad, el nivel de formación, las certificaciones requeridas u otra información relevante para el proyecto.

Estructura de desglose de recursos. RBS (I)

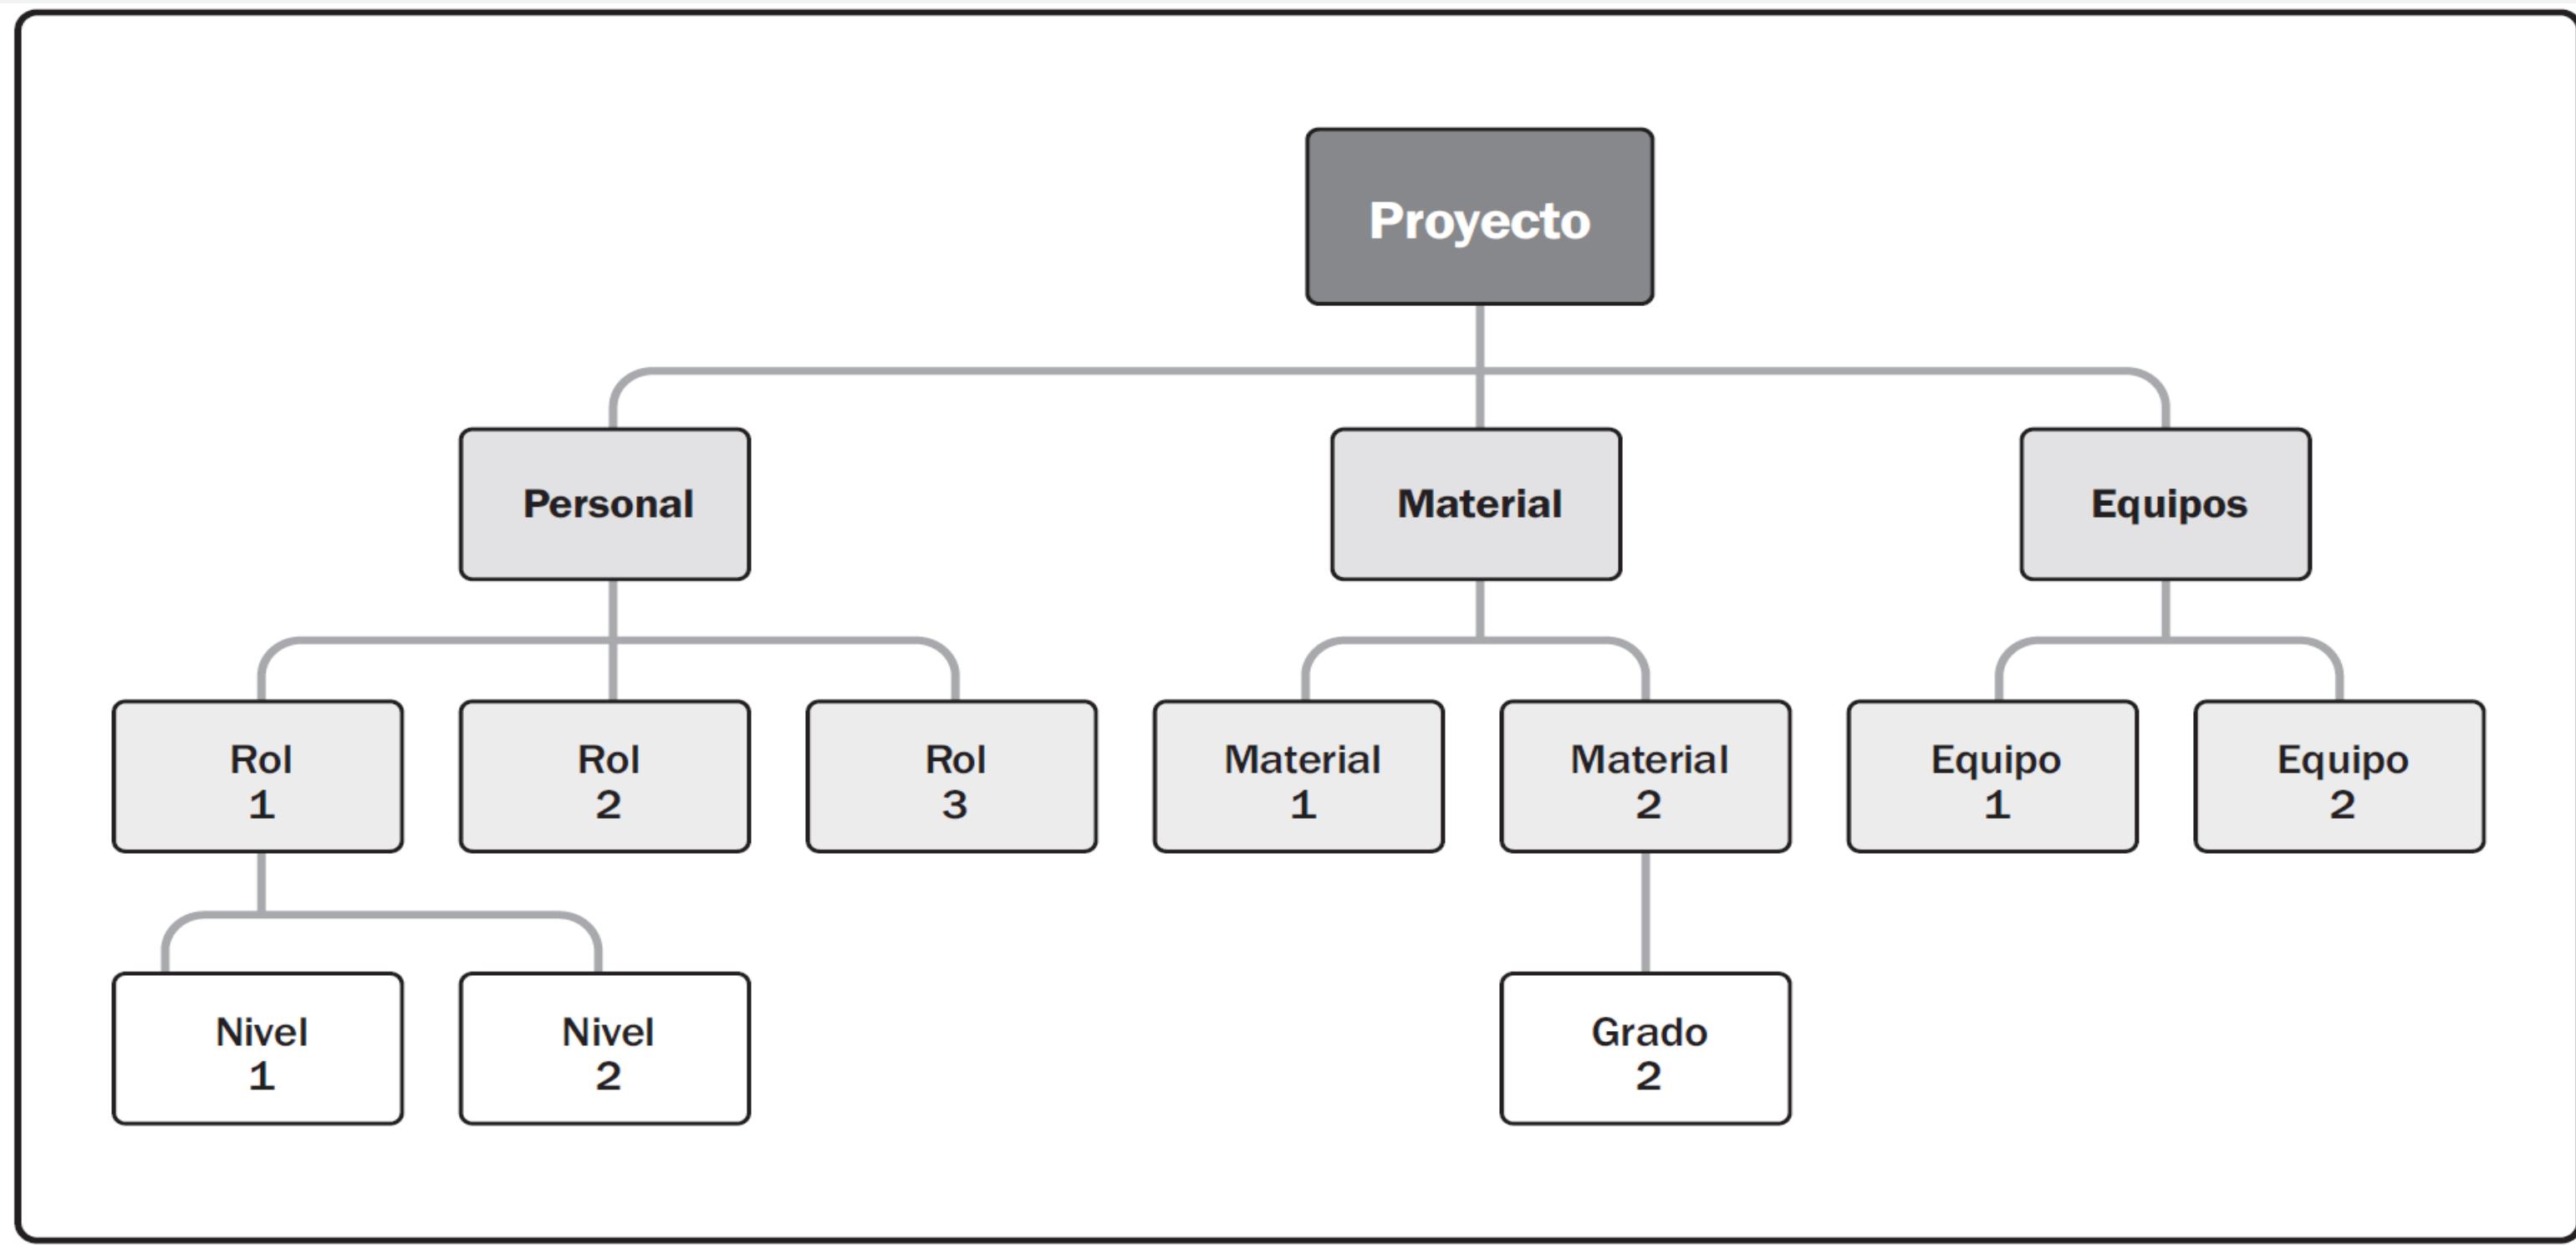

Project Management Institute (2017). Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (PMBOK® Guide) (6^{ta} ed.). Newton Square, Pennsylvania: PA: Author Gráfico 9.7, p. 363

Matriz de asignación de responsabilidades (RAM)

La matriz de asignación de responsabilidades (RAM) muestra los recursos del proyecto asignados a cada paquete de trabajo.

Un ejemplo de RAM es un **diagrama/matriz RACI**. Se utiliza para ilustrar las relaciones entre los paquetes de trabajo o las actividades y los miembros del equipo del proyecto. RACI, en inglés, significa *Responsible (R)*, *Accountable (A)*, *Consulted (C)*, *Informed (I)* (persona responsable de ejecutar la tarea, persona con responsabilidad última sobre la tarea, persona a la que se consulta sobre la tarea, persona a la que se debe informar sobre la tarea).

Otro ejemplo de RAM sería una matriz completa que cruza los paquetes de trabajo de la EDT/WBS y todos los recursos de la RBS.

Diagrama RACI

Diagrama RACI	Persona				
Actividad	Ann	Ben	Carlos	Dina	Ed
Crear acta de constitución	A	R	I	I	I
Recopilar requisitos	I	A	R	C	C
Presentar solicitud de cambio	I	A	R	R	C
Desarrollar plan de pruebas	A	C	I	I	R
	R = Responsible (persona responsable de ejecutar la tarea) A = Accountable (persona con responsabilidad última sobre la tarea) C = Consult (persona a la que se consulta sobre la tarea) I = Inform (persona a la que se debe informar sobre la tarea)				

Project Management Institute (2017). *Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (PMBOK® Guide) (6^{ta} ed.)*. Newton Square, Pennsylvania: PA: Author Gráfico 9.4, p. 353

Típica estructura organizativa de un proyecto

Niveles de gestión dentro de la estructura de un proyecto.

- Comité directivo del proyecto.
- Director de proyecto. Equipo de dirección de proyecto.
- Equipo de proyecto.



© **Universidad de Palermo**

Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.
