

Proceso de adaptación

La adaptación
consiste en la adecuación
deliberada del enfoque, la
gobernanza y los procesos
de la dirección de proyectos,
para que resulten más
adecuados para el entorno y
el trabajo en cuestión.



¿Por qué adaptar?

El PMI en las diversas versiones del PMBoK resalta que este incluye fundamentos y buenas prácticas aplicables al mayor número de los proyectos, la mayoría de las veces, pero que la dirección y el equipo de dirección de proyecto son los responsables de establecer lo que es apropiado para cada proyecto específico.

Cada proyecto es único.

La adaptación es ajustar lo que mejor se adecúa a la organización, el ambiente y el proyecto en particular para ser eficientes y sacar el mayor provecho posible, sin procesos o trabajos de menos ni de más con respecto a los necesarios.

¿Qué adaptar?

En un proyecto, se pueden adaptar los siguientes aspectos:

- **Ciclo de vida y enfoque de desarrollo**

Decidir qué ciclo de vida y qué enfoque se ajusta mejor al proyecto en particular. Entre predictivo, ágil o híbrido, dependiendo de la naturaleza del proyecto y su entorno.

- **Procesos**

La adaptación de los procesos al ciclo de vida y al enfoque seleccionados incluye determinar qué partes o elementos hay que agregar, modificar, eliminar, unificar o alinear.

¿Qué adaptar? (I)

- **Involucramientos.**


Evaluar las competencias de las personas necesarias para el proyecto y seleccionar quiénes y con qué roles tienen que participar en el proyecto. Elegir las responsabilidades y la toma de decisiones que se transfieren al equipo de proyecto. Adaptar la integración de los interesados en el equipo de proyecto.

- **Herramientas, métodos y artefactos**

Seleccionar las herramientas y métodos que mejor se adecuen al ambiente y la cultura donde el proyecto se desenvuelve. Adaptar los documentos, plantillas y otros artefactos.

Antes de adaptar, hay que analizar y entender el entorno del proyecto.

El proceso de adaptación normalmente empieza seleccionando el enfoque de desarrollo, para después para adaptarlo a la organización y al proyecto. Por último, implementar la mejora continua.

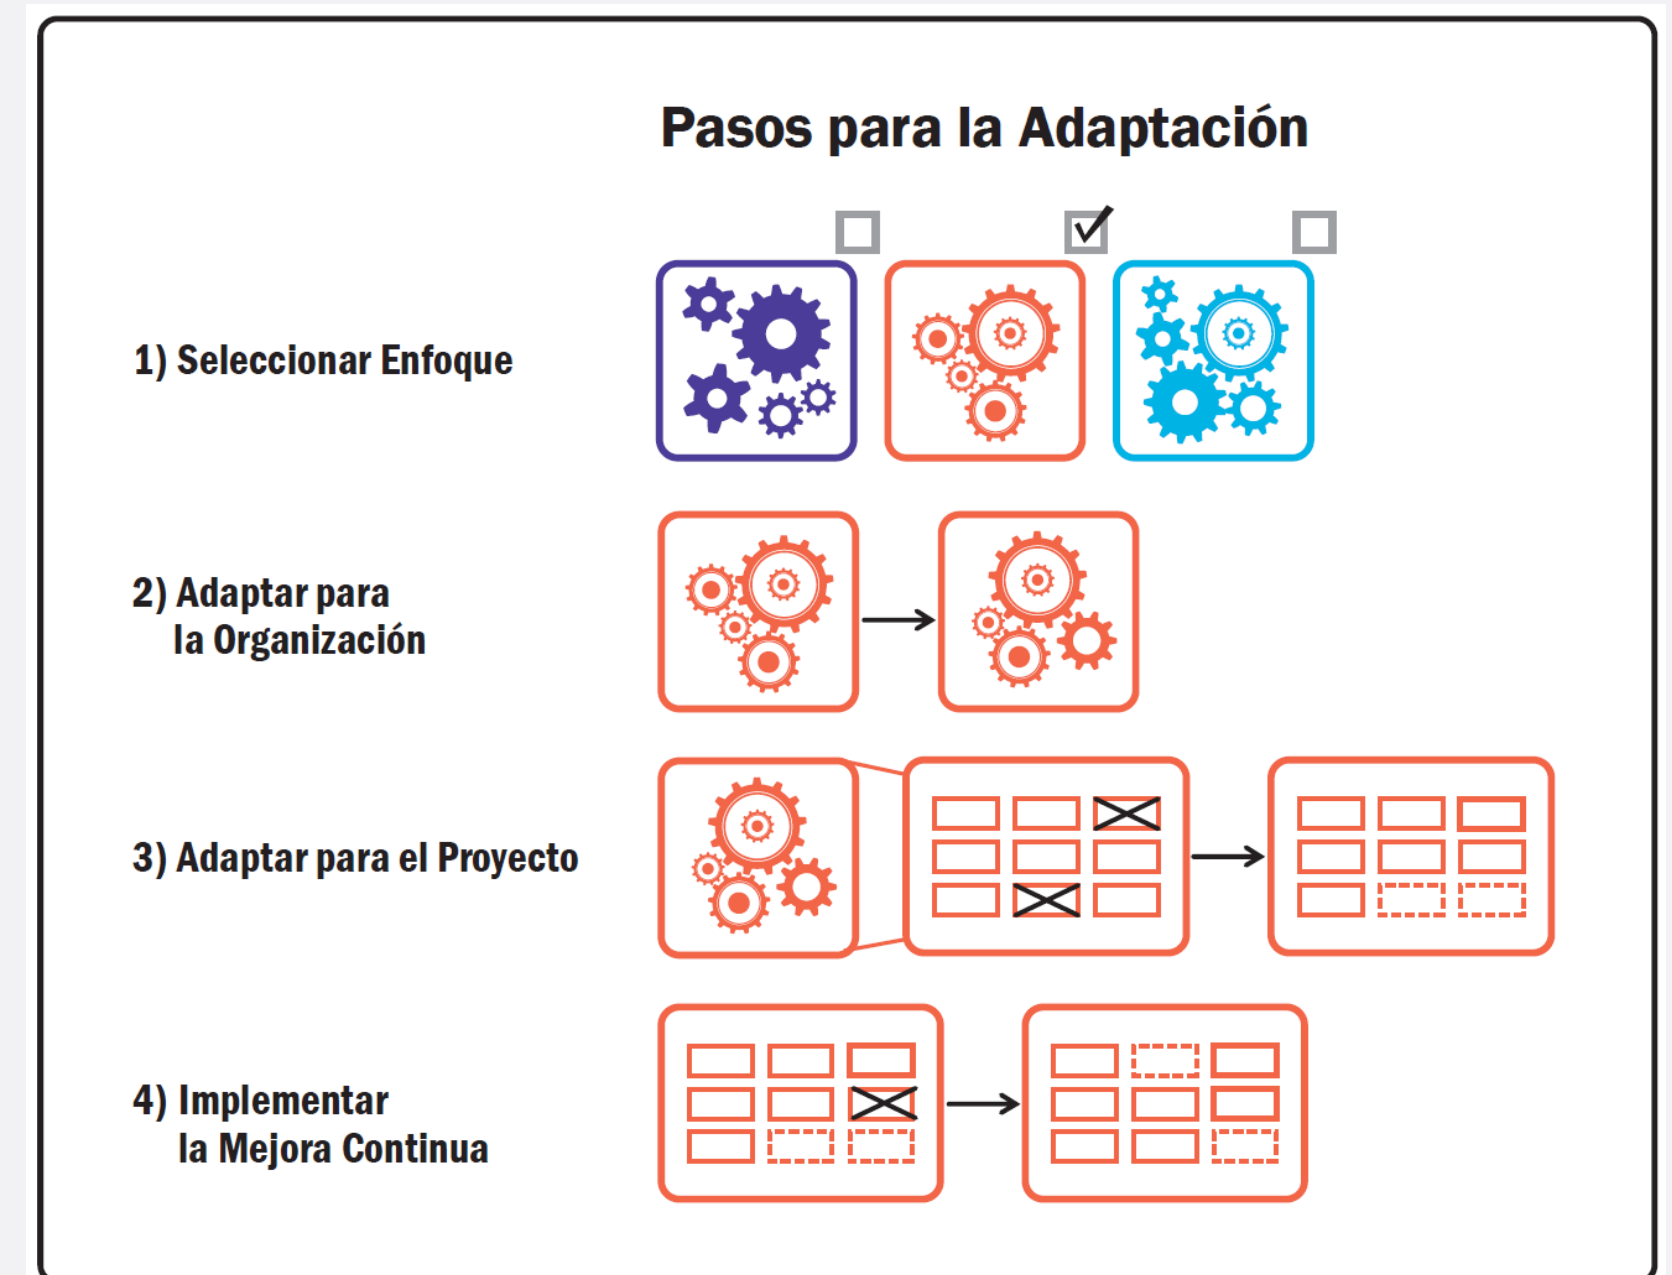

Project Management Institute (2021). Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (PMBOK® Guide) (7^{ma} Ed.). Newton Square, Pennsylvania: PA: Author Gráfico 3.7, p. 240

1. Seleccionar el enfoque de desarrollo inicial

El primer paso es seleccionar el enfoque de desarrollo general adecuado. El equipo de proyecto aplica su conocimiento del producto, la cadencia de las entregas y de las opciones posibles para seleccionar el enfoque de desarrollo más adecuado para el proyecto específico.

Un filtro importante a tener en cuenta es si el proyecto tiene características que lo acercan más hacia un enfoque predictivo, adaptativo o híbrido.

2. Adaptar para la organización

Las organizaciones tienen niveles específicos de aprobación y supervisión.

Muchas organizaciones tienen una metodología general de proyectos, un enfoque general hacia la gestión o un enfoque general de desarrollo que se usa como punto de partida para sus proyectos. Estas guías están para soportar procesos repetitivos, mediciones consistentes entre proyectos.

Otras limitaciones para la adaptación de la organización son proyectos críticos para la seguridad y los proyectos realizados bajo contrato.

3. Adaptar para el proyecto

Muchos factores influyen en la adaptación para el proyecto.

Producto/Entregable

Los atributos asociados incluyen:

- Cumplimiento/Criticidad.
- Tipo de producto/entregable.
- Mercado de la industria.
- Tecnología.
- Período de tiempo.
- Estabilidad de los requisitos.
- Seguridad.
- Entrega incremental.

3. Adaptar para el proyecto (I)

Equipo del proyecto

- Los atributos asociados incluyen:
- Tamaño del equipo de proyecto
- Geografía del equipo de proyecto
- Distribución organizacional
- Experiencia del equipo de proyecto
- Acceso al cliente

Cultura

- Los atributos asociados incluyen:
- Aceptación
- Confianza
- Empoderamiento
- Cultura organizacional

4. Implementar la mejora continua

El proceso de adaptación no es un ejercicio realizable una única vez. Durante la elaboración progresiva del trabajo del proyecto, la evolución del producto, los incidentes y otros aprendizajes indicarán en qué aspectos una mayor adaptación podría mejorar el proyecto.

Mantener al equipo de proyecto involucrado en la mejora de su proceso puede fomentar el sentido de pertenencia y el compromiso con los ajustes.

Adaptación de los dominios de desempeño.

Las actividades y el trabajo de cada dominio de desempeño también pueden adaptarse, en función del proyecto específico.



Adaptar al proyecto específico

Gráfico de elaboración propia



© **Universidad de Palermo**

Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.
