

Gestión de los interesados de un proyecto

El dominio de desempeño de los interesados se ocupa de las actividades y funciones asociadas con los interesados.



Los interesados (*stakeholders*)


Los interesados (*stakeholders*) son personas, grupos u organizaciones que pueden afectar o verse afectados, o percibirse a sí mismos como afectados por una decisión, actividad o resultado del proyecto.

Llevar a cabo este dominio de desempeño de forma eficiente tiene los siguientes resultados deseados:

- Una relación de trabajo productiva con los interesados a lo largo del proyecto.
- Acuerdo de los interesados con los objetivos del proyecto.
- Los interesados que son beneficiarios del proyecto brindan apoyo y están satisfechos, mientras que los interesados que pueden oponerse al proyecto o sus entregables no afectan negativamente los resultados del proyecto.

El proceso de gestión de los interesados incluye implementar estrategias y acciones para promover un involucramiento productivo de los interesados.

El involucramiento de los interesados empieza antes o cuando arranca el proyecto, y continua durante todo este.

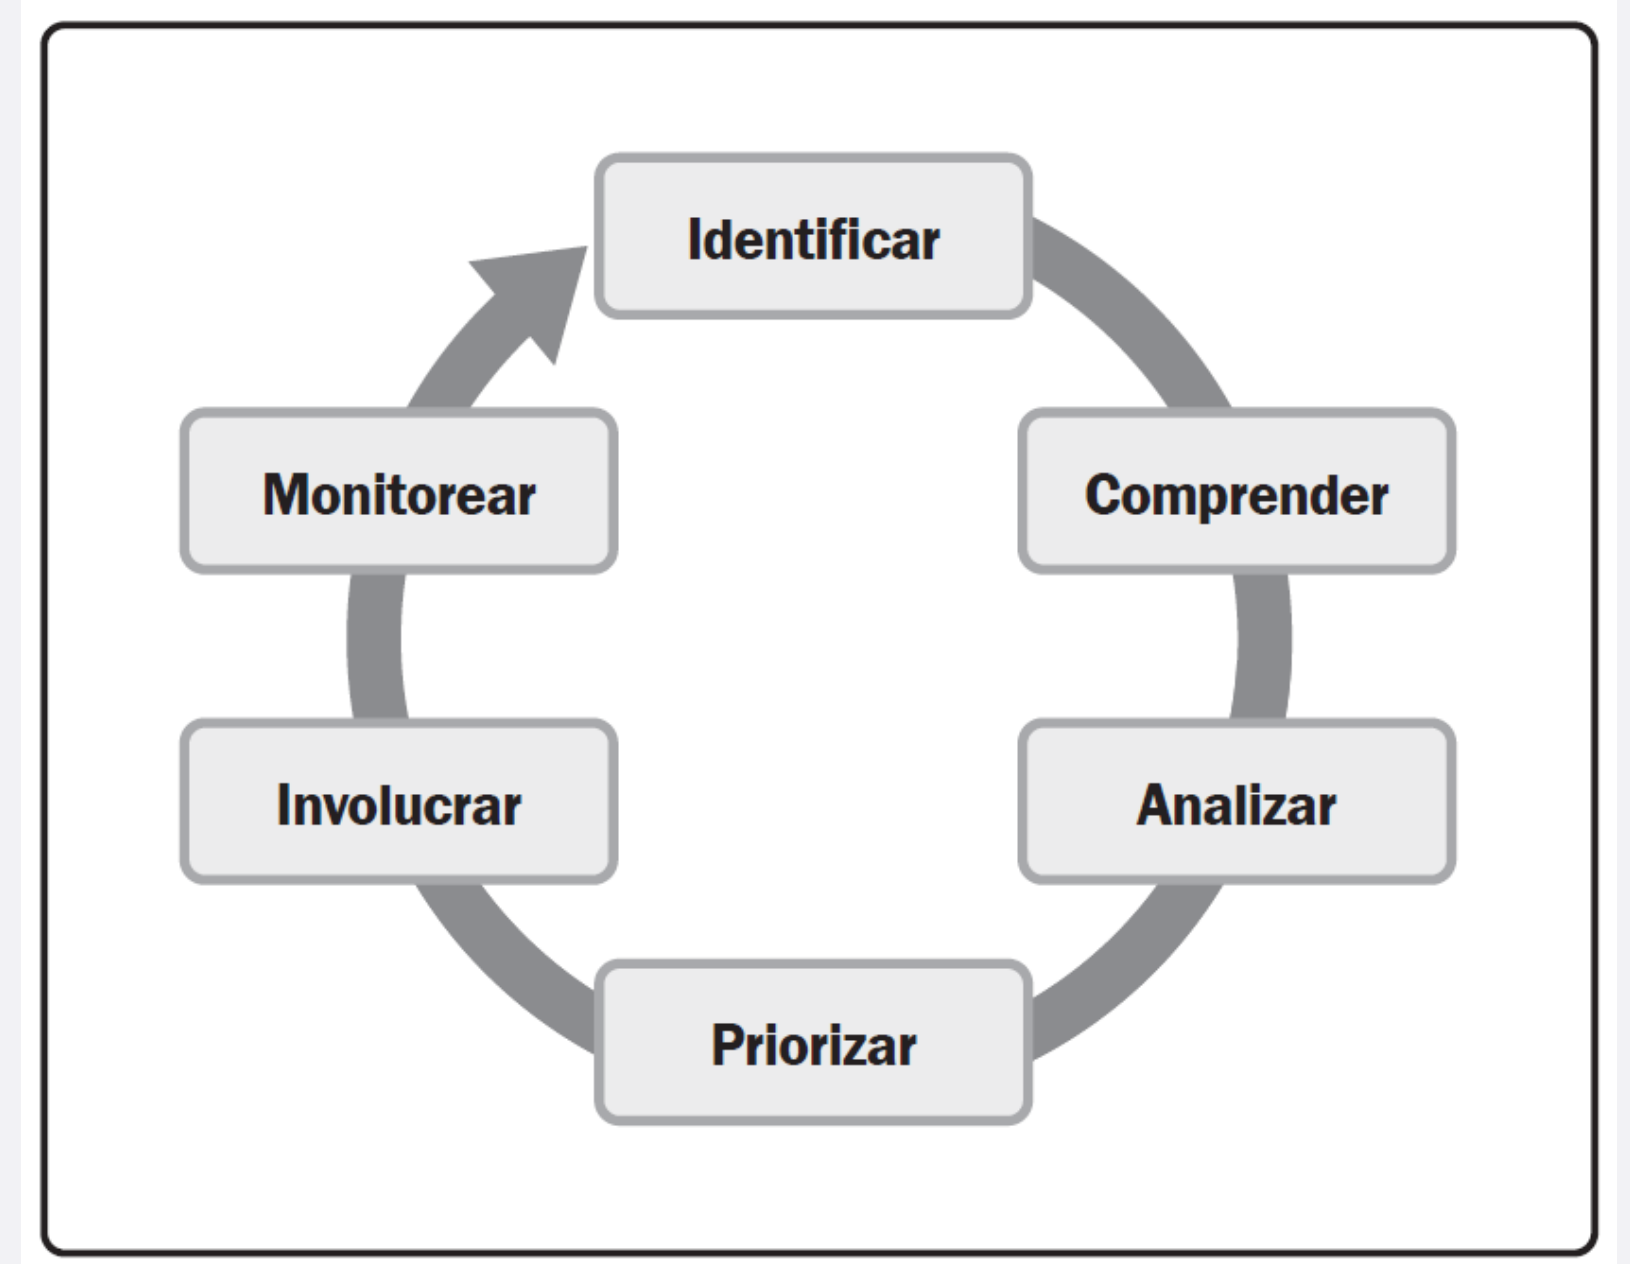

Project Management Institute (2021). Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (PMBOK® Guide) (7^{ma} Ed.). Newton Square, Pennsylvania: PA: Author. Gráfico 2.3, p. 105

Identificar los interesados del proyecto

Identificar a los interesados es el proceso de identificar periódicamente a los interesados del proyecto, así como analizar y documentar información relevante, relativa a sus intereses, participación, interdependencia, influencia y posible impacto en el éxito del proyecto.

La identificación de alto nivel de los interesados se puede hacer antes del armado del equipo de proyecto. La identificación detallada de los interesados se elabora progresivamente, al inicio y a lo largo del proyecto. Algunos interesados son fáciles de identificar, como el cliente, el patrocinador, el equipo de proyecto y los usuarios finales. Otros son más difíciles de identificar, sobre todo cuando no están directamente conectados con el proyecto.

Registro de los interesados – Ejemplo de plantilla

Buena práctica es generar un registro de interesados, un documento que contenga información de los interesados identificados, e incluye, entre otras:

- Información de identificación.
- Información de evaluación.
- Clasificación de los interesados.

REGISTRO DE INTERESADOS									
Nombre de proyecto:			Fecha de preparación:						
Nombre	Posición	Rol	Información Contacto	Requerimientos	Expectativas	Poder/Interés		Clasificación Externo/Interno	
						Poder	Interés		A

Diagrama de elaboración propia

Comprender y analizar a los interesados

Una vez identificados los interesados, hay que tratar de entender los sentimientos, emociones, creencias y valores de estos.

Para entender a los interesados, se necesita analizar aspectos de la posición de cada uno respecto al proyecto. Analizar a los interesados considera distintos aspectos, como:

- Poder.
- Grado de influencia.
- Actitud.
- Creencias.
- Proximidad al proyecto.
- Interés en el proyecto.

La técnica de **matriz de poder/interés** agrupa a los interesados según su nivel de autoridad/poder y nivel de inquietud/interés, acerca de los resultados del proyecto.

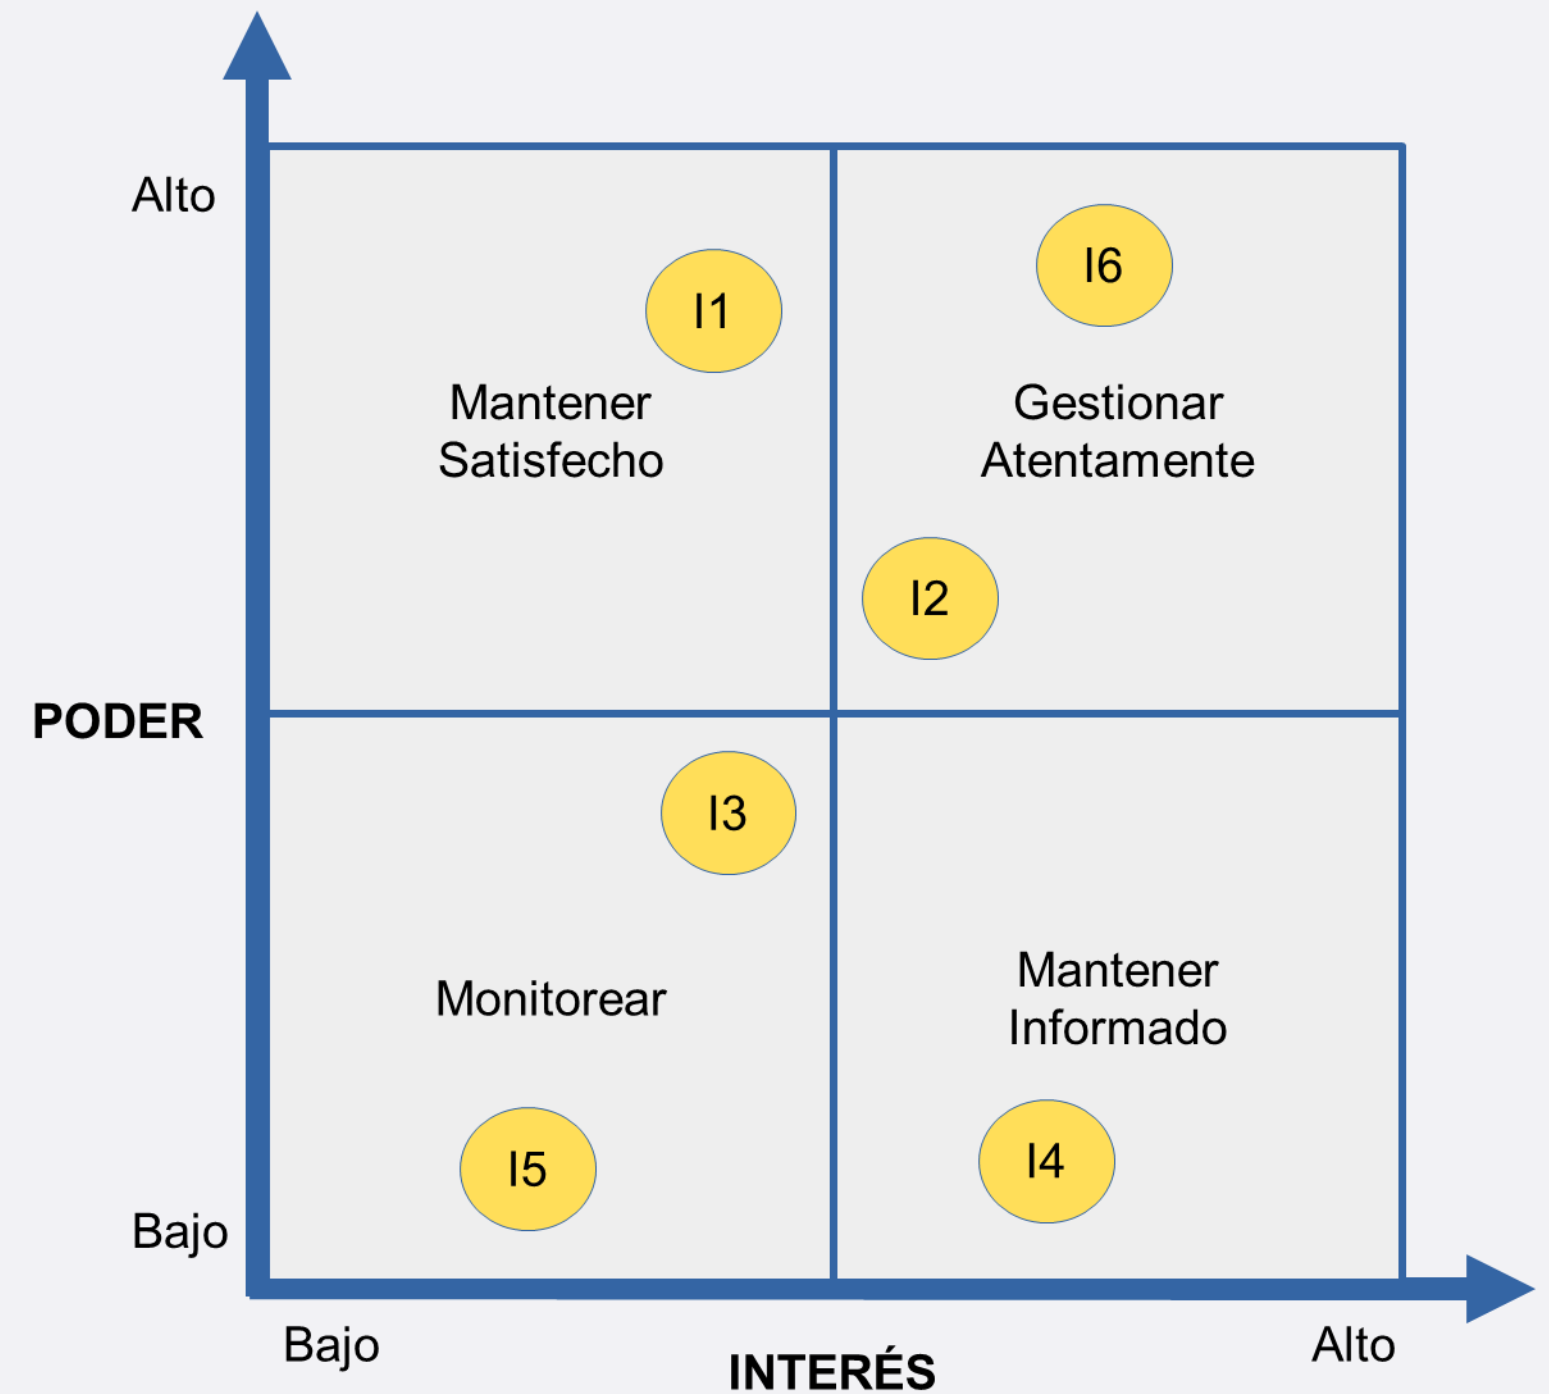


Diagrama de elaboración propia

Priorizar a los interesados

En muchos proyectos hay demasiados interesados involucrados para que el equipo de proyecto pueda interactuar efectivamente con todos.

Basándose en el análisis previo de los interesados, el equipo de proyecto va a poder armar una priorización de estos. Unas estrategias genéricas, dependiendo del poder/interés en el proyecto, pueden ser:

- Mucho poder/Mucho interés: gestionar atentamente.
- Mucho poder/Poco interés: mantener satisfechos.
- Poco poder/Mucho interés: mantener informados.
- Poco poder/Poco interés: monitorear.

Involucrar a los interesados

Involucrar a los interesados supone trabajar colaborativamente con estos, para presentarles el proyecto, obtener los requisitos, manejar las expectativas, solucionar problemas, negociar, priorizar y tomar decisiones.

Planificar la participación de los interesados es el proceso de desarrollar enfoques para involucrarlos en el proyecto.

Temprano en el ciclo de vida del proyecto se desarrolla un plan eficaz que reconoce las diversas necesidades de información de los interesados del proyecto; este plan se revisa y se actualiza periódicamente, a medida que cambia la comunidad de interesados. El plan de participación de los interesados se actualiza periódicamente, para reflejar los cambios en la comunidad de interesados.

Matriz de evaluación de participación

La matriz de evaluación del participación de los interesados es una técnica que permite comparar los niveles actuales (C) de participación con los niveles deseados (D).

Interesado	Desconocedor	Reticente	Neutral	De apoyo	Líder
Interesado 1	C			D	
Interesado 2			C	D	
Interesado 3				D C	

*Project Management Institute (2017). Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (PMBOK® Guide) (6^{ta} ed.).
Newton Square, Pennsylvania: PA: Author Gráfico 13.6, p. 560*

Gestionar las comunicaciones con los interesados

Es desarrollar un enfoque y un plan de comunicación, basándose en las necesidades de información, activos de la organización y requerimientos del proyecto.

Las necesidades de información y los métodos pueden variar.

Dimensiones de la comunicación:

- Interna vs. Externa.
- Formal vs. Informal.
- Vertical vs. Horizontal.
- Oficial vs. No Oficial.
- Escrita vs. Oral.

Métodos de comunicación:

- Comunicación interactiva.
- Comunicación tipo *push*.
- Comunicación tipo *pull*.

Gestionar las comunicaciones con los interesados

A través de la vida del proyecto, los interesados van a ir cambiando, a medida que aparezcan nuevos interesados y otros dejen de serlo. A medida que avanza el proyecto, también puede cambiar el poder o el interés de los interesados en este.

Además de identificar y analizar a los nuevos interesados, también podemos revisar si la estrategia actual de participación es eficaz o si es necesario ajustarla. Por eso, el grado y la eficacia de involucramiento de los interesados es monitoreada a lo largo de todo el proyecto.



© **Universidad de Palermo**

Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.
