


Gestionar el alcance del proyecto

El dominio de desempeño de la entrega
aborda las actividades y funciones asociadas con la entrega del alcance y la calidad para cuyo logro se emprendió el proyecto.

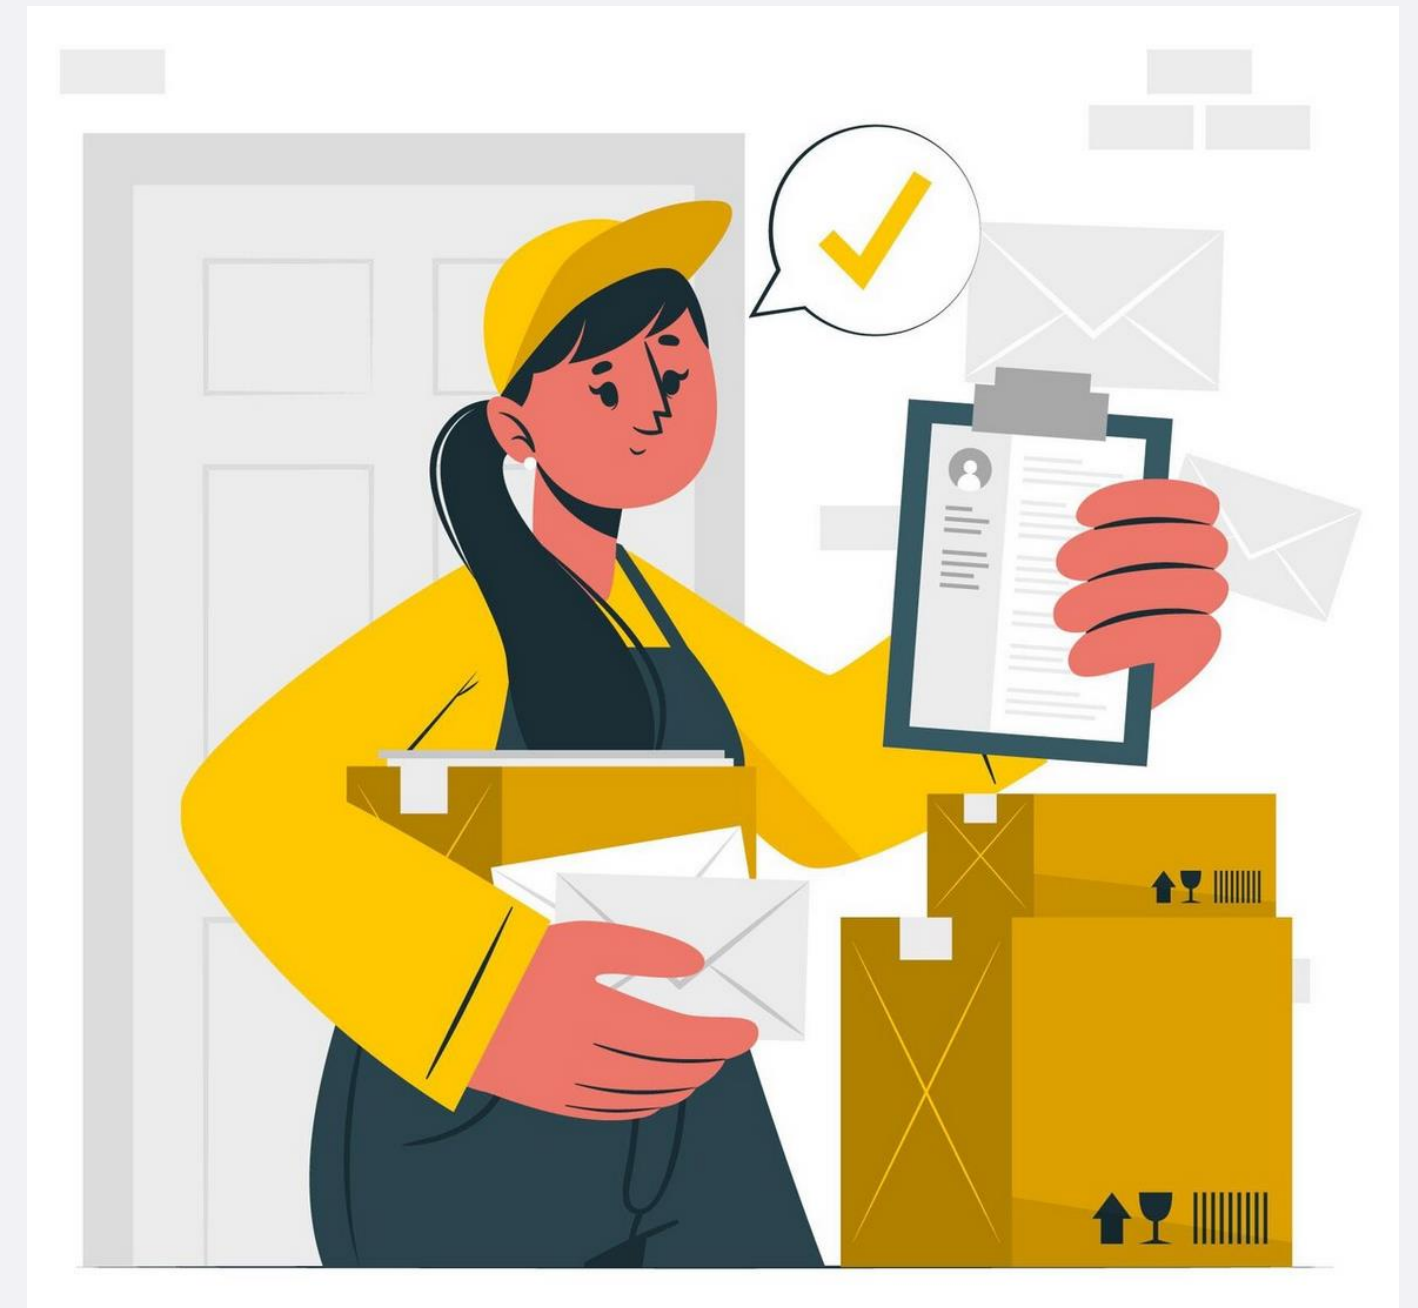

Dominio de desempeño de la entrega

La gestión del alcance implica procesos para garantizar que el proyecto incluya todo el trabajo requerido, y únicamente el trabajo requerido, para completar el proyecto con éxito.

La ejecución efectiva de este dominio de desempeño tiene los siguientes resultados deseados:

- Los proyectos contribuyen los objetivos de negocios y los avances de la estrategia.
- Los proyectos materializan los resultados para los que fueron creados.
- Los beneficios del proyecto se obtienen en el plazo que se planificaron
- El equipo de proyecto tiene una clara comprensión de los requisitos.
- Los interesados aceptan y están satisfechos con los entregables.

Alcance del producto vs. Alcance del proyecto

En el contexto del proyecto, el término “alcance” puede referirse a:

- **Alcance del producto.** Características y funciones de un producto, servicio o resultado.
- **Alcance del proyecto.** Trabajo realizado para entregar un producto, servicio o resultado con las funciones y características especificadas.

En ocasiones, se considera que el termino “alcance del proyecto” incluye el “alcance del producto”.

Los *entregables (deliverables)* se refieren al producto, servicio o resultado, provisional o final, de un proyecto.


Los entregables facilitan los resultados del proyecto.

Los entregables reflejan los requisitos de los interesados, el alcance y la calidad.



Un **requisito** es una condición o capacidad que debe estar presente en un producto, servicio o resultado para satisfacer una necesidad de negocio.

Los requisitos pueden ser de muy alto nivel o pueden ser muy detallados.

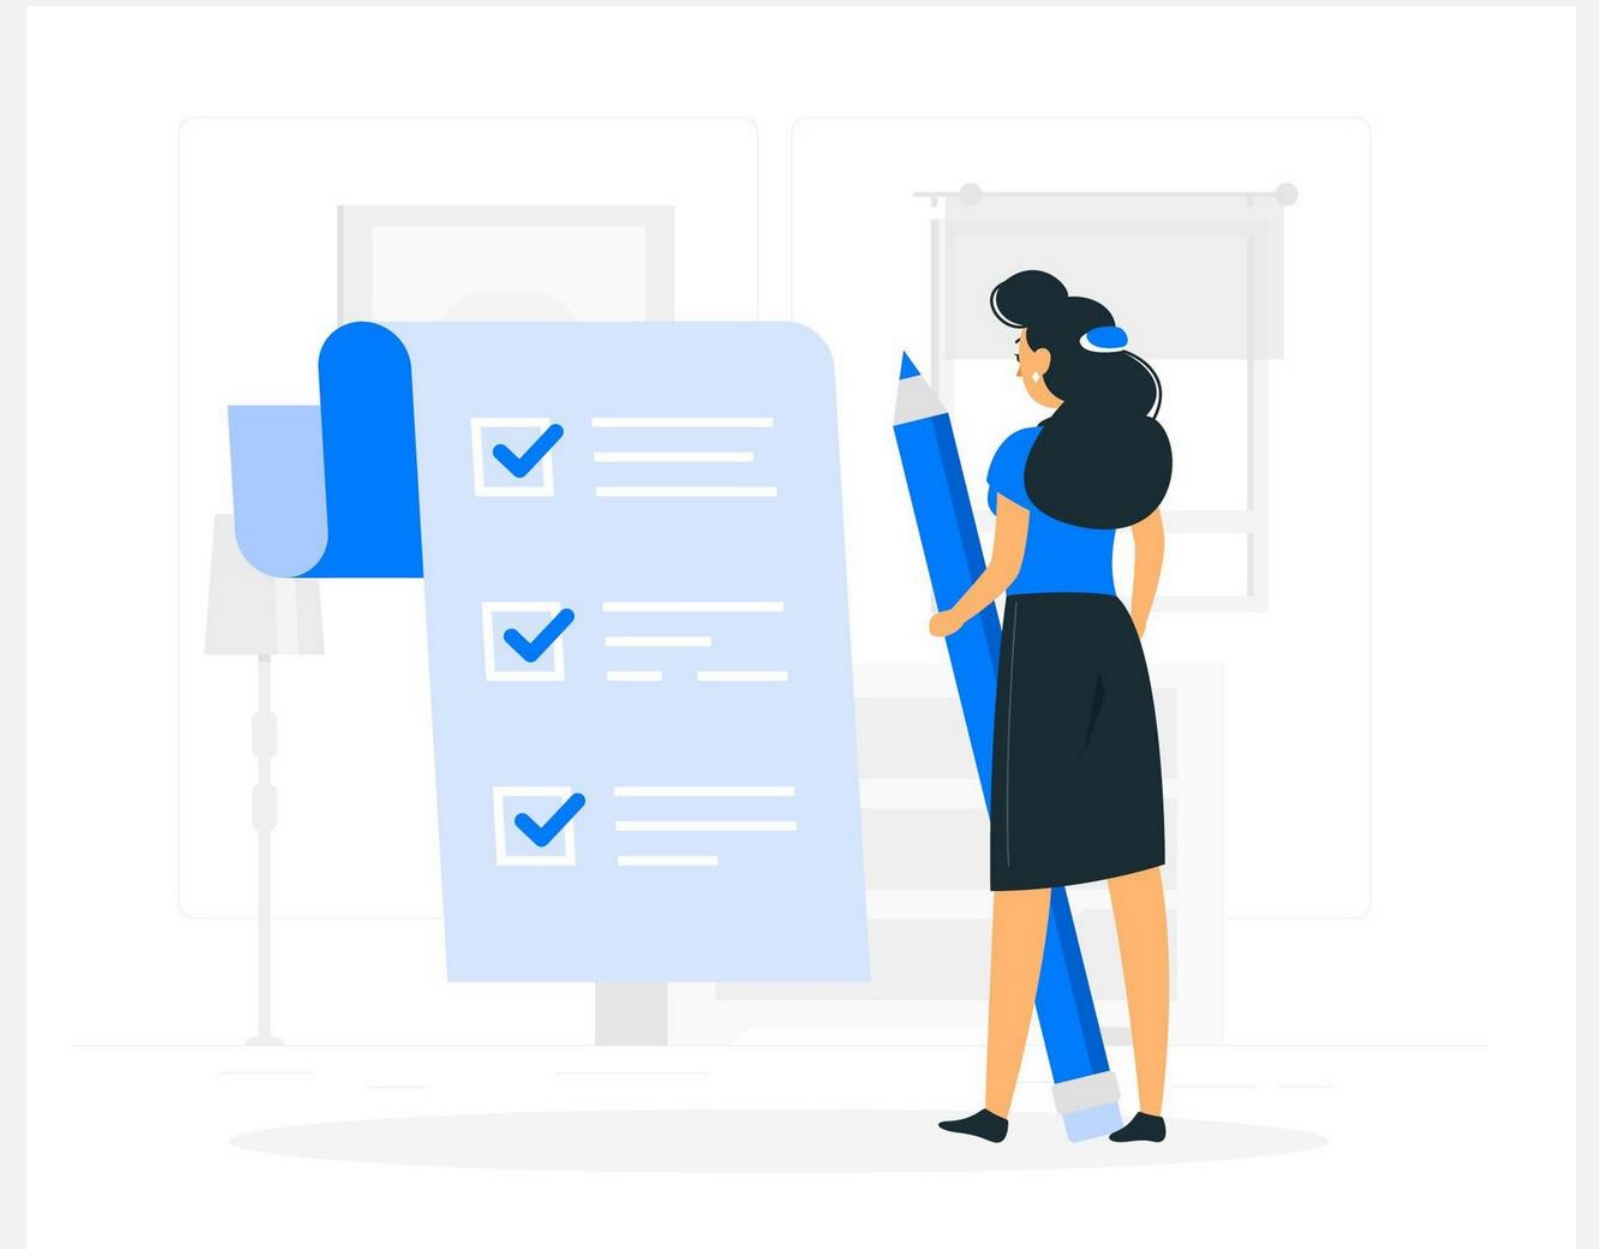

Recopilar requisitos

Recopilar requisitos es el proceso de determinar, documentar y gestionar las necesidades y los requisitos de los interesados para cumplir con los objetivos del proyecto. El beneficio de este proceso es que proporciona la base para definir el alcance del producto y el alcance del proyecto. Este proceso se lleva a cabo en la planificación inicial o durante el proyecto, dependiendo del proyecto en particular y el enfoque específico.

Los requisitos bien documentados cumplen los siguientes criterios:

- **Claro:** que solo exista una manera de interpretar el requisito.
- **Conciso:** el requisito es formulado en tan pocas palabras como sea posible.
- **Verificable:** existe una forma de verificar que el requisito se haya cumplido.
- **Consistente:** que no haya requisitos contradictorios.
- **Completo:** representa la totalidad de las necesidades.
- **Trazable:** que cada requisito pueda ser reconocido mediante un identificador único.

Recopilar requisitos (I)

Los requisitos pueden agruparse en categorías para permitir un mayor refinamiento y nivel de detalle a medida que se elaboran.

Estas categorías incluyen:

- Requisitos del negocio.
- Requisitos de los interesados.
- Requisitos de la solución.
- Requisitos de preparación y transición.
- Requisitos del proyecto.
- Requisitos de calidad.

Matriz de trazabilidad de requisitos

La matriz de trazabilidad es una cuadrícula que vincula los requisitos del producto desde su origen hasta los entregables que los satisface.

Ayuda a asegurar que cada requisito agregue valor del negocio. Proporciona un medio para realizar el seguimiento de los requisitos a lo largo del ciclo de vida del proyecto.

Matriz de Trazabilidad de Requisitos								
Nombre del Proyecto:								
Centro de Costos:								
Descripción del Proyecto:								
ID	ID de Asociado	Descripción de los Requisitos	Necesidades, Oportunidades, Metas y Objetivos del Negocio	Objetivos del Proyecto	Entregables de la EDT/WBS	Diseño del Producto	Desarrollo del Producto	Casos de Prueba
001	1.0							
	1.1							
	1.2							
	1.2.1							
002	2.0							
	2.1							
	2.1.1							
003	3.0							
	3.1							
	3.2							
004	4.0							
005	5.0							

Project Management Institute (2017). *Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (PMBOK® Guide) (6^{ta} ed.)*. Newton Square, Pennsylvania: PA: Author Gráfico 5.7, p. 185

Definición del alcance es el proceso de desarrollar una descripción detallada del proyecto y del producto.



Definición de alcance

Descomposición del alcance

El alcance se puede preparar utilizando un documento de enunciado de alcance para identificar los principales entregables asociados con el proyecto y los criterios de aceptación de cada entregable. El alcance también se puede elaborar descomponiéndolo en niveles más bajos de detalle y utilizando una estructura de desglose de trabajo (ETD/WBS). Hay más maneras de elaborar el alcance, como hojas de ruta, épicas e historias de usuario, entre otras.

Finalización de entregables

Dependiendo del enfoque utilizado, hay diferentes formas de describir la finalización de componentes o proyectos:

- Criterios de aceptación o finalización.
- Medidas de desempeño técnico.
- Definición de terminado.

Calidad es el grado en el que un conjunto de características inherentes a un objeto (producto, servicio, proceso, persona, organización, sistema o recurso) cumple con los requisitos.



Gestión de la calidad

La entrega es más que solo el alcance y los requisitos. El alcance y los requisitos se centran en lo que se debe entregar. La calidad se centra en los niveles de desempeño que deben cumplirse.

La gestión de la calidad del proyecto incluye los procesos para incorporar la política de calidad de la organización en cuanto a la planificación, gestión y control de los requisitos de calidad del proyecto y el producto, a fin de satisfacer los objetivos de los interesados.

Parte de los costos asociados con la calidad nacen de la organización patrocinadora y se reflejan en las políticas, procedimientos y procesos de trabajo.

El costo de la calidad

El costo de la calidad incluye todos los costos en los que se ha incurrido para prevenir el incumplimiento de los requisitos, de la evaluación de conformidad y del no cumplimiento. El costo de la calidad (COQ) asociado consiste en uno o más de los siguientes costos:

- **Costos de conformidad**
 - **Costo de prevención** (construir producto de calidad): capacitación, documentar procesos, equipos, tiempos.
 - **Costo de evaluación** (evaluar la calidad): pruebas, pérdida en pruebas destructivas, inspecciones
- **Costos de no conformidad**
 - **Costo de fallas internas** (fallas relevadas por el proyecto): retrabajo, desechos.
 - **Costo de fallas externas** (fallas encontradas por el cliente): obligaciones, trabajo de garantía, pérdida de negocio.

Línea base de alcance es la versión aprobada de los documentos de definición del alcance (por ej.: enunciado de alcance + EDT/WBS + diccionario de la EDT/WBS), que pueden cambiarse utilizando procedimientos formales de control de cambios y que se utiliza como base de comparación.





© **Universidad de Palermo**

Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.
